Годовой отчет

государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

2011











УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
протокол от 28 апреля 2012 года № 31

Годовой отчет

государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2011 год









Содержание

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ — ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2011 ГОДУ 9

Цели деятельности и задачи Фонда 10

Особенности нормативно–правового регулирования и методического обеспечения деятельности Фонда в 2011 году 11

Система корпоративного управления и организационная структура Фонда 13

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2011 ГОД 21

Рассмотрение заявок субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда 22

Информационные системы Фонда 25

Оперативный контроль хода реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 27

Организация работы по обращениям граждан 48

Взаимодействие Фонда с экспертным сообществом и другими институтами развития 49

Участие Фонда в реализации мер по внедрению энергоэффективных технологий 51

Реализация Фондом стратегии информационной открытости 56

Управление имуществом Фонда 62

Административно–хозяйственная деятельность Фонда 66

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ И ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 69

Отчет о результатах мониторинга реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ 70

Результаты мониторинга реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 72

Результаты мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 75

Отчет о результатах мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 78

Развитие системы управления имущественным комплексом организаций коммунального комплекса 79

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда 81

Развитие инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах 83

Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков 83

Завершение перевода льгот и субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежную форму 85

Совершенствование системы ценообразования и повышение эффективности расходования бюджетных средств в жилищно–коммунальной сфере 85

Развитие системы ресурсо– и энергосбережения 86

Отчет о расходовании средств Фонда, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ 88

Особенности предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году 88

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2008 года 89

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2009 года 90

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2010 года 91

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2011 года 92

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ СТРАТЕГИИ ФОНДА НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА 93

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2012 ГОДУ 99

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА ЗА 2011 ГОД 103

ПРИЛОЖЕНИЯ 143

1. Информация о заявках субъектов Российской Федерации на получение финансовой поддержки для реализации региональных адресных программ в 2011 году 144

2. Информация о реализации региональных адресных программ в 2011 году 150

3. Сведения о выполнении субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году 178

4. Результаты достижения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда по итогам 2011 года 180









ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году

Цели деятельности и задачи Фонда в 2011 году

В рамках реализации государственной политики, направленной на обеспечение граждан качественным жильем, ликвидацию аварийного жилищного фонда и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, образована и функционирует государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также — Фонд, государственная корпорация).

Правовые основы деятельности Фонда регламентированы Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Федеральный закон № 185-ФЗ) и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон № 7-ФЗ). Основные принципы, направления и показатели эффективности деятельности Фонда определены Стратегией государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на период до 2013 года (далее также — Стратегия Фонда). Координацию деятельности Фонда осуществляет Минрегион России.

Фонд выступает институтом развития, деятельность которого нацелена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. В качестве инструмента достижения поставленных целей применяется механизм обусловленного субсидирования расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который требует выполнения субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями установленных Федеральным законом № 185-ФЗ параметров реформированияотраслижилищно-коммунального хозяйства и обеспечивает концентрацию финансовых ресурсов государственной корпорации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и собственников жилья на решении задачи обеспечения комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Названные цели деятельности и Стратегия Фонда определяли особенности функционирования и задачи государственной корпорации в отчетном периоде.

В 2011 году Фондом **расширены программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья.** Лимиты финансовой поддержки субъектов Российской Федерации увеличены за счет дополнительного имущественного взноса Российской Федерации и доходов государственной корпорации от размещения временно свободных средств.

Особое внимание уделялось **реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда.** С учетом изменения законодательства субъекты Российской Федерации получили дополнительные возможности для переселения граждан в безопасное и комфортное жилье. Увеличение допустимых сроков признания домов аварийными позволило распространить действие региональных адресных программ на дополнительные жилые объекты, а расширение форм реализации (приобретение жилья на вторичном рынке, выкуп при наличии другого жилья) — осуществлять планирование мероприятий с учетом специфики рынка жилья и существующих строительных мощностей в регионе.

Наряду с предоставлением субъектам Российской Федерации дополнительных возможно-



Рисунок 1. Владимирская область, г. Владимир, ул. Фатьянова, 18а. По программе Фонда граждане переезжают из аварийного жилья в новые квартиры

стей для улучшения жилищных условий граждан Фонд усилил **контроль за исполнением регионами принятых ими обязательств в рамках региональных адресных программ.** С 2011 года соответствующая ответственность субъектов Российской Федерации закреплена законодательно; особая социальная значимость реализуемых мероприятий устанавливает требования к их исполнению в обозначенном объеме и в заявленный срок.

Значительную долю в деятельности Фонда в 2011 году составляли **вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.** Государственной корпорацией проведена работа по методологическому обеспечению проведения энергетического обследования многоквартирных домов, выпущены информационные материалы, разъясняющие особенности и эффект применения энергоэффективных технологий, на территории 33 субъектов Российской Федерации реализуются проекты строительства энергоэффективных домов.



Рисунок 2. Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, 52-1. Многоквартирный дом после капитального ремонта

Необходимость объективного освещения хода реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формирования конструктивной позиции собственников в вопросах управления жильем определило задачу Фонда по **предоставлению широкого спектра информации** о сути проводимых преобразований, разработке и практике применения современных технологий обустройства жилья, разъяснении прав и обязанностей граждан. Государственной корпорацией продолжена реализация системной информационной кампании, с использованием интернет-ресурса Фонда осуществляется раскрытие сведений о деятельности управляющих компаний и приводится их сравнительная оценка.

Таким образом, в 2011 году в деятельности Фонда получили развитие основные направления, определяемые установленными целями создания государственной корпорации, результаты и опыт предыдущих периодов способствовали совершенствованию механизмов достижения поставленных задач.

Особенности нормативно-правового и методического регулирования обеспечения деятельности Фонда в 2011 году

Изменения нормативно-правового регулирования деятельности государственной корпорации в 2011 году связаны с продлением срока функционирования Фонда до 1 января 2013 года и направлены на повышение эффективности использования средств Фонда, обеспечение своевременного выполнения субъектами Российской Федерации плановых показателей региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, стимулирование мероприятий по энергосбережению, осуществляемых в рамках региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, изменения вызваны необходимостью корректировки отдельных условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Значительные изменения правового регулирования деятельности Фонда были осуществлены Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 441-ФЗ), применение которого началось в 2011 году.

Кроме того, изменения в Федеральный закон № 185-ФЗ в течение 2011 года вносились:

• Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 124–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» и статью 7^1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

• Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 200–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

• Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 350–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

Указанными нормативными правовыми актами осуществлены следующие основные изменения:

а) увеличены допустимые сроки признания домов аварийными для переселения из них граждан с использованием средств Фонда. В соответствии с внесенными изменениями действие Федерального закона № 185–ФЗ распространено на многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2010 года;

б) с учетом оценки хода реформирования жилищно–коммунального хозяйства уточнены условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185–ФЗ. Среди наиболее существенных изменений следует отметить:

• продление до 1 января 2013 года срока ликвидации перекрестного субсидирования организаций коммунального комплекса;

• отмену требования о необходимости увеличения к 1 января 2011 года количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, до 20 процентов;

• продление до 1 января 2012 года срока завершения формирования и проведения государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта;

в) дополнение видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые могут осуществляться с использованием средств Фонда, работами по ремонту фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

г) в целях стимулирования установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов введена обязательность при проведении капитального ремонта многоквартирного дома выполнять работы по установке таких приборов учета и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;

д) установлена возможность использования средств Фонда на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрено проведение такого обследования;

е) определены условия использования средств Фонда в ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийно–



Рисунок 3. Курская область, поселок Возы, ул. Октябрьская, д. 6. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта

го жилищного фонда на приобретение жилья на вторичном рынке и на выплату выкупной цены собственникам изымаемых жилых помещений аварийного жилищного фонда при сохранении положений, направленных на стимулирование строительства нового жилья;

ж) изменен порядок расчета минимальной доли финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;

з) в целях стимулирования эффективного использования средств Фонда введен механизм периодического перераспределения между субъектами Российской Федерации остатков средств неиспользованных лимитов. Кроме того, для поощрения субъектов Российской Федерации, достигших наибольших успехов в реализации региональных адресных программ и реформировании жилищно-коммунального хозяйства, определен порядок распределения между такими субъектами Российской Федерации дополнительных средств в размере не свыше десяти процентов доходов, которые получены Фондом от размещения временно свободных средств Фонда, объем которых превышает объем средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда;

и) для обеспечения своевременного выполнения субъектами Российской Федерации плановых показателей региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Федеральный закон № 185-ФЗ внесены положения, определяющие предельные сроки завершения реализации региональных адресных программ и требование о необходимости достижения в эти сроки первоначально заявленных показателей их реализации (количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт), а также установлена ответственность за невыполнение указанных требований.

Перечисленные изменения законодательства нашли отражение в методических материалах Фонда, что позволило субъектам Российской Федерации, с одной стороны, воспользоваться дополнительными возможностями в реализации региональных адресных программ, скорректировать последовательность исполнения обязательств по реформированию отрасли, а с другой — своевременно обеспечить выполнение вновь установленных требований.

В 2011 году в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на повышение эффективности деятельности государственных корпораций и государственных компаний, разработаны и утверждены Стратегия Фонда и Порядок использования прибыли Фонда.

Указанным Федеральным законом также определены принципы, которыми должна руководствоваться государственная корпорация при инвестировании временно свободных средств, установлены требования к процедуре закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для ее нужд. Указанные нормы вступают в силу с 1 января 2012 года и будут реализованы Фондом в соответствии с установленными требованиями.

Система корпоративного управления и организационная структура Фонда

Управление деятельностью государственной корпорации осуществляется наблюдательным советом Фонда, правлением Фонда и генеральным директором Фонда. Главой 3 Федерального закона № 185-ФЗ определены полномочия и представительский состав указанных органов управления. Персональный состав наблюдательного совета утверждается Правительством Российской Федерации, персональный состав правления — наблюдательным советом Фонда.

Деятельность наблюдательного совета Фонда

Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления государственной корпорации решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом Федерального закона № 185-ФЗ.

В целях обеспечения ротации членов высших органов управления государственных корпораций и государственных компаний распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 1853-р произведены частичные изменения персонального состава наблюдательного совета Фонда. Персональный состав наблюдательного совета Фонда с учетом указанных изменений по состоянию на 31 декабря 2011 года отображен на фото ниже.

В 2011 году наблюдательным советом Фонда проведено 6 заседаний, из них одно путем проведения заочного голосования. Рассмотрено более 40 вопросов.



Козак
Дмитрий Николаевич
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Фонда



Басаргин
Виктор Федорович
Министр регионального развития Российской Федерации, заместитель председателя наблюдательного совета Фонда



Глазычев
Вячеслав Леонидович
Директор Института продвижения инноваций Общественной палаты Российской Федерации



Исаев
Андрей Константинович
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации



Никольский
Михаил Эрикович
управляющий директор ООО «Инфраструктура капитал»



Новиков
Сергей Геннадьевич
руководитель Федеральной службы по тарифам



Орлова
Светлана Юрьевна
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации



Парфенов
Валерий Павлович



Плутник
Александр Альбертович
помощник Первого заместителя ПредседателяПравительства Российской Федерации



Попова
Анна Владиславовна

заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации



Разворотнева
Светлана Викторовна

председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике



Садиков
Алексей Львович

начальник Департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации



Сиваев
Сергей Борисович

директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города»



Силуанов
Антон Германович

Министр финансов Российской Федерации



Чистяков
Александр Николаевич

президент ООО «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент»



Цицин
Константин Георгиевич

генеральный директор — председатель правления Фонда



Шаккум
Мартин Люцианович

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Среди решений наблюдательного совета можно выделить следующие важнейшие направления.

Первое направление — нормативное обеспечение деятельности Фонда в части предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации. В связи с изменением в 2011 году отдельных положений законодательства наблюдательным советом принимались решения по уточнению требований к документам, подтверждающим выполнение субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В целях реализации положений части 6 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ наблюдательным советом утверждена Методика увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда в зависимости от эффективности реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных адресных программ и эффективности реформирования жилищно–коммунального хозяйства, а также определен объем средств Фонда, направляемый на указанные цели.

На заседаниях также неоднократно рассматривались предложения по совершенствованию законодательства в целях повышения эффективности достижения целей, установленных Федеральным законом № 185–ФЗ.

Второе направление — совершенствование системы корпоративного управления. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее–Федеральный закон № 7–ФЗ) наблюдательным советом Фонда в 2011 году утверждены Стратегия Фонда, Положение об оплате труда работников Фонда[1] и Порядок использования прибыли Фонда. В целях реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательным советом утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг Фондом[2].

Третье направление — повышение прозрачности и результативности деятельности Фонда. В рамках указанного направления наблюдательным советом Фонда рассматривались результаты деятельности Фонда за прошедший в течение года период, итоги проверочных мероприятий деятельности Фонда, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, вопросы реализации региональных адресных программ в отдельных субъектах Российской Федерации, меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих возникновению нарушений использования финансовых средств в рамках реализации Федерального закона № 185–ФЗ.

Четвертое направление — решения, связанные с текущей деятельностью Фонда, которые рассматриваются ежегодно (утверждение годового отчета, аудиторской организации, общего объема административных расходов, вознаграждение членов правления, утверждение планов заседаний наблюдательного совета).

Деятельность правления Фонда

Правление Фонда является коллегиальным органом управления Фонда. Члены правления назначаются на должность наблюдательным советом Фонда.

Персональный состав правления Фонда по состоянию на 31 декабря 2011 года отображен на фото ниже.



Рисунок 4. Структура тематики вопросов, рассмотренных правлением Фонда в 2011 году

1 Положение об оплате труда работников Фонда объединило и заменило ранее действующие Положение об оплате труда генерального директора и членов правления Фонда, утвержденное наблюдательным советом 21 октября 2009 года, протокол № 13, и Положение об оплате труда работников Фонда, утвержденное правлением Фонда 2 декабря 2009 года, протокол № 114.

2 Положение о закупках товаров, работ, услуг Фондом, утвержденное наблюдательным советом 20 декабря 2011 года, протокол № 29, вступает в силу с 1 января 2012 года и заменяет Положение о закупках товаров (работ, услуг) Фонда, утвержденное правлением Фонда 18 марта 2011 года, протокол № 232.



Цицин
Константин Георгиевич
генеральный директор — председатель правления Фонда



Талалыкин
Владимир Михайлович
первый заместитель генерального директора Фонда



Чепурина
Анна Анатольевна
заместитель генерального директора Фонда



Сучков
Сергей Львович
заместитель генерального директора Фонда



Адамович
Геннадий Леонидович
директор Юридического департамента



Сердюк
Ольга Владимировна
заместитель генерального директора Фонда



Рурин
Олег Станиславович
директор Департамента региональных программ

Приоритетами деятельности правления Фонда в 2011 году оставались актуальность рассмотрения вопросов и оперативность принятия решений.

В 2011 году правлением Фонда проведено 90 заседаний (количество заседаний на уровне предыдущего года). На заседаниях рассмотрены более тысячи вопросов, преимущественная часть принятых решений касается вопросов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда (основной деятельности), включая рассмотрение заявок, реестров контрактов, заключенных в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, внесение изменений в региональные адресные программы, рассмотрение отчетности субъектов Российской Федерации, приостановление и возобновление предоставления финансовой поддержки.

Организационная структура Фонда

Организационная структура государственной корпорации сформирована исходя из основных направлений деятельности Фонда для обеспечения достижения поставленных целей, а также возможности решения актуальных ситуационных задач.

В целом функционально-целевое направление деятельности структурных подразделений в 2011 году сохранялось неизменным:

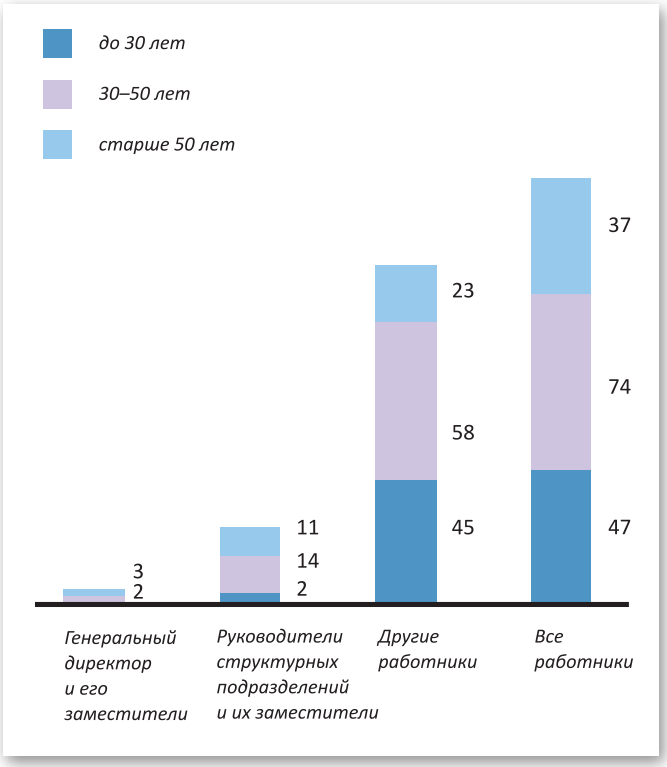


Рисунок 5. Возрастные характеристики работников Фонда (человек)

• **функционально-целевое направление анализа и контроля реализации региональных адресных программ.** Основные функции в этом блоке выполняются Департаментом региональных программ и Финансовым департаментом, в том числе осуществляется рассмотрение региональных адресных программ на соответствие требованиям Федерального закона № 185–ФЗ в рамках заявок субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, сбор и анализ оперативной и годовой отчетности регионов о ходе реализации региональных адресных программ, контроль за обеспечением субъектами Российской Федерации необходимого долевого финансирования региональных адресных программ и расходованием средств в ходе их реализации;

• **функционально-целевой блок правовой и методологической деятельности** Фонда. Работа данного блока обеспечивается Юридическим департаментом и Экспертно–аналитическим департаментом и включает в себя анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ при подаче заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, сбор и анализ оперативной и годовой отчетности о выполнении названных условий, осуществление методической деятельности, осуществление правовой экспертизы документов, формирование правовой позиции и выработку предложений по совершенствованию законодательства;

• **функционально-целевое направление оперативного контроля.** Основные функции по данному направлению реализуются Департаментом



Рисунок 6.Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. По година, д. 20. Фасад многоквартирного дома до и после капитального ремонта

мониторинга и контроля, в частности осуществляется контроль за соблюдением регионами условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом № 185–ФЗ, ходом реализации региональных адресных программ и целевым расходованием средств Фонда путем проведения выездных проверок в субъекты Российской Федерации. В целях повышения эффективности проверочных мероприятий департамент обеспечивает взаимодействие Фонда с органами прокуратуры и контрольно–счетными органами;

• **функционально-целевое направление управления имуществом.** Деятельность по данному направлению организуется Департаментом размещения временно свободных средств Фонда и осуществляется в целях снижения влияния инфляционных процессов на имеющиеся финансовые ресурсы Фонда и исполнения в полном объеме обязательств по предоставлению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, направлена на обеспечение сохранности неизрасходованных денежных ресурсов и их приумножение за счет получения дополнительных доходов;

• **функционально-целевое направление информационной и разъяснительной работы.** Основные задачи по данному направлению выполняются Управлением по связям с общественностью Фонда,

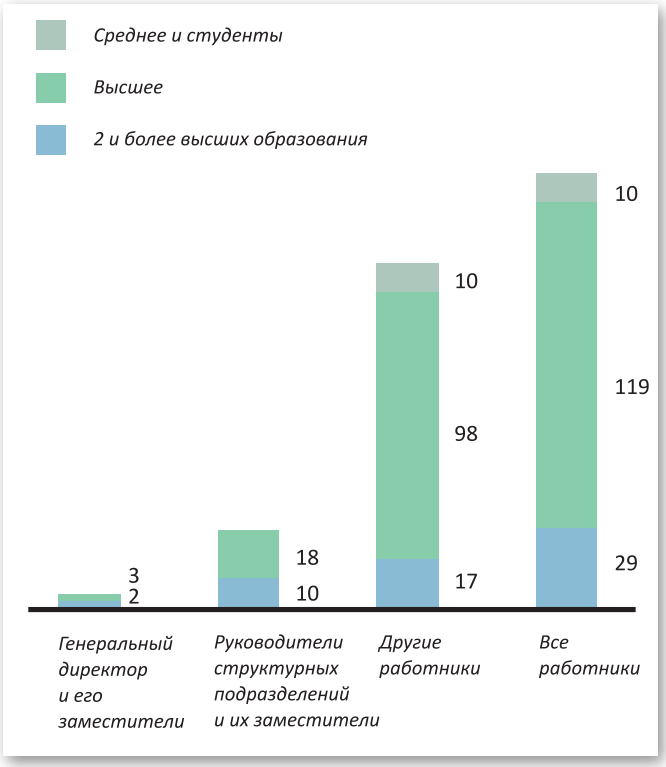


Рисунок 7. Образовательные характеристики работников Фонда (человек)

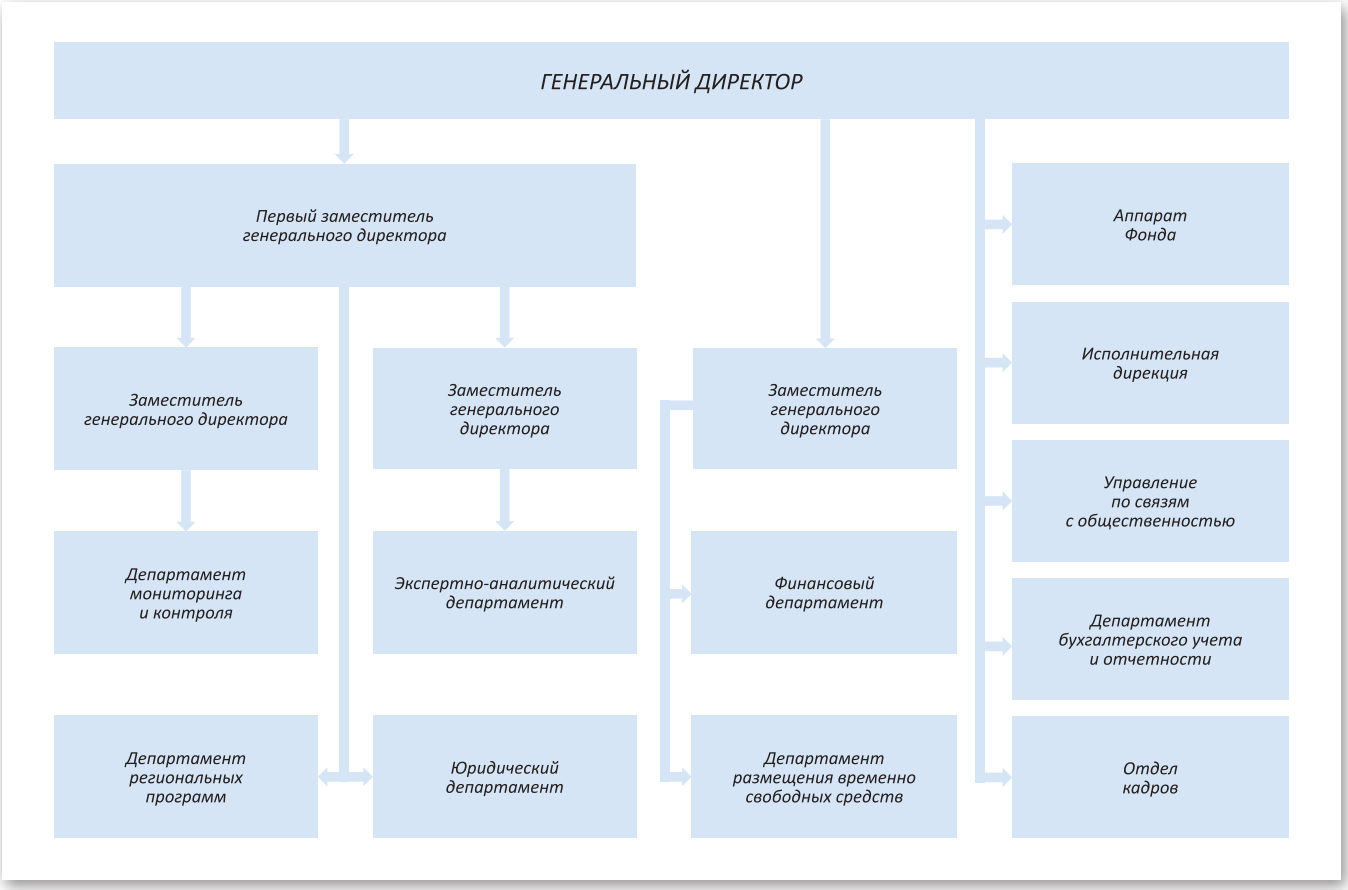


Рисунок 8. Организационная структура Фонда

реализующим информационную политику Фонда и обеспечивающим разъяснительную работу по вопросам функционирования Фонда и реализации реформы жилищно–коммунального хозяйства в целом;

• **функционально-целевой блок обеспечения деятельности Фонда.** Организационные вопросы деятельности государственной корпорации обеспечиваются аппаратом Фонда, исполнительной дирекцией, департаментом бухгалтерского учета и отчетности, отделом кадров.

С 2010 года в государственной корпорации в полном объеме действует система мотивации работников, основанная на достижении целевых значений показателей эффективности деятельности Фонда в целом и отдельных структурных подразделений, которые характеризуют успешность и эффективность деятельности каждого структурного подразделения Фонда, отражают специфику его функционирования, стоящие перед ним цели и задачи.

На 1 января 2012 года численный состав работников Фонда составляет 158 человек, в том числе 90 женщин, 68 мужчин. Средний возраст работников Фонда составляет 38,3 года.

Укомплектованность кадров в Фонде составляет 100 процентов. Коэффициент текучести кадров — 16,99 процента. В Фонде работают высококвалифицированные специалисты: 12 человек имеют ученые степени, из них 5 человек—кандидаты экономических наук, 4 человека—кандидаты юридических наук. Опыт работы на государственной гражданской службе имеют 43 человека. В 2011 году 11 работников Фонда отмечены почетными грамотами Министерства регионального развития Российской Федерации.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства за 2011 год

Рассмотрение заявок субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда

Исходя из первоначально установленного четырехлетнего периода деятельности Фонда, к 2011 году субъекты Российской Федерации преимущественно в полном объеме получили установленный для них лимит финансовой поддержки. Чеченская Республика и город федерального значения Москва за финансовой поддержкой в Фонд не обратились.

Образовавшиеся на 1 января 2011 года суммы остатков средств неиспользованных лимитов всех субъектов Российской Федерации, а также средства, возвращенные регионами в Фонд с 1 января 2011 года, были распределены между субъектами Российской Федерации, которым до 1 января 2011 года предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда. Лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда были также увеличены за счет доходов, которые получены Фондом от размещения временно свободных средств Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, объем которых превышает объем средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, и других не запрещенных законом поступлений (за исключением имущественного взноса Российской Федерации, предусмотренного частью 1^1 статьи 5 Федерального закона № 185–ФЗ).

По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств неиспользованных лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда составил 9 800,8 млн. рублей, доход Фонда от размещения временно свободных средств и другие не запрещенные законом поступления — 9 161,1 млн. рублей. Таким образом, общий объем лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составил 18 961,9 млн. рублей. С учетом нормы пункта 3 части 3 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ субъекты Российской Федерации в 2011 году могли воспользоваться финансовой поддержкой Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в общем объеме 9 480,95 млн. рублей[3].

Также в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ на увеличение лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлены средства дополнительного имущественного взноса Российской Федерации в Фонд, осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2010 года № 278–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», в общем объеме 25 000,0 млн. рублей.

Таким образом, общий объем средств финансовой поддержки, которым могли воспользоваться субъекты Российской Федерации в 2011 году, составлял 34 480,95 млн. рублей.

Несмотря на сокращение объема финансовой поддержки по сравнению с предыдущими периодами в 2011 году, субъекты Российской Федерации осуществляли активное взаимодействие с Фондом для продолжения реализации на их территориях мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и ликвидации аварийного жилищного фонда. Для получения финансовой поддержки в Фонд были направлены 166 заявок от 80 субъектов Российской Федерации (из числа регионов, ранее участвовавших в программах Фонда, с заявкой в 2011 году не обратилась Магаданская область).

По итогам рассмотрения заявок правлением Фонда в 2011 году решений о предоставлении финансовой поддержки принято на общую сумму 34 127,06 млн. рублей, включая зачет экономии средств Фонда, находящихся на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 1 289,99 млн. рублей. Таким образом, объем запрашиваемых средств Фонда составил 94 процента от объема средств финансовой поддержки, которым могли воспользоваться субъекты Российской Федерации в 2011 году.

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов правлением Фонда одобрены 83 заявки от 80 регионов на общую сумму 9 865,56 млн. рублей, включая зачет экономии средств Фонда в сумме 332,29 млн. рублей. В течение года субъектами Российской Федерации представлены в Фонд изменения в региональные адресные программы, касающиеся уточнения перечня ремонтируемых многоквартирных домов, количества проживающих в них граждан, видов, стоимости и сроков проведения работ. С учетом одобренных правлением Фонда изменений в региональные адресные программы общая стоимость работ по проведению капитального ремонта составила 19 421,54 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда — 9 827,53 млн. рублей, средств долевого финансирования субъектов Российской Федерации и средств собственников

3 В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ в 2011 году предельный объем финансовой поддержки за счет средств Фонда, который мог быть предоставлен каждому субъекту Российской Федерации, составлял половину суммы произведенного увеличения лимита, установленного для соответствующего субъекта Российской Федерации. Финансовая поддержка за счет средств Фонда в пределах суммы произведенного увеличения лимитов предоставлялась исключительно на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

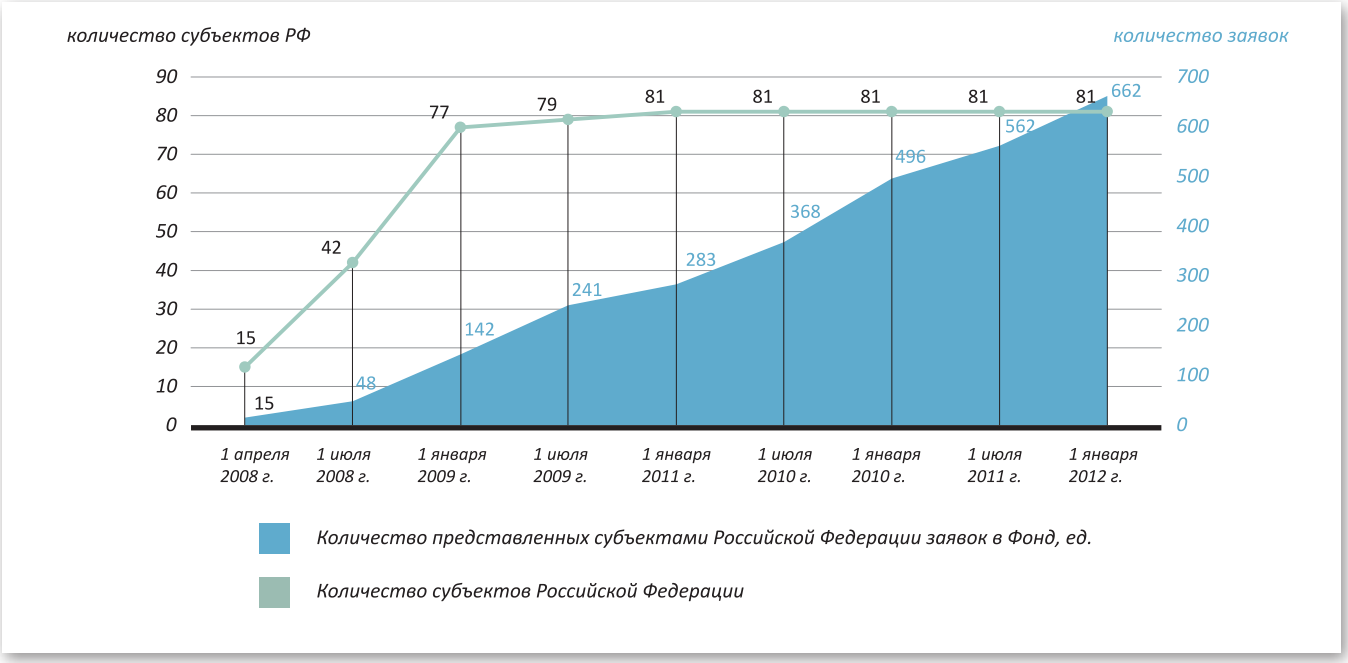


Рисунок 9. Динамика участия субъектов Российской Федерации

жилых помещений в многоквартирных домах — 9 594,0 млн. рублей. В качестве результатов названных программ предусмотрено проведение капитального ремонта 7 287 многоквартирных домов общей площадью 23,4 млн. кв. м, что позволит улучшить условия проживания 898,7 тыс. граждан.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда правлением Фонда на основании 63 заявок от 57 субъектов Российской Федерации приняты решения о предоставлении финансовой поддержки, общий объем которой составил 14 543,34 млн. рублей, включая зачет экономии средств Фонда в сумме 620,19 млн. рублей. С учетом произведенных и представленных в Фонд субъектами Российской Федерации изменений в региональные адресные программы общая стоимость предусмотренных этими программами мероприятий составила 25 634,09 млн. рублей, в том числе 14 098,82 млн. рублей за счет средств Фонда, 11 535,27 млн. рублей — средств долевого финансирования субъектов Российской Федерации, включая дополнительные источники финансирования. По итогам реализации данных программ запланировано переселение граждан из 2 876 аварийных многоквартирных домов общей площадью 778,1 тыс. кв. м, в результате чего 53 744 человека будут переселены в новое жилье.

В 2011 году в рамках реализации мер по расширению механизмов поддержки рынка жилья Фондом со дня вступления в силу Федерального закона от 9 марта 2010 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» также продолжилось предоставление финансовой поддержки на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.



Рисунок 10. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 45. Замена лифтового оборудования

По указанной программе в Фонд поступило 56 заявок от 45 субъектов Российской Федерации на сумму 9 718,16 млн. рублей, в том числе включая зачет экономии средств Фонда в сумме 337,51 млн. рублей. С учетом изменений, внесенных в региональные адресные программы и представленных субъектами Российской Федерации в Фонд, общий объем расходов на указанные цели составил 15 546,95 млн. рублей, в том числе 9 660,23 млн. рублей за счет средств государственной корпорации, 5 886,14 млн. рублей — долевого финансирования субъектов Российской Федерации. Эти средства направлены на расселение 2 124 аварийных многоквартирных домов общей площадью 519,3 тыс. кв. м, в которых проживают 32 815 человек.

Необходимо отметить, что в соответствии с частью 2^1 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ в 2011 году перечисление средств Фонда по одобренным заявкам субъектов Российской Федерации осуществлялось в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, исходя из оценки результатов реализации региональных адресных программ, а также иных обстоятельств, указанных в части 1^2 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ (далее — Порядок перечисления средств Фонда).

В связи с наличием незавершенных региональных адресных программ предыдущих периодов по капитальному ремонту многоквартирных домов в 22 субъектах Российской Федерации средства по заявкам 2011 года изначально перечислялись в объеме 30 процентов. В течение года 14 субъектов Российской Федерации завершили реализацию мероприятий по ранее профинансированным программам и получили средства Фонда по заявкам отчетного года в полном объеме. Вместе с тем Республике Карелия, Приморскому краю, Калужской области, Московской области, Мурманской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Ханты–Мансийскому автономному округу не удалось завершить мероприятия региональных адресных программ 2008–2010 годов, объем недоперечисленных средств указанным субъектам Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года составлял 781,34 млн. рублей.

По региональным адресным программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, по заявкам 2011 года средства перечислялись в объеме 30 процентов, оставшаяся часть — по мере представления в Фонд реестров заключенных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, выкуп жилых помещений (далее — реестры контрактов). При этом перечисление средств осуществлялось при условии завершения региональных адресных программ предыдущих лет (за исключением перечислений по региональным адресным программам переселения граждан из аварийного



Рисунок 11. В городе Кургане Курганской области сдали в эксплуатацию дом по улице Кремлева, д. 7, построенный в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и по заявкам субъектов Российской Федерации, которые в 2010 году пострадали от стихийных бедствий).

В течение года 17 субъектов Российской Федерации не представили в Фонд отчетность о завершении региональных адресных программ 2010 года, значительное число субъектов Российской Федерации в полном объеме не заключили коэтракты и не представили в Фонд соответствующие реестры контрактов. По состоянию на 1 января 2012 года 4 613,15 млн. рублей на программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 2 673,84 млн. рублей на региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства оставались неперечисленными.

Сведения об объеме финансовой поддержки, предоставленной субъектам Российской Федерации в соответствии с решениями правления Фонда, представлены в приложении.

Информационные системы Фонда

Учитывая необходимость оперативного информационного обмена, повышение значения доступности информации в области жилищно-коммунального хозяйства и ее высокую социальную востребованность, государственной корпорацией в 2011 году активно развивались созданные в предыдущие годы информационные системы.

Фондом разработаны и используются автоматизированная информационная система «Реформа ЖКХ» (далее — АИС «Реформа ЖКХ») и информационный портал «www.ReformaGKH.ru».

С использованием портала «www.ReformaGKH.ru» (далее также — портал) обеспечивается раскрытие сведений:

- о реализации региональных адресных программ, финансируемых с использованием средств Фонда, с детализацией до уровня многоквартирного дома (опубликована информация о 154 492 многоквартирных домах);
- о выполнении субъектами Российской Федерации основных условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- о составе реестра аварийных домов (опубликована информация о 60 393 аварийных домах);
- о платежах за жилищно-коммунальные услуги с детализацией до уровня муниципального образования, поставщика услуг и вида благоустройства (реализована функция калькулятора для расчета суммы платежа на основании данных ФСТ России о тарифах и нормативах, размере субсидий);
- об основных показателях деятельности организаций, управляющих жилищным фондом (опубликована информация о 3 122 организациях);

В 2011 году Фондом разработана Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. Исходя из количества набранных баллов организации, управляющей жилищным фондом, присваивается рейтинг (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D), который является сводным показателем деятельности организации, управляющей жилищным фондом, за 2011



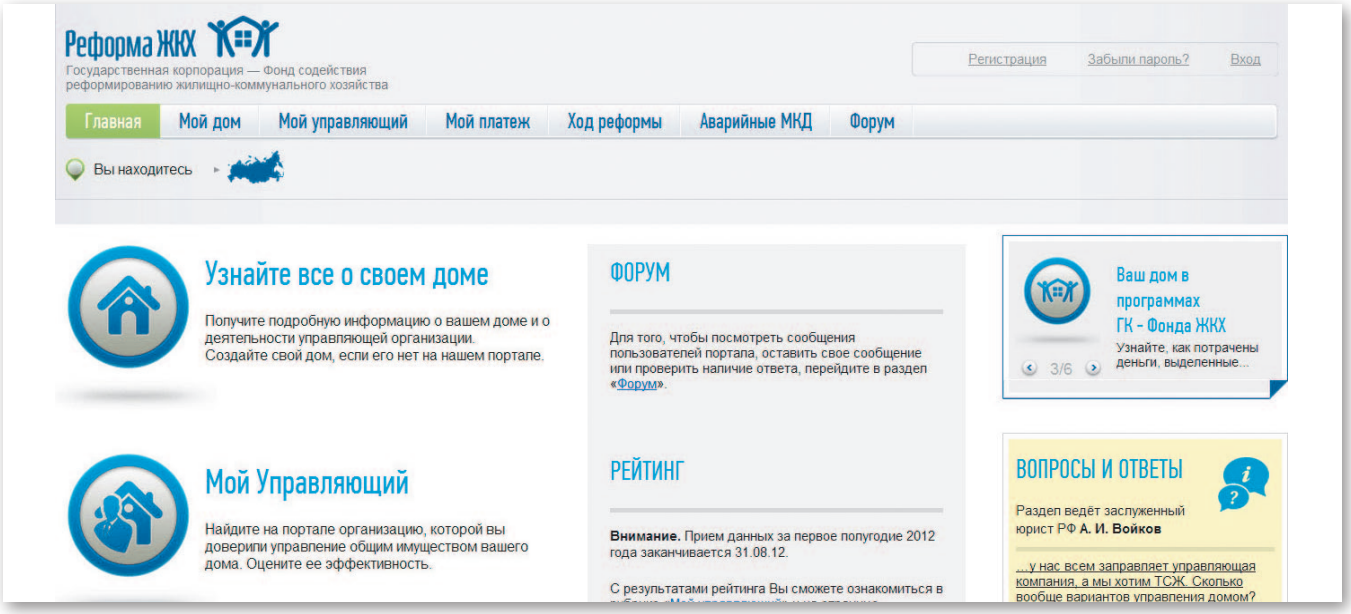


Рисунок 12. Страница портала «www.ReformaGKH.ru»

год. Первые результаты данной оценки за 2011 год размещены на сайте «www.ReformaGKH.ru».

Процедура размещения информации на портале является унифицированной для каждого типа пользователей. Так, организации, зарегистрированные на портале, могут размещать информацию в установленной форме и при необходимости прилагать документацию. Эта информация становятся доступной на сайте для неограниченного круга лиц после прохождения ими процедуры проверки.

В целях повышения эффективности взаимодействия участников отношений в сфере жилищно–коммунального хозяйства, информационной открытости и прозрачности, взаимодействия различных автоматизированных информационных систем Фондом разработан регламент информационного обмена в сфере жилищно–коммунального хозяйства. Указанный регламент определяет стандарты, порядок и основные процедуры обмена информацией в электронном виде между участниками сферы жилищно–коммунального хозяйства на основании заключенных между ними соглашений.

В настоящее время на портале информация предоставлена 11 434 пользователями из 83 субъектов Российской Федерации, 4 243 муниципальными образованиями и 3 122 организациями, управляющими жилищным фондом.

Также на портале организована работа форума, обеспечивающего интерактивное взаимодействие жителей многоквартирных домов, сведения о которых опубликованы на портале, с работниками организаций, осуществляющих управление общим имуществом в многоквартирных домах. Наряду с сообщениями граждан на форуме опубликовываются отчеты Фонда по результатам проведения проверочных мероприятий в многоквартирных домах, вошедших в региональные адресные программы, финансируемые с использованием средств Фонда, а также обеспечивается раскрытие информации о конкурсах по выбору подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

С помощью АИС «Реформа ЖКХ» реализованы функции по подготовке, подаче и проверке документов в составе региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: заявок на финансирование указанных программ, а также оперативной, квартальной и годовой отчетности по их исполнению. Дополнительно в этой системе реализованы функции ведения технических паспортов многоквартирных домов и реестра аварийных домов. Ввод данных в систему обеспечивают 4 243 муниципальных образования. При этом непосредственно с системой работают 6 057 пользователей. В 2011 году 12 287 многоквартирных домов вошли в региональные адресные программы, соответствующие сведения о них введены в систему АИС «Реформа ЖКХ».

Наиболее эффективно информационные системы Фонда используют Удмуртская Республика, Красноярский край, Оренбургская область, Самарская область, Смоленская область, Челябинская область.

В недостаточной степени информационные системы Фонда используют Республика Алтай, Республика Мордовия, Орловская область, Московская область, Мурманская область, Сахалинская область, Тульская область, Тверская область и город федерального значения Санкт–Петербург.

Оперативный контроль хода реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда

Установленный Федеральным законом № 185–ФЗ поступательный механизм проведения преобразований в сфере жилищно–коммунального хозяйства, повышение требований к качеству и своевременности реализации региональных адресных программ еже годно увеличивают ответственность субъектов Российской Федерации, воспользовавшихся финансовой поддержкой государственной корпорации, за исполнением принятых ими обязательств.

С учетом данного обстоятельства Фондом организована многоуровневая система мониторинга и оперативного контроля за использованием средств государственной корпорации и соблюдением условий предоставления финансовой поддержки. Указанная система включает в себя сбор и анализ периодической отчетности субъектов Российской Федерации, проведение выездных проверок в субъектах Российской Федерации, всероссийских селекторных совещаний. В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 185–ФЗ Фондом осуществляется мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Принципы, формы и этапы мониторинга установлены Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом № 185–ФЗ.

В соответствии с указанным Порядком проведение мониторинга базируется на следующих основных принципах:

- многоуровневость организации мониторинга;
- установленная периодичность сбора и анализа отчетности;
- детализированная организация системы отчетности;
- информативность системы мониторинга;
- эффективность системы мониторинга для целей снижения трудозатрат и рисков искажения информации.

На основании статьи 4 договора о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда государственная корпорация осуществляет **контроль реализации данных региональных адресных программ,** в том числе с выездом на места (далее — выездная проверка).

Как и в предыдущие годы, особое внимание уделяется предпроверочному анализу, который осуществляется в рамках упомянутой системы мониторинга на постоянной основе. При этом используется вся доступная информация, в том числе информация, получаемая из средств массовой информации, обращений граждан, а также на портале «www.ReformaGKH.ru».

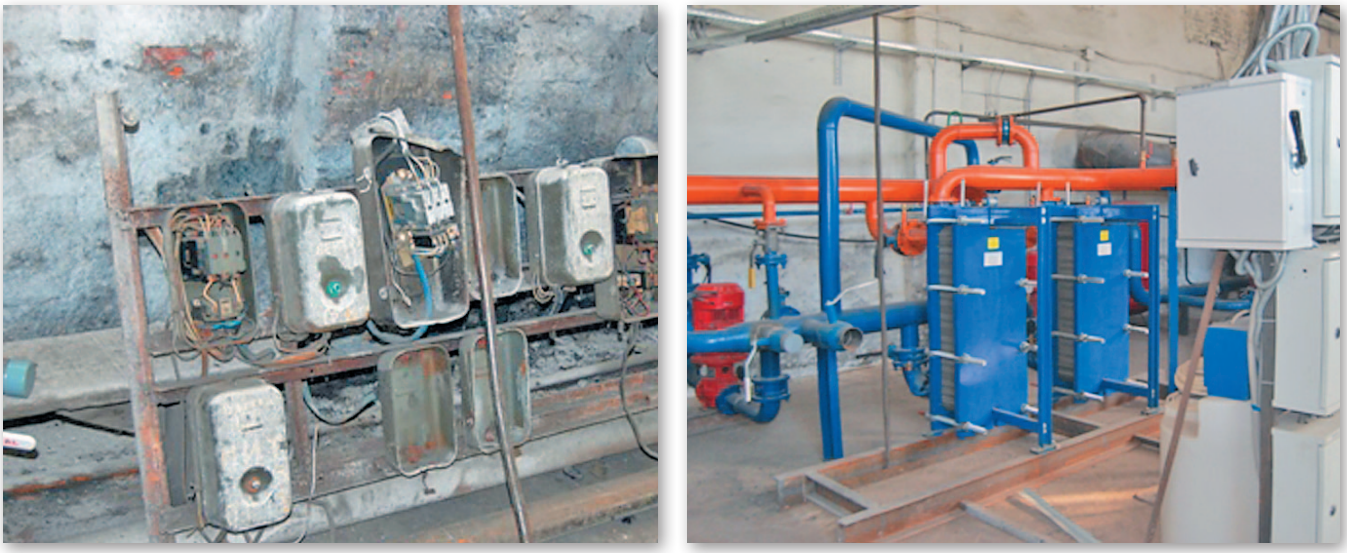


Рисунок 13. Новосибирская область, Сузунский район, с. Болтово. До и после модернизации действующих котельных

В 2011 году в соответствии с утвержденным планом–графиком выездные проверки были проведены в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе 14 — в Центральном федеральном округе, 6 — в Северо–Западном федеральном округе, 5 — в Северо–Кавказском федеральном округе, 5 — в Южном федеральном округе, 5 — в Приволжском федеральном округе, 4 — в Уральском федеральном округе, 4 — в Сибирском федеральном округе, 6 — в Дальневосточном федеральном округе.

Всего было проверено 136 муниципальных образований, в которых обследовано 983 многоквартирных дома, в том числе вновь возводимые многоквартирные дома, предназначенные для переселения из аварийного жилищного фонда.

В ходе выездов в субъекты Российской Федерации проверке подлежали следующие вопросы:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в региональные адресные программы;
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, а также малоэтажного строительства;
- порядок расходования средств Фонда, соблюдение требований бюджетного законодательства;
- фактическое долевое финансирование региональных адресных программ за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.

Следует отметить, что при проведении мониторинга также уделялось внимание вопросам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе выездных проверок в субъектах Российской Федерации проводится также **контроль за выполнением субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,** предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185–ФЗ.

В ходе выездных проверок проанализирована деятельность:

- организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро–, газо–, тепло– и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе товариществ собственников жилья.

Проверено наличие и выполнение:

- графиков проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме;
- установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг только в денежной форме;
- графиков, предусматривающих установление не позднее 1 января 2013 года тарифов на тепловую

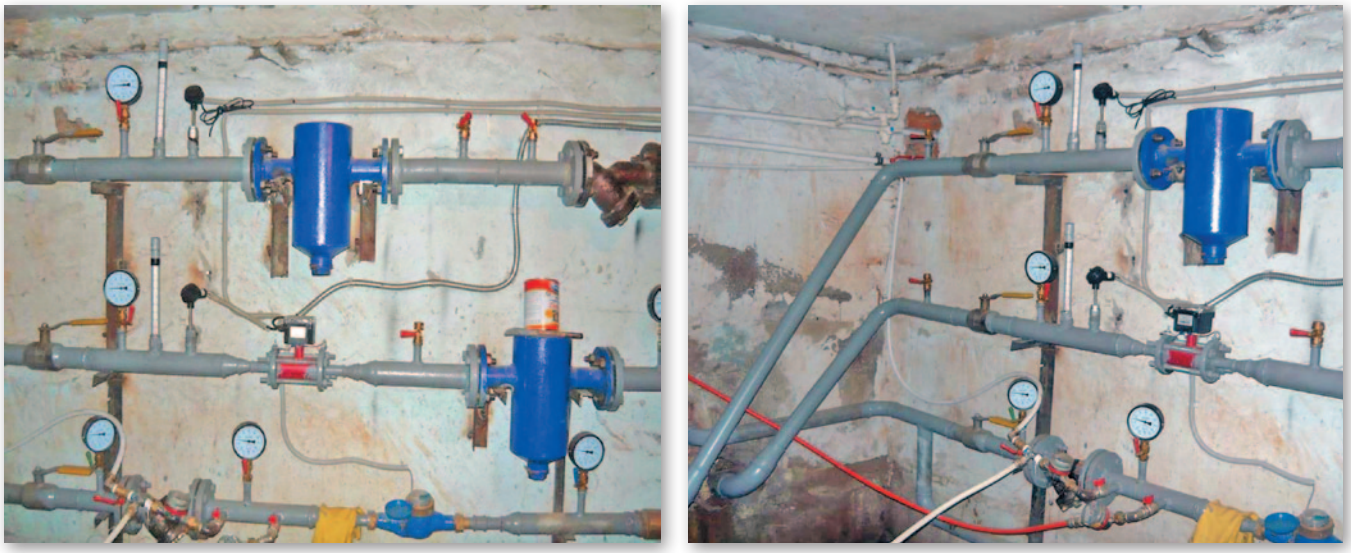


Рисунок 14. Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун ул. Южная, дом 1а. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета

энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей;

• установленных тарифов и надбавок, обеспечивающих необходимые для реализации производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры финансовые потребности организаций коммунального комплекса;

• региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующих требованиям федерального законодательства.

Также в ходе выездных проверок контролировалось непредоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло– и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

В ходе выездных проверок выявлены следующие основные нарушения:

Центральный федеральный округ

1. Брянская область

Выездная проверка проведена в период с 31 января по 4 февраля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Брянск, Дятьково и Сураж.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов не в полной мере соблюдаются требования организационно–правового порядка, нормы и правила при производстве ремонтно–строительных работ; не во всех многоквартирных домах обеспечивается комплексный подход, в связи с чем в проверенных многоквартирных домах имеются недоделки.

2. Владимирская область

Выездная проверка проведена в период с 14 по 18 марта 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Владимир и Вязники.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 2008 и 2009 годов в нарушение требований Федерального закона № 185–ФЗ в ряде случаев без обоснования источников финансирования гражданам предоставлялись жилые помещения большей или меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений;

• объем и стоимость работ, представленные в актах о приемке выполненных работ, не соответствуют объему и стоимости, указанным в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах.



Рисунок 15. Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. 51. Фасад многоквартирного дома до и после капитального ремонта

3. Воронежская область

Выездная проверка проведена в период с 3 по 7 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Воронеж и Семилуки, Рамонское городское поселение.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории города Воронежа фактически достигнутые показатели не соответствуют плановым;

• объем и стоимость работ, представленные в сметной документации и актах о приемке выполненных работ, не соответствуют объему и стоимости, указанным в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах;

• в Воронежской области и проверенных муниципальных образованиях не в полной мере обеспечены координация и контроль реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, о чем свидетельствуют выявленные нарушения требований организационно–правового порядка, норм и правил проведения ремонтно–строительных работ, низкое качество выполненных работ.

4. Ивановская область

Выездная проверка проведена в период с 30 мая по 3 июня 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Вичуга, Иваново и Кохма.

В ходе этой проверки установлено:

• на территории городского округа Кохмы не выполняется условие, предусмотренное пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;

• средства Фонда по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Вичуге израсходованы с нарушением условий части 5 статьи 20[1] Федерального закона № 185–ФЗ;

• имеются факты оплаты фактически невыполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5. Калужская область

Выездная проверка проведена в период с 24 по 28 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Калуга, Кондрово и Сосенский.

В ходе этой проверки установлено:

• выявлены нарушения требований организационно–правового порядка, норм и правил проведения ремонтно–строительных работ, низкое качество выполненных работ;

• выявлены факты несоответствия показателей объема работ, заявленного в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2009 и 2011 годов, объему работ, указанному в сметной документации и фактически выполненному;

• имеются случаи выполнения и оплаты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые не предусмотрены Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом № 185–ФЗ (далее — Методические рекомендации по формированию состава работ);

• исходя из фактических расходов на оплату государственных контрактов и в связи с приобретением дополнительных метров жилой площади при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в городе Калуга объем долевого участия средств Фонда завышен.

6. Костромская область

Выездная проверка проведена в период с 21 по 25 ноября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Буй и Кострома.

В ходе этой проверки установлено:

• в сметную документацию и в акты о приемке выполненных работ включены работы, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ. Проводимые органами местного самоуправления процедуры отбора подрядных организаций не соответствуют принятым на территории Костромской области нормативным правовым актам и методическим рекомендациям Фонда;

• выявлены факты несоответствия показателей объема работ, заявленного в региональной адрес–





Рисунок 16. Костромская область, ул. Пятницкая,д. 29/2. Фасад многоквартирного дома до и после капитального ремонта

ной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2011 года, объему работ, указанному в сметной документации и фактически выполненному;

• не обеспечен возврат сэкономленных средств, образовавшихся в ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в связи с уменьшением в ряде случаев стоимости одного квадратного метра приобретаемых жилых помещений.

7. Курская область

Выездная проверка проведена в период с 21 по 25 ноября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Курск и Щигры, Сеймский сельсовет Мантуровского района.

В ходе этой проверки установлено:

• Курской областью при внесении изменений в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, а также при подаче отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Фонд представлены недостоверные сведения о количестве приобретенных жилых помещений;

• результаты реализации Курской областью региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья не соответствуют показателям данной программы;

• по ряду объектов объем работ, представленный в актах о приемке выполненных работ, не соответствует объему, заявленному в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах;

• в ряде случаев выполнены работы, которые не соответствуют Методическим рекомендациям по формированию состава работ.

8. Липецкая область

Выездная проверка проведена в период с 12 по 16 декабря 2011 года в следующих муниципальных образованиях: Липецкий городской округ и городское поселение — город Усмань Усманского муниципального района.

В ходе этой проверки установлено:

• выявлены факты оплаты на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, не согласованных с органом местного самоуправления, выполнения не в полном объеме работ, предусмотренных региональной адресной программой и сметными расчетами, включения работ, не предусмотренных Методическими рекомендациями по формированию состава работ;

• при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в связи с уменьшением стоимости одного квадратного метра средства Фонда на сумму более 40 млн. рублей должны быть восстановлены на счетах бюджета Липецкой области.

9. Московская область

Выездная проверка проведена в период с 19 по 30 сентября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Клин, Реутов, Серпухов и Ступино, сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района.

В ходе этой проверки установлено:

• администрацией города Ступино представлена неполная информация о выборе способа управления многоквартирными домами и на территории города не выполняется условие, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;

• выявлены нарушения требований организационно–правового порядка, норм и правил проведения ремонтно–строительных работ, низкое качество выполненных работ. Строительный контроль организован на недостаточном уровне. В ряде случаев необоснованно завышены показатели стоимости проведенного капитального ремонта. Проводимые муниципальными образованиями процедуры отбора подрядных организаций не соответствуют принятым на территории Московской области нормативным правовым актам и методическим рекомендациям Фонда;

• выявлены факты несоответствия показателей объема работ, заявленных в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2010 и 2011 годов, объему работ, указанному в сметной документации и фактически выполненному.

10. Орловская область

Выездная проверка проведена в период с 19 по 23 сентября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Орел, Залегощенский и Орловский муниципальные районы.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в городе Орле в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ в ряде случаев при переселении гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений;

• при капитальном ремонте в ряде случаев выполнены работы, которые не соответствуют Методическим рекомендациям по формированию состава работ.

11. Рязанская область

Выездная проверка проведена в период с 24 по 28 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Рязань, Пронское и Шиловское городские поселения.

В ходе этой проверки установлено:

- в городе Рязани и Пронском городском поселении необходимо принять соответствующие меры для реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в установленные Федеральным законом № 185–ФЗ сроки;
- в Рязани реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья осложнена многочисленными исками к гражданам, которые отказались от переселения в предлагаемое жилье;
- при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены факты включения в данную программу работ, не предусмотренных Методическими рекомендациями по формированию состава работ.



Рисунок 17. Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 249. Дом отремонтирован по программе, реализуемой с участием средств Фонда



Рисунок 18. Тульская область, г. Тула, улица Пузакова-Штыковая, д. 19. Дом, построенный по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья

12. Тамбовская область

Выездная проверка проведена в период с 18 по 22 апреля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Кирсанов и Тамбов.

В ходе этой проверки установлено:

- капитальный ремонт и замена лифтового оборудования проведены при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию;
- в городе Тамбове по улице Коммунальная, дом 7, при капитальном ремонте подвального помещения выявлено нецелевое использование средств Фонда.

13. Тверская область

Выездная проверка проведена в период с 10 по 13 мая 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Западная Двина и Тверь.

В ходе этой проверки установлено:

- на территории Тверской области не выполняется условие, предусмотренное пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ, в части предоставления гражданам установленных федеральными законами мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме;
- в результате реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территориях городов Твери и Западной Двины в связи с исключением многоквартирных домов и ряда жилых помещений

из региональных адресных программ, смерти собственников жилых помещений, а также предоставления в ряде случаев гражданам при переселении жилых помещений меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений произошло уменьшение площади расселяемых жилых помещений;

• администрацией Тверской области при подаче заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в нарушение требований пункта 2 статьи 20^2 Федерального закона № 185–ФЗ в региональную адресную программу был включен многоквартирный дом, который является памятником архитектуры и сносу не подлежит.

14. Тульская область

Выездная проверка проведена в период с 9 по 11 марта 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Тула и Щекинский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2008 и 2009 годов в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений;

• выявлены факты несоответствия показателей объема работ, заявленных в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2010 года, объему работ, указанному в сметной документации и фактически выполненному.

Северо-Западный федеральный округ

15. Калининградская область

Выездная проверка проведена в период с 15 по 19 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Калининград, Зеленоградское городское поселение, Пионерский и Светловский городские округа.

В ходе этой проверки установлено:

• объем и источники финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2012 годы соответствуют утвержденным показателям;

• реализация в Пионерском городском округе данной программы осуществляется крайне низкими темпами.

16. Ленинградская область

Выездная проверка проведена в период с 25 по 29 апреля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Всеволожск, Выборг и Пикалево, Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района.

В ходе этой проверки установлено:

• выявлено нарушение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;

• при реализации на территории города Пикалево региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2008–2011 годов и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ в



Рисунок 19. Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская, д. 1. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта

ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений;

• при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены нарушения нормативных документов, а также строительных норм и правил, влияющие на надежность и безопасность многоквартирных домов;

• денежные средства на оплату работ по капитальному ремонту некоторых многоквартирных домов перечислялись в подрядные организации до оформления актов приемки выполненных работ, что не соответствует требованию части 9 статьи 20 Федерального закона № 185–ФЗ.

17. Мурманская область

Выездная проверка проведена в период с 12 по 16 сентября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: закрытое административно–территориальное образование Александровск, города Кандалакша и Оленегорск, Зеленоборское городское поселение.

В ходе этой проверки установлено:

• работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков в городах Кандалакше и Оленегорске ведутся низкими темпами;

• в акты о приемке выполненных работ и в сметную документацию включены работы и затраты, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ.

18. Псковская область

Выездная проверка проведена в период с 28 марта по 1 апреля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Великие Луки и Псков, Островский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• в Островском муниципальном районе выявлено нарушение условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;

• при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены нарушения строительных норм и правил, а также несоответствие фактически выполненного объема работ сметной документации и актам о приемке выполненных работ.

19. Город федерального значения Санкт-Петербург

Выездная проверка проведена в период с 23 по 27 мая 2011 года.

В ходе этой проверки установлено:

• в полном объеме подтверждены указанные в обращениях граждан факты некачественно проведенных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов с использованием средств Фонда;

• при реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены факты нарушения строительных норм и правил, невыполнения в полном объеме работ, предусмотренных сметной документацией и влияющих на надежность и безопасность многоквартирных домов;

• показатели реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в годовом отчете города федерального отчета Санкт–Петербурга не в полной мере соответствуют данным, полученным в ходе выездной проверки.

Северо-Кавказский федеральный округ

20. Республика Дагестан

Выездная проверка проведена в период с 6 по 10 июня 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Дербент и Махачкала, Каякентский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• на территории города Дербента не выполняется условие, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ. Одновременно в городе действуют несколько нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и противоречащих друг другу;

• площадь жилых помещений, указанная в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Каякентскому муниципальному району, превышает фактическую площадь жилых помещений, занимаемую переселяемыми гражданами. В нарушение требований Федерального закона № 185–ФЗ оплата стоимости указанного превышения площади жилых помещений осуществлялась за счет средств долевого финансирования, в том числе средств Фонда.

21. Кабардино-Балкарская Республика

Выездная проверка проведена в период с 13 по 16 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Нальчик и Баксанский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• не выполняются положения постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (далее также — постановление Правительства Российской Федерации № 731);

• в городе Нальчике ни из одного аварийного помещения не переселены граждане в рамках

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, при этом гражданам при их переселении планируется предоставить жилые помещения в коммунальных квартирах, что может повлечь за собой отказы граждан от переселения и срыв реализации данной программы;

• в проверенных муниципальных образованиях в ряде случаев объем работ, представленный в актах о приемке выполненных работ, не соответствует объему, заявленному в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах.

22. Карачаево-Черкесская Республика

Выездная проверка проведена в период с 14 по 18 февраля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Черкесск и Краснокурганское сельское поселение.

В ходе этой проверки установлено:

• в Краснокурганском сельском поселении при капитальном ремонте крыши в доме по Заречному переулку, дом 1 выполнены работы, которые не соответствуют Методическим рекомендациям по формированию состава работ.

23. Республика Северная Осетия–Алания

Выездная проверка проведена в период с 17 по 20 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Владикавказ и Кировский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• не реализованы предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации № 731 требования по раскрытию информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

• по ряду объектов объем работ, представленный в актах о приемке выполненных работ, не соответствует объему, заявленному в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах, в ряде случаев при капитальном ремонте выполнены работы, которые не соответствуют Методическим рекомендациям по формированию состава работ.

24. Ставропольский край

Выездная проверка проведена в период с 24 по 28 января 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город–курорт Железноводск и город Ставрополь.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации на территории города Ставрополя региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальные контракты заключены с нарушением норм законодательства, в связи с чем оплата по указанным контрактам произведена необоснованно;



Рисунок 20. Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Лесная, д. 10. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта

• замена лифтового оборудования выполнена без разработки проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы.

Южный федеральный округ

25. Республика Адыгея

Выездная проверка проведена в период с 24 февраля по 4 марта 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Адыгейск и Майкоп.

В ходе этой проверки установлено:

• не выполняются требования пунктов 1 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;

• при реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены нарушения строительных норм и правил, а также несоответствие фактически выполненного объема работ сметной документации и актам о приемке выполненных работ.

26. Республика Калмыкия

Выездная проверка проведена в период с 14 по 18 марта 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Элиста и Троицкое сельское муниципальное образование.

В ходе этой проверки установлено:

- в городе Элисте товарищества собственников жилья созданы менее чем в 10 процентах многоквартирных домов, что является нарушением пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ;
- не выполняется условие, предусмотренное пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
- в проверенных муниципальных образованиях нарушены условия, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ, в части деятельности на территориях муниципальных образований не менее чем 80 процентов (от общего числа организаций коммунального комплекса) коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов;
- в проверенных муниципальных образованиях объем работ, представленный в актах о приемке выполненных работ, не соответствует объему, заявленному в муниципальных адресных программах и региональной адресной программе. Факт проведения строительного контроля (технадзора) в отношении ряда объектов в установленном порядке не подтверждается;
- в городе Элисте работы по замене лифтового оборудования проводились без разработки проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на данную документацию.

27. Краснодарский край

Выездная проверка проведена в период с 10 по 12 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Новороссийск и город–курорт Сочи.

В ходе этой проверки установлено:

- администрацией Краснодарского края не обеспечено эффективное использование средств Фонда, направленных на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2010 года в городе Сочи.
- не выполнено поручение Правительства Российской Федерации, предусмотренное пунктом 6 протокола от 21 апреля 2010 года № ДК–П9–52пр, в части обеспечения в полном объеме за счет средств бюджета Краснодарского края переселения граждан, запланированного в 2010 году в рамках данной программы.

28. Волгоградская область

Выездная проверка проведена в период с 18 по 22 июля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Волгоград и Михайловка.

В ходе этой проверки установлено:

- имеются случаи выполнения и оплаты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, не предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 185–ФЗ и Методическими рекомендациями по формированию состава работ;
- при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2010 и 2011 годов в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений.



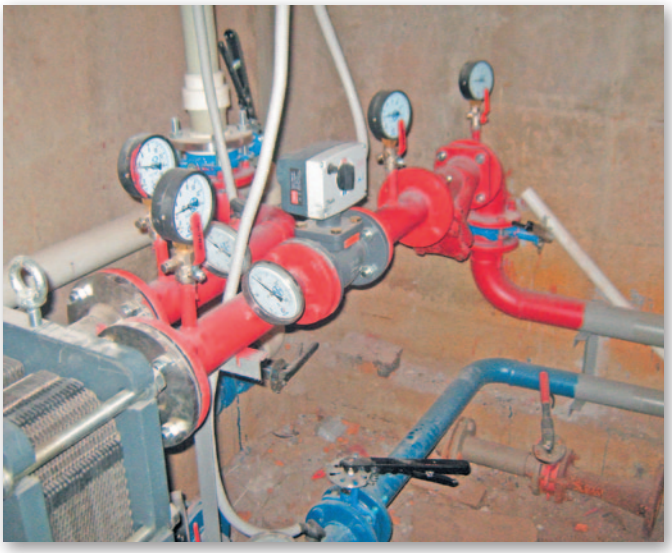


Рисунок 21. Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 16. Замена коммуникаций



Рисунок 22. Кировская область, г. Вятские Поляны. Многоквартирный дом после капитального ремонта

29. Ростовская область

Выездная проверка проведена в период с 14 по 18 февраля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Гуково, Ростов–на–Дону и Таганрог.

В ходе этой проверки установлено:

- замена лифтового оборудования выполнена без разработки проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы;
- в городе Гуково при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований в 2010 году не заключены муниципальные контракты на приобретение 27 жилых помещений для переселения граждан.

Приволжский федеральный округ

30. Республика Башкортостан

Выездная проверка проведена в период с 11 по 15 апреля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Ишимбай и Уфа.

В ходе этой проверки установлено:

- при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда допущены нарушения при оплате приобретаемых помещений и нарушения части 3 статьи 20^5 Федерального закона № 185–ФЗ, в результате чего средств Фонда излишне выплачено на сумму свыше 11 929,42 тыс. рублей, которые подлежат восстановлению на счете бюджета Республики Башкортостан;
- акты о приемке выполненных работ не всегда согласовываются с администрацией муниципального образования, что не соответствует части 9 статьи 20 Федерального закона № 185–ФЗ.

31. Республика Марий-Эл

Выездная проверка проведена в период с 7 по 11 февраля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Йошкар–Ола и Советский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

- при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2008 и 2009 годов в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений;
- указанные в годовом отчете за 2010 год показатели объема работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем не соответствуют объему работ, указанному в сметной документации и фактически выполненному.

32. Удмуртская Республика

Выездная проверка проведена в период с 26 по 30 сентября 2011 года в следующих муниципальных

образованиях: города Воткинск и Ижевск, Воткинский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городе в Воткинске и Воткинском муниципальном районе допущены нарушения при оплате приобретаемых жилых помещений, в результате чего средств Фонда излишне выплачено на сумму 1 794,94 тыс. рублей, которые подлежат восстановлению на счете бюджета Удмуртской Республики;

• объем и стоимость работ, указанные в сметной документации и актах о приемке выполненных работ, не соответствуют объему и стоимости, указанным в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

• при проведении капитального ремонта многоквартирных домов имеются случаи выполнения и оплаты работ, не предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 185–ФЗ и Методическими рекомендациями по формированию состава работ.

33. Кировская область

Выездная проверка проведена в период с 11 по 15 апреля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Вятские Поляны и Киров.

В ходе этой проверки установлено:

• в проверенных муниципальных образованиях объем работ, представленный в актах о приемке выполненных работ, не соответствует объему, заявленному в муниципальных адресных программах и региональных адресных программах;

• в нарушение статьи 20^1 Федерального закона № 185–ФЗ, а также условий государственных контрактов не соблюдены сроки завершения строительства многоквартирных домов, своевременно не была обеспечена государственная регистрация прав собственности Кировской области на жилые помещения, нарушен порядок оплаты в части проведения окончательного расчета по государственным контрактам.

34. Нижегородская область

Выездная проверка проведена в период с 16 по 20 мая 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Заволжье, Нижний Новгород и Павлово.

В ходе этой проверки установлено:

• в городе Нижний Новгород застройщиком введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по улица Богдановича, дом 4 и дом 4, корпус 1 с нарушениями строительных норм и правил, с несоблюдением температурного режима в жилых помещениях в зимний период;

• выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые не соответствуют Методическим рекомендациям по формированию состава работ. Имеются факты оплаты невыполненных работ.

35. Самарская область

Выездная проверка проведена в период с 17 по 21 января 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Жигулевск, Самара и Тольятти.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья и с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства приобретена излишняя площадь жилых помещений за счет средств Фонда;

• в сметной документации и в актах о приемке выполненных работ учтены виды работ, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ;



Рисунок 23. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мира, д. 31. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта

• Самарской областью не соблюдены обязательства по сохранению и созданию рабочих мест, обеспеченности занятости населения на территории монопрофильного муниципального образования, предусмотренные комплексным планом в связи с предоставлением средств Фонда (соглашение с Фондом о взаимодействии при поддержке монопрофильных муниципальных образований от 29 июня 2010 года).



Рисунок 24. Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 24. Многоквартирный дом после капитального ремонта

Уральский федеральный округ

36. Курганская область

Выездная проверка проведена в период с 15 по 20 мая 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Курган и Шадринск.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2009 года допущены нарушения при оплате приобретаемых жилых помещений, в результате чего средств Фонда излишне выплачено на сумму свыше 6 295,8 тыс. рублей, которые подлежат восстановлению на счете бюджета Курганской области. Кроме того, информация по реализации данной программы, представленная Курганской областью в годовом отчете за 2010 год, не соответствует фактическим данным в части размера приобретенной площади жилых помещений.

37. Тюменская область

Выездная проверка проведена в период с 11 по 15 июля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Тюмень, Ялуторовск и Ялуторовский муниципальный район.

В ходе этой проверки установлено:

• в городе Тюмени в перечни многоквартирных домов, находящихся в управлении проверяемых управляющих организаций, включены также не многоквартирные дома, а жилые дома. Таким образом, которые представленные Тюменской областью в годовом отчете данные о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций, не соответствуют фактической ситуации;

• строительный контроль по заданию заказчика на основе договоров выполняют организации, не имеющие соответствующей разрешительной документации на данный вид работ.

38. Челябинская область

Выездная проверка проведена в период с 17 по 21 октября 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Миасс и Челябинск, Саткинское городское поселение.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации на территориях городов Миасса и Челябинска региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2010 года установлены факты оплаты за счет средств Фонда стоимости приобретаемых жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра, установленнае данными программами, что нарушает требования части 4 статьи 16 Федерального закона № 185–ФЗ;

• в ряде случаев при реализации на территории города Челябинска региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2010 года граждане были переселены в жилые помещения, предназначенные для переселения граждан в рамках других программ, и жилые помещения, которые в целях реализации данных программ не приобретались;

• в сметную документацию и в акты о приемке выполненных работ включены работы, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ;

• на территории Саткинского городского поселения с использованием средств Фонда необоснованно произведена оплата фактически не выполненных работ и услуг при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2009 года.

39. Ханты-Мансийский автономный округ

Выездная проверка проведена в период с 29 августа по 2 сентября 2011 года в следующих муници–

пальных образованиях: города Мегион, Нижневартовск и Сургут.

В ходе этой проверки установлено:

• в ряде случаев протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о выборе способа управления ими оформлены с нарушениями статьи 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

• управляющими организациями не выполняются требования постановления Правительства Российской Федерации № 731;

• показатели реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов не соответствуют данным этой проверки.

Сибирский федеральный округ

40. Республика Алтай

Выездная проверка проведена в период с 8 по 12 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Горно-Алтайск, Турочакский и Чемальский районы.

В ходе этой проверки установлено:

• протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о выборе способа управления ими оформлены с нарушениями положений статьи 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

• имеются факты включения в акты о приемке выполненных работ и в сметную документацию работ и затрат, не предусмотренных Методическими рекомендациями по формированию состава работ;

• выявлены несоответствия стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сметной стоимости и фактическим затратам;

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010–2011 годах предоставлены дополнительные жилые помещения площадью 52,64 кв. м, что повлекло за собой необоснованное расходование средств в размере 1 380,74 тыс. рублей, которые подлежат восстановлению на счете бюджета Республики Алтай.

41. Красноярский край

Выездная проверка проведена в период с 20 по 24 июня 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Ачинск, Боготол, Красноярск и Норильск.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2008 и 2009 годов в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185-ФЗ в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений.



Рисунок 25. Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку. Многоквартирный дом в процессе и после капитального ремонта

42. Иркутская область

Выездная проверка проведена в период с 4 по 8 июля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Байкальск, Иркутск и Шелехов.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены факты нарушений строительных норм и правил и невыполнения в полном объеме работ, предусмотренных данной программой;

• имеются факты включения в акты о приемке выполненных работ и в сметную документацию работ и затрат, не предусмотренных Методическими рекомендациями по формированию состава работ;

• акты о приемке выполненных работ в отношении проверенных многоквартирных домов оформлены без соблюдения требований, изложенных в

части 9 статьи 20 Федерального закона № 185–ФЗ;

• при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2010 года в ряде случаев в нарушение требований жилищного законодательства и Федерального закона № 185–ФЗ гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений.

43. Томская область

Выездная проверка проведена в период с 1 по 5 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Томск и Асиновское городское поселение.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выявлены факты предоставления жилых помещений, площадь которых превышает площадь расселяемых жилых помещений без дополнительного финансирования за счет местных бюджетов, что привело к необоснованному расходованию средств Фонда;

• при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выявлены факты нарушений строительных норм и правил, невыполнения в полном объеме работ, предусмотренных данной программой.

Дальневосточный федеральный округ

44. Камчатский край

Выездная проверка проведена в период с 1 по 6 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Петропавловск–Камчатский, Елизовское городское поселение Елизовского района.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации на территории Елизовского городского поселения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения меньшей площади по сравнению с площадью ранее занимаемых жилых помещений.

45. Приморский край

Выездная проверка проведена в период с 23 по 26 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Артем и Владивосток.

В ходе этой проверки установлено:

• в сметную документацию и в акты о приемке выполненных работ включены работы, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ;

• в ряде случаев акты приемки работ в нарушение статьи 20 Федерального закона № 185–ФЗ не согласовываются с органами местного самоуправления.

46. Хабаровский край

Выездная проверка проведена в период с 27 по 30 июня 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Хабаровск и село Некрасовка Хабаровского муниципального района.

В ходе этой проверки установлено:

• в Хабаровском крае не разработан единый порядок отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

• информация, изложенная в рассмотренных жалобах и обращениях граждан по поводу некачественного ремонта подрядными организациями, подтвердилась.



Рисунок 26. Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Индустриальная, дом 5. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта



Рисунок 27. Республика Алтай, ул. Социалистическая, д. 10. Многоквартирный дом после капитального ремонта

47. Амурская область

Выездная проверка проведена в период с 4 по 9 июля 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Благовещенск и Свободный.

В ходе этой проверки установлено:

• при реализации на территории города Свободного региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в ряде случаев гражданам предоставлялись жилые помещения, площадь которых не соответствует площади ранее занимаемых жилых помещений.

48. Магаданская область

Выездная проверка проведена в период с 5 по 9 декабря 2011 года в следующих муниципальных образованиях: город Магадан и поселок Армань Ольского района.

В ходе этой проверки установлено:

• за счет средств Фонда необоснованно произведена оплата фактически невыполненных работ и услуг при реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

• в сметную документацию и в акты о приемке выполненных работ в ряде случаев включены работы, не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ.

49. Сахалинская область

Выездная проверка проведена в период с 26 по 31 августа 2011 года в следующих муниципальных образованиях: города Корсаков и Южно-Сахалинск.

В ходе этой проверки установлено:

• в перечни многоквартирных домов, находящихся в управлении проверяемых управляющих организаций, включены также не многоквартирные дома, а жилые дома. Таким образом, представленные Сахалинской областью в годовом отчете, данные о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций, не соответствуют фактической ситуации;

• при разработке и реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на подготовительных этапах администрацией Корсаковского городского округа недостаточно осуществлялся анализ ситуации, что послужило причиной для внесения в данную программу изменений и повлекло за собой продление сроков ее реализации. В результате реализация данной программы осуществляется низкими темпами. Не заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов;

• в ряде случаев акты приемки работ в нарушение статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ не согласовываются с органами местного самоуправления.

Наряду с описанными выше плановыми проверками в 2011 году 18 субъектов Российской Федерации (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край, Ставропольский край, Владимирская область, Воронежская область, Иванов-

ская область, Московская область, Оренбургская область, Псковская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Ярославская область, город федерального значения Санкт–Петербург) были дополнительно проверены вне плана.

Так, например, в ходе внеплановой проверки в Тверской области, проведенной 15 декабря 2011 года, выявлено, что у многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Калязин, улица Шорина, дом 49 А и строящегося в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2009–2011 годов, произошло обрушение облицовки из силикатного кирпича торцевой наружной стены. Рабочей группой Фонда было рекомендовано провести государственную экспертизу проектной документации на указанный дом.

В ходе проверки Свердловской области, проведенной в период с 14 по 17 ноября 2011 года, выявлено, что при реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов фактические затраты труда по замене лифтового оборудования значительно ниже затрат, учтенных сметной документацией. В целях недопущения аналогичных нарушений рабочей группой Фонда были даны рекомендации органам исполнительной власти Свердловской области провести соответствующую проверку по всем муниципальным образованиям, включенным в данные программы, а также активизировать работу по оптимизации расходов на ремонт и замену лифтового оборудования.

Аналогичные нарушения также выявлены в ходе внеплановой проверки в Красноярском крае.

В рамках работы по усилению контроля за устранением субъектами Российской Федерации нарушений, выявляемых при проведении мониторинга, в отношении наиболее значимых из выявленных Фондом нарушений направлялись обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Так, например, в период с 4 по 8 июля 2011 года рабочей группой Фонда проводилась выездная проверка на территории Иркутской области, в ходе которой установлено, что денежные средства, выделенные на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: городское поселение Байкальск, микрорайон Южный, первый квартал, дом 39, в полном объеме были израсходованы на ремонт крыши другого многоквартирного дома. Соответствующая информация направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия мер реагирования.

На основании информации, направленной Фондом, Прокуратурой Иркутской области проведена проверка реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Байкальского муниципального образования, в ходе которой был выявлен ряд нарушений Федерального закона № 185–ФЗ. По результатам указанной проверки главе Байкальского муниципального образования и товариществу собственников жилья «Южный» направлены представления об устранении выявленных нарушений.

С октября 2011 года мероприятия по мониторингу реализации региональных адресных программ и выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда осуществляются Фондом в тесном взаимодействии с представителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе.

За период с начала октября 2011 года совместно с органами прокуратуры проведены проверки в 19 субъектах Российской Федерации, из них в 11 субъектах Российской Федерации проведены плановые проверки, а именно: в Кабардино–Балкарской Республике, Республике Северная Осетия–Алания, Краснодарском крае, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Костромской области, Липецкой области, Магаданской области, Рязанской области и Челябинской области. В 8 субъектах Российской Федерации проведены внеплановые проверки, а именно: в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Красноярском крае, Московской области, Псковской области, Саратовской области, Свердловской области и Тверской области. Всего проверено 42 муниципальных образования.

При подготовке всех выездных проверок заблаговременно проводится координационная работа с представителями органов прокуратуры в проверяемом субъекте Российской Федерации, осуществляются совместные осмотры объектов капитального ремонта, а также объектов, входящих в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Итоговые отчеты о результатах выездной проверки, подготовленные рабочей группой Фонда, направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

За истекшее время подобная практика совместной работы показала свою эффективность.

Так, например, в рамках проверки, проведенной с 17 по 21 октября 2011 года совместно с сотрудниками органов прокуратуры в Челябинской области установлено, что на территории Саткинского городского поселения в ходе капитального ремонта многоквартирного дома № 27, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, были оплачены материалы, которые фактически не приобретались. Кроме того, в ходе капитального ремонта дома № 74, расположенного в 4 квартале, были выявлены случаи включения в акты о приемке выполненных работ и случаи их фактической оплаты с использованием

средств Фонда работ и затрат, которые на самом деле не осуществлялись.

Все замечания и нарушения, выявленные рабочей группой Фонда в ходе проверки Челябинской области, отражены в акте, который в установленном порядке направлен в адрес губернатора Челябинской области и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В свою очередь, Саткинской городской прокуратурой проведена проверка, по результатам которой внесено представление главе Саткинского городского поселения об устранении нарушений законодательства и о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

В период с 17 по 20 октября 2011 года рабочей группой Фонда проводилась выездная проверка на территории Республики Северная Осетия–Алания и Республики Ингушетия.

По результатам мониторинга в городе Владикавказе работниками Фонда проведен «круглый стол» с участием представителей Прокуратуры Республики Северная Осетия–Алания и Республики Ингушетия, а также работников жилищно–коммунального хозяйства указанных субъектов Российской Федерации на тему усиления контроля за реализацией региональных адресных программ и дальнейшего взаимодействия по данным вопросам. Материалы с результатами проверки были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

С использованием информации, направленной Фондом, Прокуратурой Республики Ингушетия проведена проверка реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территориях городов Назрани и Малгобек. По результатам указанной проверки в адрес главы администрации города Назрани внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и о возможном привлечении к установленной законом ответственности. Кроме того, в отношении главы администрации города Малгобека возбуждены три дела об административных правонарушениях и вынесены три постановления о наложении штрафа на общую сумму 150 тыс. рублей.

В ряде случаев проводятся совместные внеплановые проверки по информации, представленной в обращениях граждан, средствах массовой информации, а также по фактам, выявляемым в ходе проверок иных контролирующих органов. Подобные проверки проводились на территориях Краснодарского края, Московской области, Псковской области, Саратовской области и города федерального значения Санкт–Петербурга. По результатам подобных проверок составляются совместные акты с участием представителей прокуратуры и органов местного самоуправления с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.

Так, например, по результатам проведения проверки реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и осмотра многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Дирижабельная, дом 10 в городе Долгопрудном Московской области, выявлен срыв сроков производства работ по системе отопления, а также нарушение требований пункта 7 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, касающихся проведения строительного контроля заказчиком.

На территории города Твери Тверской области выявлены факты неправомерной оплаты работ по капитальному ремонту на сумму свыше 4,8 млн. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Кроме того, в результате мониторинга, проводимого Фондом как в ходе выездных проверок, так



Рисунок 28. Челябинская область, ул. Октябрьская, д. 10. Крыша многоквартирного дома до и после капитального ремонта

и по поступающим обращениям граждан, в органы прокуратуры для рассмотрения и принятия решения о мерах прокурорского реагирования в декабре 2011 года направлена информация о выявленных нарушениях в Приморском крае, Воронежской области, Самарской области и Саратовской области.

Информация о принятии мер прокурорского реагирования по результатам совместных проверок поступает в государственную корпорацию (Фондом получена информация по Краснодарскому краю, Приморскому краю, Воронежской области, Калужской области, Рязанской области и Самарской области).

Как и в предыдущие годы, Фонд осуществляет активное взаимодействие с Федеральной службой финансово–бюджетного надзора (Росфиннадзор).

На постоянной основе проводится работа по мониторингу ситуации в субъектах Российской Федерации, упомянутых в аналитической справке о результатах по контролю мероприятий, проведенных Федеральной службой финансово–бюджетного надзора.

В соответствующие субъекты Российской Федерации направляются запросы о представлении информации о выявленных нарушениях и принятых субъектами Российской Федерации мерах по их устранению. Проводятся анализ представленных документов и контроль за устранением нарушений. Ход устранения выявленных нарушений контролируется в ходе выездных проверок. Так, например:

• в Республике Калмыкия выявлено неправомерное расходование денежных средств в городе Элисте на сумму 759,1 тыс. рублей, Троицком сельском муниципальном образовании на сумму 293,2 тыс. рублей и Малодербетовском сельском муниципальном образовании на сумму 108,7 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены в ходе проведения проверки. На суммы выявленных завышений по согласованию с жителями выполнены дополнительные работы. Должностные лица, допустившие нарушение в расходовании средств, привлечены к дисциплинарной ответственности;

• в Ростовской области выявлены несоответствие объема выполненных работ сметным показателям, выполнение работ, не предусмотренных сметной документацией, а также несоответствие применяемых строительных материалов. По результатам проведенной проверки выявленные нарушения устранены. Сметная документация откорректирована и согласована с собственниками помещений в многокваартирных домах, на суммы выявленных завышений по согласованию с жителями выполнены дополнительные работы.

Анализ материалов проведенных проверок позволяет определить наиболее часто встречающиеся нарушения, а именно:

• переселение граждан, проживающих по договорам социального найма, в жилые помещения, об–





Рисунок 29. Новосибирская область,Чулымский район, г. Чулым, пер. Иткульский, дом 7. Многоквартирный дом до и после капитального ремонта

щая площадь которых не соответствует общей площади ранее занимаемых ими жилых помещений;

• нарушение сроков исполнения контрактов при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья и необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, а также неприменение санкций в отношении подрядных организаций;

• несоответствие показателей, представленных в заявках (площадь, объем, виды работ и другие), фактическим показателям, указанным в актах выполненных работ, а также завышение объема проводимых работ;

• несоответствие показателей реформирования жилищно–коммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185–ФЗ и представленных в составе периодиче–

ской отчетности, фактическим данным, в том числе несоответствие фактических данных о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность на территориях муниципальных образований, где проведены проверки, а также о многоквартирных домах, входящих в состав товариществ собственников жилья, сведениям, представляемым в Фонд.

По итогам выездных проверок в адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Фондом направлены отчеты с выводами и рекомендациями по устранению выявленных недостатков и проведению соответствующих проверок во всех муниципальных образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда. По результатам проведенных проверок **нарушения, допущенные в субъектах Российской Федерации, в большей части устранены в установленном порядке, в том числе некоторые устранены еще в ходе проведения проверок.**

Вместе с тем по результатам проведенных выездных проверок ввиду неустранения допущенных нарушений в 2011 году решением правления Фонда было приостановлено предоставление финансовой поддержки четырем субъектам Российской Федерации:

- Республика Бурятия (нецелевое использование денежных средств в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда);
- Республика Калмыкия (нарушение требований статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ в части наличия установленной доли товариществ собственников жилья в многоквартирных домах и предоставления мер социальной поддержки в денежной форме);
- Пермский край (нецелевое использование денежных средств в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда);
- Ивановская область (нецелевое использование денежных средств в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда).

Следует отметить, что по результатам выездных проверок, проведенных в 2011 году, можно выделить и **положительные моменты.**

В субъектах Российской Федерации, в которых на должном уровне ведется работа по правовому и методическому обеспечению, налажен контроль за исполнением принятых нормативных правовых актов, отмечается улучшение качества проведения капитального ремонта, а выявляемые недочеты устраняются подрядчиками до окончания капитального ремонта, что подтверждается специалистами строительного контроля и, в свою очередь, приводит к уменьшению количества жалоб граждан.

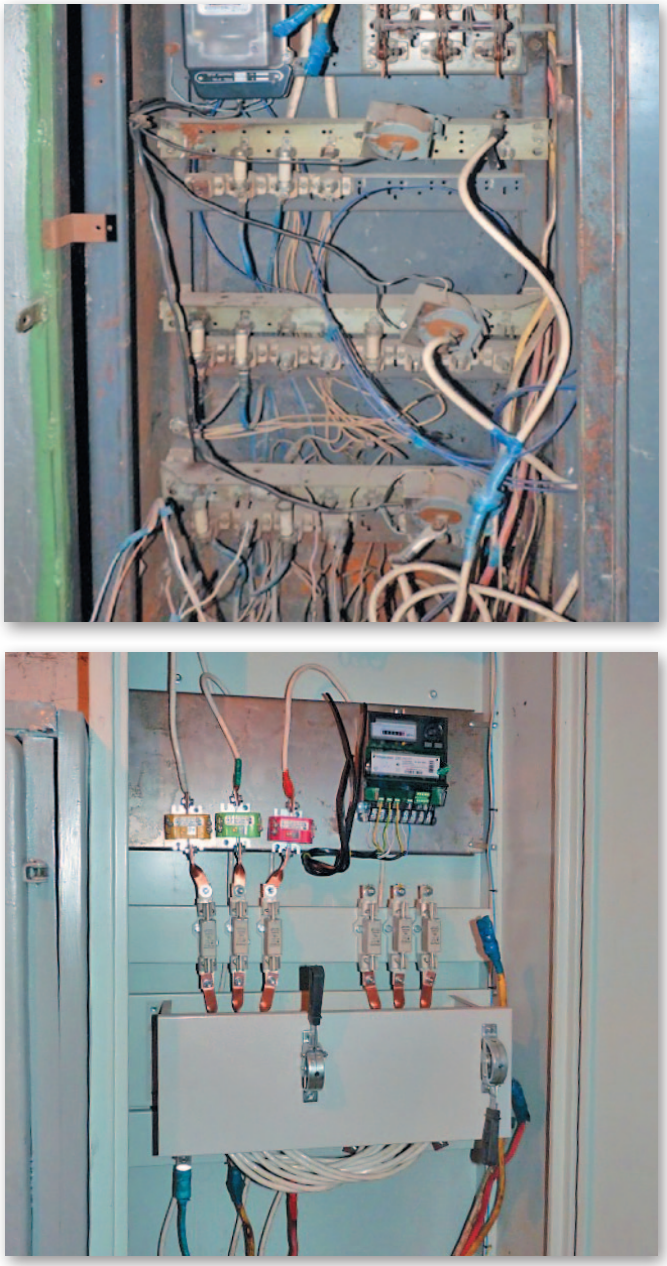


Рисунок 30. Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, д. 3. Распределительный шкаф до и после капитального ремонта многоквартирного дома

Результаты проверок Фонда показывают, что жители многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах, активно проявляют инициативу в организации управления общим имуществом в многоквартирном доме и контроля за расходованием средств, выделяемых на проведение капитального ремонта, то есть становятся ответственными собственниками своих квартир. Нередко жители многоквартирных домов выделяют дополнительные денежные средства на улучшение жилищных условий, например, на ремонт подъездов, благоустройство придомовых территорий.

Постоянная и планомерная работа Фонда по контролю за выполнением региональных адресных программ, расходованию выделяемых средств и соблюдению условий предоставления финансовой поддержки положительно влияет на развитие отрасли.

Субъекты Российской Федерации продолжили практику широкого применения технологий и материалов, направленных на снижение теплопотерь при эксплуатации многоквартирных домов после проведенного капитального ремонта и повышение общей энергоэффективности.

Для обеспечения эффективного использования средств Фонда и средств долевого финансирования, выделенных на реализацию региональных адресных программ, государственной корпорацией ведется постоянный мониторинг отдельных банковских счетов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и управляющих организаций, открываемых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ для перечисления указанным организациям средств из местных бюджетов для оплаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 июля 2009 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее — Федеральный закон № 144-ФЗ) указанные банковские счета открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Российской Федерации или Банку России, в размере, позволяющем определять решения указанных кредитных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей (участников). Перечень кредитных организаций, в которых могут быть открыты отдельные банковские счета, устанавливается Минфином России. В 2011 году в перечень таких организаций были включены Сбербанк России (ОАО), Банк ВТБ (ОАО), ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «РФК-банк».

На основании отчетов о наличии денежных средств в кредитных организациях в течение 2011 года Фондом проводился анализ выполнения требований статьи 1 и пункта 3 статьи 3 Федерального закона № 144-ФЗ, в результате которого установлено, что отдельными товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами и управляющими организациями указанные требования не выполнялись в Республике Татарстан, Оренбургской области и Тверской области. В связи с этим Фондом проводилась работа по устранению указанных нарушений.

По состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2011 года имелся остаток денежных средств у товарищества собственников жилья «Радищева, 37» в городе Твери в размере 163,05 тыс. рублей в ФКБ «Огни Москвы Тверской». По информации департамента жилищно-коммунального и городского хозяйства Тверской области в Арбитражном суде Тверской области находилось в производстве дело по иску департамента жилищно-коммунального хоязйства администрации города Твери к данному товариществу собственников жилья. По состоянию на 1 октября 2011 года определением арбитражного суда Тверской области от 7 октября 2011 года судебное разбирательство приостановлено в связи с назначением повторной экспертизы. По отчету на 1 января 2012 года все нарушения были устранены.

По состоянию на 1 октября 2011 года Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области сообщило, что в рамках реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Заглядинского сельсовета Асекеевского района управляющей компанией товарищества собственников жилья «Наш дом» был открыт специальный счет в ОАО КБ «Спутник». В рамках устранения нарушений законодательства начат процесс перевода денежных средств на специальный счет в ОАО «Россельхозбанк», рекомендуемый Минфином России для открытия счетов получателей субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. По состоянию на 1 января 2012 года указанные нарушения устранены.

В Республике Татарстан по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2011 года все имеющиеся средства на отдельных счетах товариществ собственников жилья (30 195,04 тыс.рублей), жилищно-строительных кооперативов (60 5950,13 тыс. рублей) и управляющих организаций (176 592,92 тыс. рублей) находились в акционерном коммерческом банке «АК БАРС». Для устранения указанных нарушений Фондом было направлено обращение в адрес Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова о необходимости перевода средств, направленных из местных бюджетов на счета получателей субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, из акционерного коммерческого банка «АК БАРС» в кредитные организации, рекомендованные Минфином России. По состоянию на 1 января 2012 года все вышеуказанные нарушения в Республике Татарстан устранены.

По состоянию на 1 января 2012 года во всех субъектах Российской Федерации специализированные банковские счета товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и управляющих организаций открыты только в кредитных организациях, соответствуют требованиям Федерального закона № 144-ФЗ.

Формой текущего контроля Фонда также является проведение всероссийских селекторных совещаний.

В 2011 году состоялось 5 всероссийских селекторных совещаний, на которых были заслушаны представители 42 субъектов Российской Федерации. В работе селекторных совещаний принимали участие представители Минрегиона России, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Росфиннадзора, Росфинмониторинга, а также Федеральной службы по тарифам.

В ходе совещаний рассматривались такие вопросы, как энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках реализации Федерального закона № 185–ФЗ, результаты осуществления оперативного контроля, а также вопросы, связанные с ходом реализации региональных адресных программ и выполнением условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Организация работы по обращениям граждан

В рамках проводимого мониторинга большое внимание уделяется работе с поступающими в Фонд обращениями и жалобами граждан, которые также используются специалистами Фонда при проведении выездных проверок.

Всего за 2011 год в Фонд поступило в письменной форме и обработано 1 054 обращения граждан, что на 9,8 процента превышает соответствующий показатель 2010 года.

В целом в отчетный период наибольшее количество обращений и жалоб поступило от граждан, проживающих в следующих субъектах Российской Федерации:

- Московская область — 45 обращений;
- Краснодарский край — 43 обращения;
- Самарская область — 40 обращений;
- Ставропольский край — 34 обращения;
- Саратовская область — 33 обращения.

Поступающие в Фонд обращения и жалобы граждан наиболее часто касаются вопросов некачественно проведенного капитального ремонта, разъяснения норм жилищного законодательства и включения в финансируемые с участием средств Фонда региональные адресные программы.

Специалисты Фонда своевременно рассматривают указанные обращения, анализируют полученную информацию, подготавливают ответы, разъясняющие позицию Фонда по затрагиваемым проблемам, и направляют их в адрес заявителей, а также иных лиц, заинтересованных в решении поднятых вопросов. При необходимости направляются дополнительные запросы в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, при этом обращения оставляются на контроле у Фонда до поступления исчерпывающего ответа от соответствующего субъекта Российской Федерации.

Кроме того, исходя из типового характера многих обращений, Фонд разместил на своем официальном сайте «www.fondgkh.ru» информацию и разъяснения по наиболее часто задаваемым в обращениях граждан вопросам.

Несмотря на возросшее количество обращений граждан в 2011 году, основные усилия были направлены на улучшение качества их рассмотрения, в том числе повышение оперативного реагирования на жалобы, касающиеся качества выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и качества предоставленного жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Подобные жалобы от жителей муниципальных образований, проверяемых в ходе выездных проверок, рассматривались рабочей группой Фонда на месте, включая непосредственные выезды к заявителям.

Результатом проведенной работы стало увеличение количества рассмотренных в ходе выездных проверок обращений граждан по сравнению с 2010 годом в два с половиной раза. Так, в 2011 году в рамках плановых и внеплановых выездных проверок проведена работа по 87 обращениям в 38 субъектах Российской Федерации.

Из проверенных в ходе выездных проверок обращений граждан 12 процентов жалоб не подтвердилось, 25 процентов жалоб подтвердилось, но на момент выездной проверки замечания были устранены, в остальных случаях устранение выявленных нарушений находится на контроле Фонда.

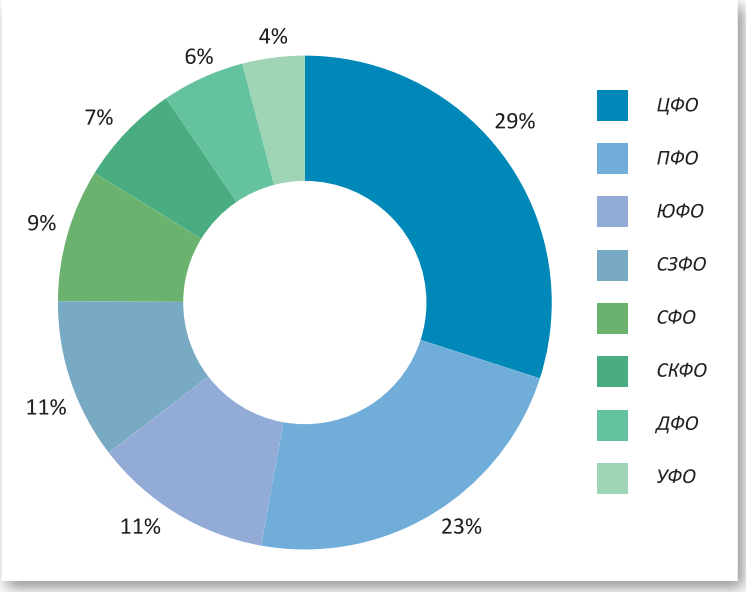


Рисунок 31. Доля обращений граждан по федеральным округам



Рисунок 32. Динамика количества обращений граждан по основным вопросам в 2010 и 2011 годах

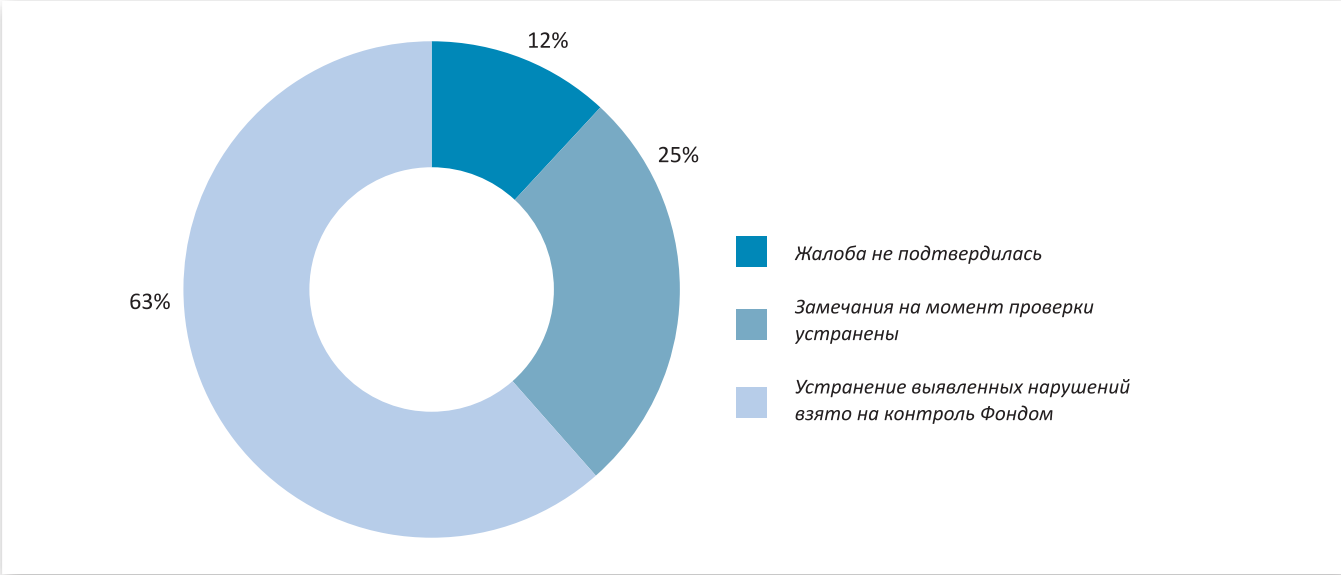


Рисунок 33. Результаты выездных проверок по жалобам граждан

Взаимодействие Фонда с экспертным сообществом и другими институтами развития

Высокая экономическая и социальная значимость состояния сферы жилищно-коммунальной хозяйства определяет широкий круг участников, заинтересованных в ее преобразовании. Фонд стремится к объединению применяемых усилий в данной сфере, используя различные формы взаимодействия с экспертным сообществом и другими институтами развития.

Начиная с сентября 2011 года, Фонд осуществляет сопредседательство в некоммерческом партнерстве содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» (далее — НП «ЖКХ-Развитие»). Данное партнерство создано для содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, решению проблем в этой области, обеспечению эффективного взаимодействия и открытого диалога власти, бизнеса, структур жилищно-коммунальной сферы, повышению уровня и качества жизни граждан, а также для совершенствования правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Учредителями организации выступили семь общественных организаций. В состав партнерства входят эксперты, юристы, аудиторы, технические специалисты, руководители управляющих организаций, организаций



Рисунок 34. Подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан, ОАО «Сбербанк России» и Фондом

коммунального комплекса и общественных организаций, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

НП «ЖКХ–Развитие» в качестве одной из приоритетных задач ставит объединение граждан и организаций, заинтересованных в развитии жилищно–коммунального хозяйства и готовых инициативно предлагать решения по вопросам развития отрасли и отношений между ее участниками. Организация стремится стать представительной, авторитетной и способной реализовывать найденные решения «площадкой» равноправного диалога участников отрасли.

С момента создания партнерства Фонд активно взаимодействует с его участниками для организации широкого и профессионального обсуждения предложений о совершенствовании законодательства, направленного на сбалансированное регулирование в отрасли, модернизацию и улучшение состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Осуществляя поиск механизмов модернизации сферы жилищно–коммунального хозяйства, в том числе финансового обеспечения этого процесса, Фондом заключено соглашение о сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Сбербанк России». В рамках данного соглашения стороны договорились определить направления, формы и порядок сотрудничества по совместной разработке, экспертной оценке программ и проектов в сфере жилищно–коммунального хозяйства, в том числе проектов, направленных на совершенствование регулирования инвестиционной деятельности в жилищно–коммунальном хозяйстве, создание эффективных механизмов финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, осуществление реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры и внедрения ресурсосберегающих технологий.

В целях развития такого взаимодействия также подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации — Республикой Башкортостан, Краснодарским краем, Мурманской областью и Ярославской областью, государственной корпорацией и ОАО «Сбербанк России».

В целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 261–ФЗ) Фондом организовано сотрудничество с некоммерческим партнерством «Национальное агентство по

энергосбережению и возобновляемым источникам энергии». Совместная деятельность организаций определяется заключенным соглашением и направлена на создание условий для повсеместного внедрения энергоэффективных технологий при капитальном ремонте многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование которых осуществляется с использованием средств Фонда; создание методологической базы; развитие механизмов частно–государственного партнерства по внедрению энергоэффективных технологий в рамках капитального ремонта многоквартирных домов; создание условий по формированию рынка энергоаудиторов с учетом масштабов работ в данной сфере, определенной законодательством.

Участие Фонда в реализации мер по внедрению энергоэффективных технологий

Вступление в силу Федерального закона от № 261–ФЗ обусловило расширение задач Фонда в области внедрения ресурсосберегающих технологий и повышения энергетической эффективности.

Ввиду отсутствия практики проведения энергетического обследования жилищного фонда в Российской Федерации, за исключением отдельных случаев, до принятия Федерального закона № 261–ФЗ и отсутствия методических указаний в этой области в целях обеспечения реализации указанной нормы Фонд с привлечением ведущих организаций в области энергетического обследования разработал Методические рекомендации по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, включенных в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных



Рисунок 35. Энергоэффективный дом в Омской области

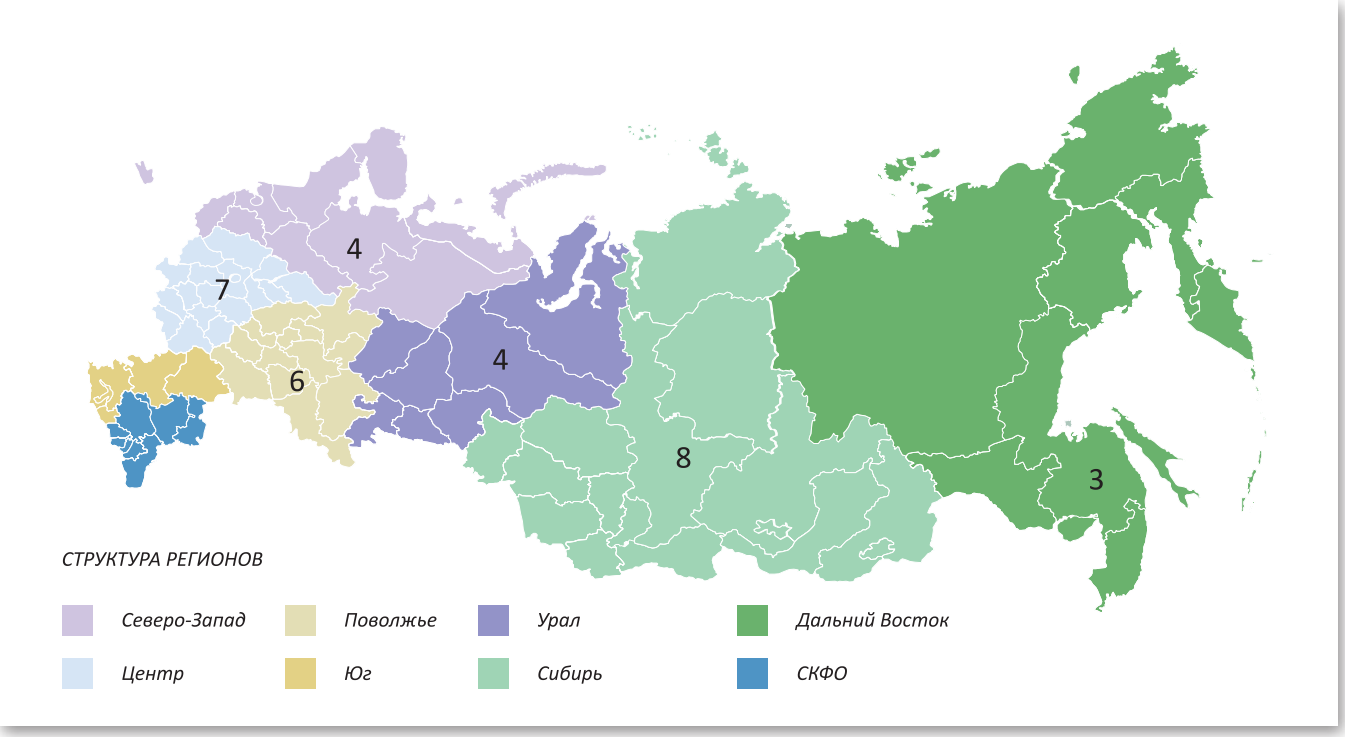


Рисунок 36. География строительства энергоэффективных домов

домов, финансируемых с участием средств Фонда (согласованы Минрегионом России).

В указанные рекомендации энергетического обследования заложены следующие принципы:

• эффективность — материальные затраты на энергетические обследования и формирование энергетического паспорта должны быть минимизированы при условии достижения конечных целей энергетического аудита–выявления потенциала энергосбережения, рекомендаций экономически обоснованных мероприятий для реализации этого потенциала, снижения расхода энергетических ресурсов и получения экономии за счет проведения мероприятий;

• потребительский подход — результаты энергетических обследований используют в первую очередь организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, поэтому документы, оформляемые по результатам энергетического аудита (отчет, энергетический паспорт), должны содержать только практически значимую информацию в форме, понятной специалистам различного профиля.

Исходя из принципа эффективности и требований федерального законодательства об обязательной установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в основу рекомендаций заложен принцип приоритета определения потенциала энергосбережения на основании показаний приборов учета и базовых показателей энергоэффективности. Это позволяет отказаться от сбора большого объема информации, необходимой для проведения детального теплотехнического расчета при определении объема теплопотребления многоквартирными домами без указанных приборов учета.

В 2011 году Фондом продолжена работа по реализации пилотных проектов строительства энергоэффективных домов экономического класса в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



Рисунок 37. Энергоэффективный дом в городе Ангарске Иркутской области



Рисунок 38. Применение солнечных батарей при строительстве дома в Гурьевском районе Кемеровской области

Успешный опыт предыдущего года послужил наглядной иллюстрацией применения самых современных технологий строительства и энергосбережения. В 2011 году такие проекты появились уже в 33 субъектах Российской Федерации, на территориях которых построены и введены в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, ведутся проектирование и строительство еще 32 объектов.

В 2010 году в эксплуатацию введены энергоэффективные дома в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской области, Калужской области и Ростовской области, в настоящее время такие дома в рамках пилотных проектов также построены в Ставропольском крае, Иркутской области, Кемеровскойобласти, Костромской области, Омской области Оренбургской области и Ярославской области, Республике Дагестан, Республике Марий Эл и Республике Саха (Якутия).

Основными отличием энергоэффективного дома является применение при его строительстве и эксплуатации специальных методов энергосбережения. Как правило, к ним относятся дополнительная тепловая изоляция всей конструкции, использование эффективных приборов освещения и генерации тепла, автоматизация регулирования



Рисунок 39. Энергоэффективный дом в городском поселении Пречистое Ярославской области

и учета используемых энергетических ресурсов, солнечные батареи и коллекторы, тепловые насосы, системы вентиляции с рекуперацией тепла. Технологические новшества, применяемые при проектировании и строительстве таких домов, позволяют при их эксплуатации в целях снижения энергопотребления использовать низкопотенциальное тепло поверхностных слоев земли, вакуумные солнечные батареи на крыше дома, работающие на отопление помещений и нагрев горячей воды. При недостатке энергии от автономных источников автоматически запускаются резервные источники — газовые котлы, установленные в индивидуальном тепловом пункте. Регуляторы температуры в помещениях, система освещения с датчиками движения, система вентиляции, предусматривающая возможность блокирования системы при отсутствии человека в помещении в целях сокращения тепловых потерь — далеко не полный перечень оборудования энергоэффективного дома, направленного на снижение энергозатрат и потребления энергии, при сохранении всех привычных комфортных условий для проживания в таком многоквартирном доме.

С учетом большей, по сравнению с обычными многоквартирными домами, себестоимости строительства 1 кв. м жилья, на стадии планирования каждого проекта осуществляется расчет срока окупаемости применения энергоэффективных технологий за счет снижения расходов на оплату коммунальных услуг.

В селе Иноземцево Ставропольского края построен трехэтажный энергоэффективный дом, состоящий из трех корпусов и имеющий 95 квартир. Дом характеризуется классом энергетической эффективности В+, применяются возобновляемые источники энергии — солнечные коллекторы, солнечные батареи, по годное регулирование. Плановый срок окупаемости дополнительных вложений составляет семь лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 15 процентов.

В двухэтажном 24–квартирном энергоэффективном доме в городе Ангарске Иркутской области будут использоваться альтернативные источники энергии — солнечные батареи и рекуператор воздуха в приточно–вытяжной системе вентиляции, автоматические тепловые регуляторы на радиаторах отопления. Предусмотрено использование энергоэффективных ламп, автоматических выключателей света, реагирующих на дневной свет и движение. В соответствии с проектом конструкция здания выполнена из трехслойных панелей с наружной облицовкой керамическим кирпичом. В отличие от обычных домов в окнах этого дома установлены современные энергосберегающие стеклопакеты. Отопление и подогрев воды происходят за счет альтернативных источников энергии: теплового насоса и солнечного вакуумного коллектора. Использование в доме энергосберегающих технологий сводит к минимуму теплопотери. Дом имеет класс энергетической эффективности А, срок окупаемости дополнительных вложений — пятнадцать лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 30 процентов.

В Гурьевском районе Кемеровскойобласти в октябре 2011 года завершено строительство трехэтажного 24–квартирного дома. В соответствии с проектом в этом доме установлены энергосберегающие стеклопакеты, солнечные батареи, поквартирные тепловые станции для отопления и подогрева воды, датчики движения, сконструирован двойной тамбур при входе в подъезды, произведены сплошное остекление лоджий и утепление ограждающих конструкций. Здание имеет класс энергетической эффективности А, срок окупаемости дополнительных вложений — двенадцать лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 36 процентов.

Инженерными решениями при строительстве трехэтажного 18–квартирного дома в городе Костроме Костромской области предусмотрены установка солнечных коллекторов, солнечных батарей, приточно–вытяжной вентиляция с рекуперацией воздуха, тепловых насосов, окон со специальным напылением и применение интеллектуальной системы отопления. Дом характеризуется классом энергетической эффективности В+, плановый срок окупаемости дополнительных вложений — восемь лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 32 процента.

В рабочем поселке Русская поляна Омской области в декабре 2011 года введен в эксплуатацию двухэтажный 22–квартирный дом. Для повышения энегоэффективности здания утеплены чердачные перекрытия, установлены энергосберегающие стеклопакеты, солнечные батареи, тепловой узел управления системой отопления, осуществляется рекуперация воздуха. Здание имеет класс энергетической эффективности В, срок окупаемости дополнительных вложений — десять лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 26 процентов.

При строительстве двухэтажного 12–квартирного дома в поселке Экодолье Оренбургской области установлены тепловой насос для нужд отопления через теплые полы, солнечный коллектор для подогрева воды, солнечные батареи для освещения мест общего пользования, датчики движения, энергосберегающие стеклопакеты и приточно–вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха. Дом характеризуется классом энергетической эффективности А, плановый срок окупаемости дополнительных вложений — десять лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 35 процентов.

В городском поселении Пречистое Первомайского района Ярославской области в декабре 2011 года построен двухэтажный 7–квартирный жилой дом. В здании установлены солнечный коллектор, датчики движения, приточно–вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха, энергосберегающие стеклопакеты, при строительстве применен пенобетон с утеплением. Дом характеризуется классом энергетической эффективности В, плановый срок окупаемости дополнительных вложений — десять лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 35 процентов.

В Республике Дагестан энергоэффективные дома построены в городахКаспийск и Избербаш. В целях сокращения теплопотерь в этих домах обустроены двойные утепленные тамбуры, двери оборудованы доводчиками, все балконы и лоджии остеклены, утеплены подвалы, в каждой квартире установлены приборы учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг. Источником теплоснабжения служат тепловые насосы. Источником горячего водоснабжения являются солнечные коллекторы, преобразующие энергию солнечного излучения в тепловую энергию, используемую для нагрева воды. Установка солнечных коллекторов на кровле здания выполнена универсальными монтажными комплектами. Дополнительные источники электроснабжения технологического оборудования—солнечные модули смонтированы на кровле здания.



Рисунок 40. Закладка фундамента для строительства энергоэффективного дома в городе Каспийске Республики Дагестан



Рисунок 41. Энергоэффективный дом в городе Волжск Республики Марий Эл

При строительстве трехэтажного энергоэффективного дома в городе Волжске Республики Марий Эл применены технологии, позволяющие использовать возобновляемые источники энергии, установлена вентиляционная система с рекуперацией воздуха. Автономное теплоснабжение квартир реализовано установкой газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Здание имеет класс энергетической эффективности В, срок окупаемости дополнительных вложений — двенадцать лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 35 процентов.

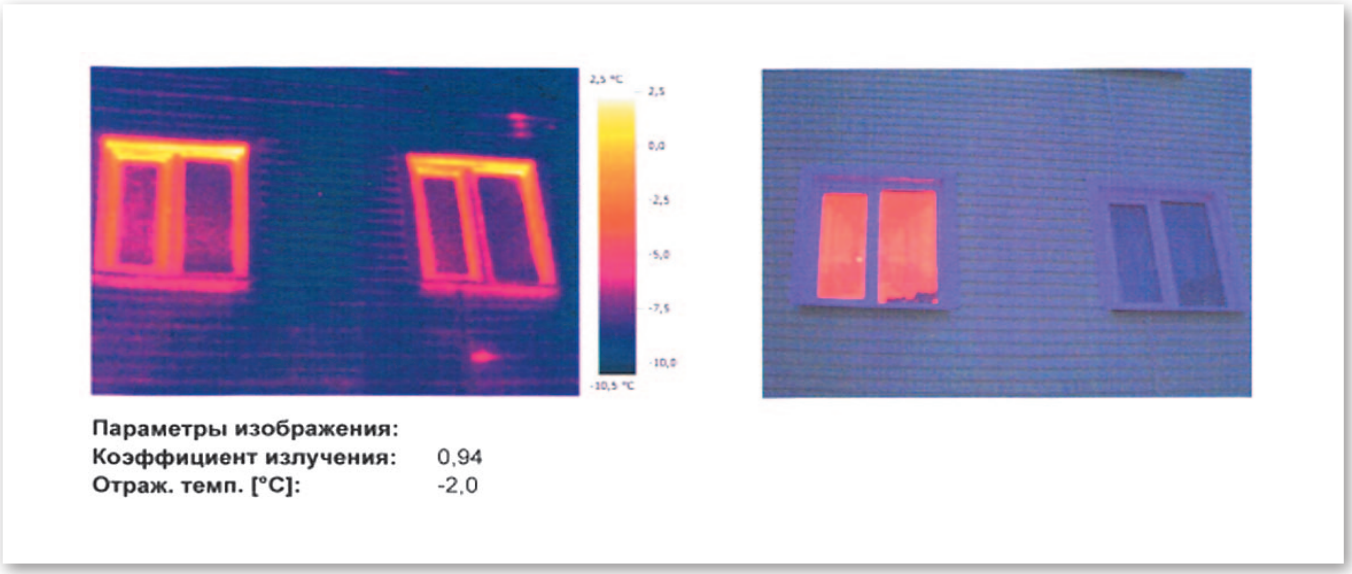


Рисунок 42. Тепловизионное обследование энергоэффективного дома в городе Кондрово Калужской области

К построенному в городе Жатай Республики Саха (Якутия) энергоэффективному дому подведена только холодная вода, ее нагрев для горячего водоснабжения происходит с помощью трех источников тепла — солнечных коллекторов в период с апреля по сентябрь, отопления в период ноябрь–март и электричества в случае нехватки солнечной энергии или недостаточной температуры отопления. В доме установлены солнечные коллекторы, электронный узел по годного регулирования и приточно–вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха. Дом характеризуется классом энергетической эффективности А, плановый срок окупаемости дополнительных вложений — двенадцать лет, ожидаемое снижение стоимости коммунальных платежей — 46,2 процента.

Необходимо отметить, что реализация пилотных проектов призвана продемонстрировать пример использования современных технологий строительства и оборудования многоквартирных домов для их последующего тиражирования и применения не только в рамках программ Фонда, но и в коммерческом жилищном строительстве. Так, в городе Уфе Республики Башкортостан в микрорайоне, на территории которого с использованием средств Фонда был построен энергоэффективный дом, планируется осуществить проект «Энергоэффективный квартал Инорс». На территории данного микрорайона в 2012 году планируется строительство второго энергоэффективного дома, но с уже большими параметрами: подготовлен проект на строительство девятиэтажного дома, где будут использованы все энергоэффективные технологии, существующие на се годняшний день. В случае успеха администрация города далее планирует построить на территории микрорайона энергоэффективный квартал.

Наряду со строительством энергоэффективных зданий Фондом большое значение придается вопросу правильного подхода к эксплуатации построенных многоквартирных домов. Для решения этой задачи Фондом оказана консультационная помощь субъектам Российской Федерации по вопросам эффективной эксплуатации оборудования, примененного в энергоэффективных домах, а также эффективного управления этими домами в целом.

Для получения объективных данных о качестве проведенных работ при строительстве энергоэффективных домов и выявления потенциала для дальнейшего улучшения его характеристик Фондом организованы проведение энергетического обследования и тепловизионная съемка многоквартирного дома в городе Кондрово Калужской области, результаты которого свидетельствуют о соответствии дома высокому классу энергетической эффективности В, соответствии температуры внутреннего воздуха в местах общего пользования требованиям ГОСТ 30494–96, которая составляет 18°С. В ходе обследования были выявлены незначительные недостатки, о которых Фонд сообщил в субъект Российской Федерации. Аналогичные работы были проведены в энергоэффективном доме, расположенном в городском поселении Пречистое Первомайского муниципального района Ярославской области.

Учитывая эффективность реализуемых мероприятий, Фонд продолжит стимулирование внедрения технологических новшеств в процесс строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также осуществление консультационной поддержки проектов строительства энергоэффективных домов.

Реализация Фондом стратегии информационной открытости

В целях повышения информированности и правовой грамотности граждан как собственников жилых помещений в многоквартирных домах, обеспечения доступности информации о лучших достижениях практики управления жилищным фондом, примерах осуществления общественного контроля в сфере жилищно–коммунального хозяйства, разработки и применения современных технологий в строительстве и инженерном оснащении многоквартирных домов Фондом продолжена реализация комплексной информационной программы, первые мероприятия которой состоялись в 2010 году.

В задачи указанной программы входят содействие объективному освещению средствами массовой информации хода реформирования жилищно–коммунальной сферы (с акцентом на популяризации позитивных результатов реформы), расширение использования созданных информационных материалов (брошюры, анимационные фильмы, документальные программы и фильмы, игровой сериал) для пропаганды рыночных механизмов в сфере жилищно–коммунального хозяйства, проведение информационной работы с гражданами по разъяснению их прав и обязанностей, в том числе с привлечением общественных организаций, социальных интернет–сетей, технологий коммуникационного диалога с региональными средствами массовой информации.



Рисунок 43. Заставка информационного ролика о реализации реформы ЖКХ, размещенного на сайте Фонда и демонстрируемого на федеральных и региональных телеканалах



Рисунок 44. Кадр из программы «Вести. Технологии жилья. Эфир 3 декабря 2011 года

Для выполнения вышеперечисленных задач в рамках информационной программы были реализованы следующие мероприятия. В печатных и электронных средствах массовой информации обеспечен выход более 162 информационных материалов, в том числе в федеральных общественно–политических печатных средствах массовой информации (24 публикации), на сайтах российских электронных средств массовой информации общественно–политической направленности (24 публикации), на лентах ведущих российских информационных агентств (114 новостей, при этом часть из них процитирована менее крупными агентствами и региональными агентствами, интернет–средствами массовой информации и агрегаторами новостей в «Интернете»).

На федеральных и региональных телеканалах обеспечен 241 выход информационных материалов, в том числе инициированы создание и выход:

- 24 премьерных и 48 повторных выпусков на российском информационном канале «Россия–24» с общим временем выхода более 1000 минут;
- 16 еженедельных телепрограмм в формате «Специальный репортаж» на канале телекомпании НТВ;
- 107 новостных сюжетов в эфирах региональных телеканалов в более чем 40 регионах;
- 46 новостных сюжетов на федеральных каналах.

В сети «Интернет» осуществлена комплексная модернизация сайта Фонда, проведена кампания по размещению баннеров–ссылок сайтов Фонда (203 млн. показов), в ходе которой количество уникальных посетителей сайта возросло с 6 до 60 тысяч.



Рисунок 45. Диаграмма распределения звонков на «горячую линию» Фонда по тематике

Для обеспечения субъектов Российской Федерации информационными материалами созданы три анимационных видеоролика о деятельности Фонда и 5–серийный анимационный сериал «Школа ТСЖ», размещенные на сайте государственной корпорации и, кроме того, предоставленные регионам на CD–носителях, напечатаны и направлены в субъекты Российской Федерации брошюры с рекомендациями собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по четырем наиболее актуальным направлениям в отрасли жилищно–коммунального хозяйства общим тиражом 500 тыс. экземпляров.

Проведен II Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение реформы жилищно–коммунального хозяйства. В данном конкурсе приняли участие представители средств массовой информации из более чем 40 субъектов Российской Федерации, приславшие более 370 работ. Лауреатами конкурса признаны представители 12 федеральных и региональных средств массовой информации, как отдельные журналисты, так и авторские коллективы. Церемония награждения победителей состоялась 27 мая 2011 года в городе Липецке в рамках Всероссийского совещания «Эффективное управление жилищно–коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан». Информационное сопровождение церемонии организовано в эфире канала телекомпании «НТВ» и на новостном интернет–портале «INFOX».

В 2011 году продолжила работу «горячая линия» Фонда. За двенадцать месяцев на телефон «горячей линии» и по каналам обратной связи поступило 35 339 обращений граждан.

Наибольшее число вопросов на «горячую линию» поступало по следующим темам:

- участие в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- работа управляющих организаций и товариществ собственников жилья;
- реализация региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- разъяснение положений Федерального закона № 185–ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых документов;
- реализация в региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и участие в данной программе;
- рассмотрение запросов, отправленных в письменной форме гражданами в Фонд.

Вышеперечисленные мероприятия реализованы с использованием финансовых средств, выделенных на ведение информационной деятельности Фонда.

Кроме того, без привлечения денежных средств реализованы следующие мероприятия:

- проведено 7 пресс–конференций представителей Фонда по актуальным вопросам функционирования сферы жилищно–коммунального хозяйства (по итогам каждого мероприятия в печатных и электронных средствах массовой информации выходило до 200 информационных материалов);
- инициировано 18 материалов о ходе реформы жилищно–коммунального хозяйства:
  – «Ведомости», 2011, 5 апреля, статья: «Вернуть потраченное»;

– «РБК daily», 2011, 25 апреля, № 72 (1116), статья: «Коммунальные деньги более не инвестиционные»;
– «Вестник», 2011, № 4, интервью: «В ЮФО требованиям ФЗ № 185 в полной мере отвечает только лишь Ростовская область»;
– «Сельская жизнь», 2011, 24 мая,№ 34, интервью: «А «пароходы» утонули в полях...»;
– «Российская газета», 2011, 26 мая,№ 5487, интервью: «Если у вас нету крыши»;
– «Строительная орбита», 2011, № 5, интервью: «Пароходы утонули в полях»;
– «Квартирный ряд», 2011, № 20, статья: «Умные проекты на разных уровнях»;
– РИА «Новости», 2011, июнь, интервью: «Замглавы Фонда ЖКХ: ни один регион не находится в безвыходной ситуации»;
– «Национальные проекты», 2011, № 6 (61), статья: «Качественное управление жилищным фондом повышает уровень жизни россиян»;
– «Региональная Россия», 2011, № 7, интервью: «От содействия — к действиям»;
– «КоммерсантЪ», 2011, 5 сентября, № 164/П, статья: ««Фронт» поставили на хозяйство»;
– «Национальные проекты», 2011, № 10(64), статья: «Необходимо открытое обсуждение системных проблем ЖКХ»;
– «ЖКХ России. Энергоэффективность. Информационно–аналитический каталог», 2011, декабрь;
– «Московские новости», 2011, 24 октября, интервью: «Собственность гражданам передали, а что с ней делать, не объяснили»;
– «РБК daily», 2011, 21 декабря, интервью: «Пусть се годня мы не платим 100%, но когда–то заплатить придется»;
– «Энергоэффективность и энергосбережение», 2011, № 11, статья: «Миссия выполнима?»;
– «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера», 2011, № 12, интервью: «Эффективный механизм стимулирования реформы ЖКХ»;
– «Российский строитель», 2011, № 6, интервью: «Как отладить рыночный механизм ЖКХ».



Рисунок 46. Пресс-конференция в информационном агентстве «ГАРАНТ» на тему: «Организация общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве как залог создания комфортных условий проживания граждан»



Рисунок 48. Кадр из сюжета о проверке в городе Оренбурге ТВЦ «Планета». Эфир от 2 декабря 2011 года

В рамках информационного сотрудничества с федеральными и региональными телевизионными каналами во втором полу годии 2011 года были инициированы 33 сюжета и программы, в том числе на канале «Россия–24» (одно интервью, два новостных сюжета, семь программ), «Россия»

(две программы), Первом канале (11 программ), ТВ–Центр (пять программ), НТВ (три программы), ТВК города Липецка (одна программа), Петербург–5 канал (одна программа).

Часть материалов была процитирована и послужила основой для новостей и сюжетов на региональных телевизионных каналах, в электронных средствах массовой информации.

В качестве экспертов программ выступали представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Минрегиона России, Торгово–промышленной палаты Российской Федерации, Фонда, общественных и коммерческих организаций жилищно–коммунальной сферы.

В рамках проведенных Фондом всероссийских совещаний «Эффективное управление жилищно–коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан» (Липецк, 26–27 мая) и «Обеспечение благоприятных условий проживания граждан за счет внедрения систем эффективного управления жилищно–коммунальным хозяйством» (Санкт–Петербург, 19–21 октября) на сайте Фонда в режиме реального времени осуществлена видеотрансляция мероприятий совещания, проведена презентация Фонда, сформированная из трех секций: «Энергоэффективный дом», «Популяризация реформы жилищно–коммунального хозяйства», «Информационный портал «www.ReformaGKH.ru», в рамках информационной поддержки инициировано размещение более 60 информационных материалов о деятельности Фонда на федеральных и региональных телевизионных, в печатных средствах массовой информации, а также на интернет–ресурсах.

При проведении Всероссийского образовательного форума «Селигер–2011» 17–25 июля 2011 года Фондом оказано содействие в подготовке и проведении тематической смены федерального молодежного проекта «ВСЕ ДОМА», посвященной участию молодежи в процессе реформирования сферы жилищно–коммунального хозяйства, организовано чтение трех тематических лекций специалистами Фонда, проведена презентация по вышеупомянутым секциям.



Рисунок 49. Приветственное слово Д. Н. Козака на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового многоквартирного дома, построенного по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Липецкой области

Совместно с Межрегиональной общественной организацией содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства «ВСЕ ДОМА» разработана и с сентября 2011 года реализуется программа «Молодежный общественный контроль» в шести субъектах Российской Федерации: Республике Чувашия, Белгородской области, Орловской области, Саратовской области, Тульской области и городе федерального значения Санкт–Петербурге. В октябре 2011 года к ним присоединилась Республика Карелия, в декабре — Тверская область. В тестовом режиме к программе «Молодежный общественный контроль» подключилась Ивановская область. О работе активистов вышло 42 телевизионных сюжетов, 56 печатных и 106 интернет–материалов. Активисты движения в соответствии с указанной программой провели адресные проверки выполнения капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья в 208 многоквартирных домах, провели 35 акций, выявили 125 проблем, из которых добились решения 88.



Рисунок 50. Реализация проекта «Молодежный общественный контроль» в Ивановской области

Инициировано создание 5–серийного документального фильма «Человечество. Выживание в XXI веке». Фильм размещен на сайте Фонда, предоставляется на CD–дисках. В октябре–ноябре 2011 года данный фильм несколько раз демонстрировался в эфире телеканала «Моя планета».

Во втором полу годии 2011 года организована работа с издательским домом «Вече», в результате которой в регионах распространено более 2 000 экземпляров «Толкового словаря ЖКХ».

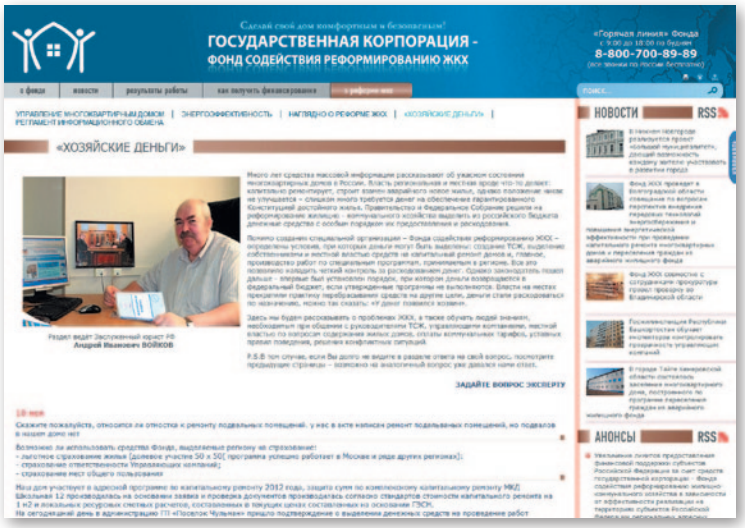


Рисунок 51. Рубрика «Хозяйские деньги» на официальном сайте Фонда. Раздел ведет Заслуженный юрист Российской Федерации А. И. Войков

Фондом обеспечивалось информационное сопровождение выездных проверок в субъектах Российской Федерации, по освещению проведения которых с учетом их результатов в федеральных и региональных печатных и электронных средствах массовой информации (включая теле– и радиоканалы, информационные агентства и интернет–издания) выпущено 330 информационных материалов.

В 2011 году государственной корпорацией проведена работа, направленная на сохранение информационной наполненности и привлекательности сайта (адрес сайта — www.fondgkh.ru).

Для повышения качества информированности граждан была создана рубрика «Хозяйские деньги», где подготовлено и опубликовано более 100 ответов на обращения граждан. В рамках данной странички обсуждаются актуальные проблемы в отрасли, предоставляется информация, необходимая гражданам при разрешении вопросов с руководителями товариществ собственников жилья, управляющими организациями, органами местного самоуправления по вопросам содержания многоквартирных домов, оплаты коммунальных услуг и решения конфликтных ситуаций.

На сайте проводилось информационное сопровождение всех знаковых в жилищно–коммунальной сфере событий, а также размещалась информация о реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Данная информация в оперативном режиме сопровождалась методическими материалами,



Рисунок 52. Результаты исследования, проведенного ВЦИОМ

формами документов, разъяснением правил их заполнения, что послужило обеспечением подготовки заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также последующей отчетности уполномоченным органам в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Периодичность обновления информации в разделах сайта и на новостной ленте составила от 6 до 14 раз в день.

По данным рейтинга Rambler's Top 100, еженедельно к сайту Фонда обращалось от 4 500 до 7 500 пользователей. Активное сотрудничество с регионами привело к смене географии посетителей сайта Фонда. Если в 2010 году на пользователей из городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга приходилось 38 процентов, на остальные регионы — 56 процентов, на зарубежные страны — 6 процентов, то в 2011 году на города федерального значения Москву и Санкт-Петербург пришлось 24,5 процента, на остальные регионы 70,5 процента, на зарубежные страны — 5 процентов. В течение года среди сайтов, посвященных тематике жилищно-коммунального хозяйства, по ежедневной посещаемости сайт Фонда занимал места с 14-го по 22-е.

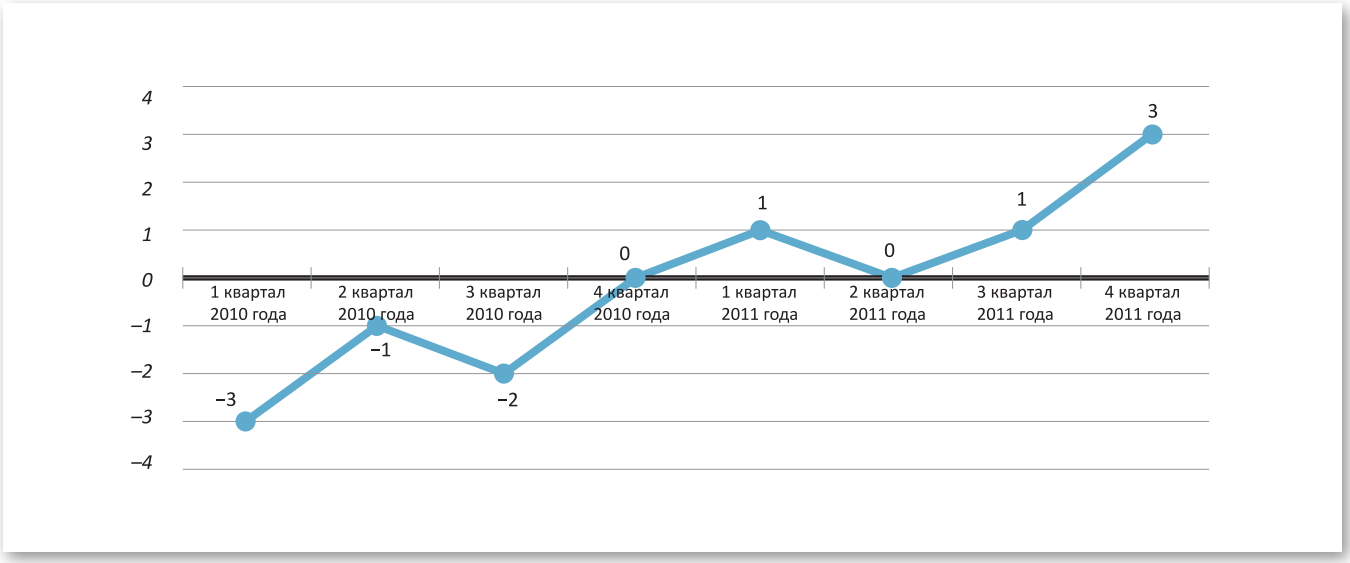


Рисунок 53. Поквартальный график направленности информационного поля в 2010 и 2011 годы

В апреле–мае 2011 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее — ВЦИОМ) проведено всероссийское исследование осведомленности населения о реформе жилищно–коммунального хозяйства. Исследование показало увеличение осведомленных россиян о реформе до 66 процентов.

Наиболее информированные об этой реформе респонденты проживают в Центральном федеральном округе (80 процентов), Дальневосточном федеральном округе (75 процентов) и Северо–Западном федеральном округе (75 процентов). Меньше всего знают о ней жители Южного федерального округа (56 процентов), Северо–Кавказского федерального округа (56 процентов) и Уральского федерального округа (47 процентов).

До 74 процентов возросло количество россиян, желающих больше знать о реформе жилищно–коммунального хозяйства. Практически каждый четвертый респондент хотел бы больше знать о контроле за деятельностью управляющих организаций. В этом направлении исследование показало, что осведомленность россиян об управляющих организациях не претерпела изменений и осталась на уровне 53–56 процентов. Каждый второй россиянин не знает ни наименования, ни организационно–правовой формы своей управляющей организации.

Основными проявлениями участия россиян в реформе жилищно–коммунального хозяйства стали установка приборов учета воды (26 процентов), энергосберегающих ламп и приборов (23 процента), благоустройство придомовой территории (21 процент).

В целом исследование показало высокий уровень запроса россиян в отношении информации о различных аспектах реформы жилищно–коммунальной отрасли (74 процента).

Суммируя результат проведенных мероприятий, необходимо отметить, что в 2011 году комплексная и системная работа с ведущими федеральными телеканалами позволила обеспечить информирование населения о наиболее успешных проектах в сфере жилищно–коммунального хозяйства с акцентом на региональный опыт и внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Усиление работы с субъектами Российской Федерации привело к улучшению обработки общественных запросов, в том числе к созданию региональных горячих линий, общественных приемных, отдельных рубрик и программ в печатных и электронных средствах массовой информации.

Использование в качестве основного вектора информационной наполненности тематики внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий усилило интерес граждан к этим направлениям реформирования жилищно–коммунальной отрасли. Сопровождающее реформу жилищно–коммунального хозяйства информационное поле предоставило возможность сменить нейтрально–негативную направленность в 2010 году на нейтрально–позитивную направленность в 2011 году.

Управление имуществом Фонда

Имущество Фонда сформировано за счет первоначального имущественного взноса Российской Федерации в Фонд в размере 240 000,0 млн. рублей, дополнительных имущественных взносов Российской Федерации в Фонд, осуществленных в течение 2010 и 2011 годов в общем объеме 62 000,0 млн. рублей, доходов Фонда от размещения временно свободных средств за 2008–2011 годы в сумме 27 793,95 млн. рублей и целевых взносов в размере 24,4 млн. рублей.

Управление имуществом Фонда осуществляется исходя из объема обязательств Фонда по предоставлению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, исполнения норм законодательства, принятых относительно распоряжения имуществом Фонда, а также осуществления расходов на обеспечение деятельности Фонда, в том числе на исполнение обязательств по уплате налогов и сборов.

По состоянию на 1 января 2012 года имущество Фонда распределено следующим образом:

- 280,71 млрд. рублей направлено в виде финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в 2008–2011 годах[4];
- 44,76 млрд. рублей — временно свободные средства Фонда;
- 4,33 млрд. рублей использовано на обеспечение деятельности Фонда (в том числе 2,53 млрд. рублей — на уплату налога на прибыль, 1,80 млрд. рублей — на обеспечение административно–хозяйственных расходов Фонда в 2008–2011 годах).

Инвестирование временно свободных средств Фонда в 2011 году осуществлялось в соответствии

4 Объем расходов на предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации определен исходя из фактических (кассовых) перечислений средств финансовой поддержки в субъекты Российской Федерации с учетом возврата средств, не использованных субъектами Российской Федерации при реализации региональных адресных программ.

с Федеральным законом № 185–ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2008 года № 76 «О размещении временно свободных средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 32 н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2008 года № 76 «О размещении временно свободных средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» (далее — приказ Минфина России № 32 н).

Направления, порядок и условия инвестирования временно свободных средств Фонда, а также предельный размер инвестируемых временно свободных средств Фонда на каждый календарный год определялись Правительством Российской Федерации, в том числе на 2011 год указанные параметры были определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1047 «О размещении в 2011 году временно свободных средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

Указанным постановлением Фонду было предоставлено право размещать в 2011 году временно свободные средства в сумме остатков средств на банковских счетах Фонда за вычетом средств, необходимых для оказания финансовой поддержки согласно решениям правления Фонда, в ценные бумаги, соответствующие критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации, а также в депозиты и депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

Требования к активам, в которые разрешалось размещать временно свободные средства Фонда, установлены приказом Минфина № 32 н.

Управление временно свободными средствами Фонда, направленное на обеспечение сохранности неизрасходованных денежных ресурсов и их приумножение за счет получения дополнительных доходов, осуществляется в целях снижения влияния инфляционных процессов на имеющиеся финансовые ресурсы Фонда и исполнения в полном объеме обязательств по предоставлению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации. Исходя из основных целей деятельности Фонда, инвестиционная стратегия сформирована на основе принципов минимизации рисков, обеспечения соответствия денежных потоков, связанных с инвестированием временно свободных средств, обязательствам Фонда по целевому финансированию региональных адресных программ и обеспечения доходности.

По состоянию на 1 января 2012 года **размер временно свободных средств Фонда** составил 44 761,79 млн. рублей.

Доход Фонда от инвестирования временно свободных средств по состоянию на 1 января 2012 года составил 27 793,95 млн. рублей (по данным управленческого учета, без учета налогообложения), в том числе 3 906,41 млн. рублей от

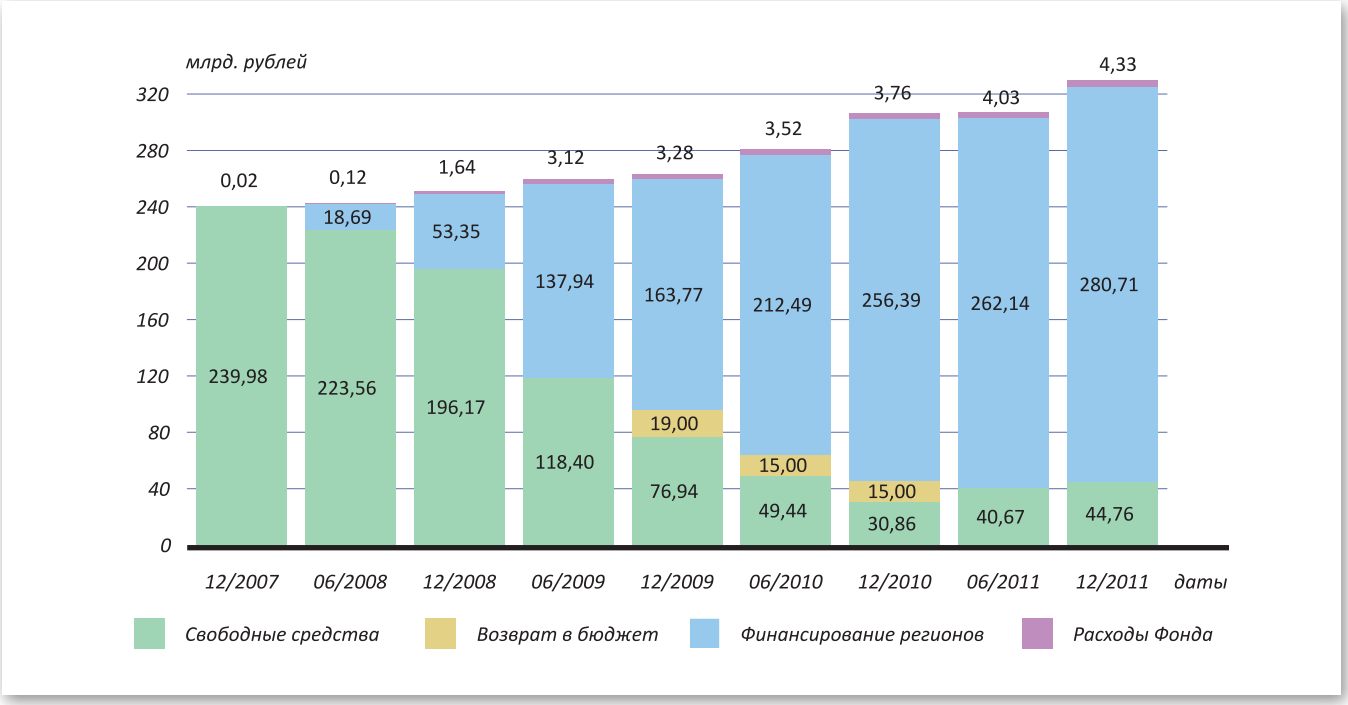


Рисунок 54. Динамика основных показателей, определяющих объем временно свободных средств Фонда (нарастающим итогом, млрд. рублей)

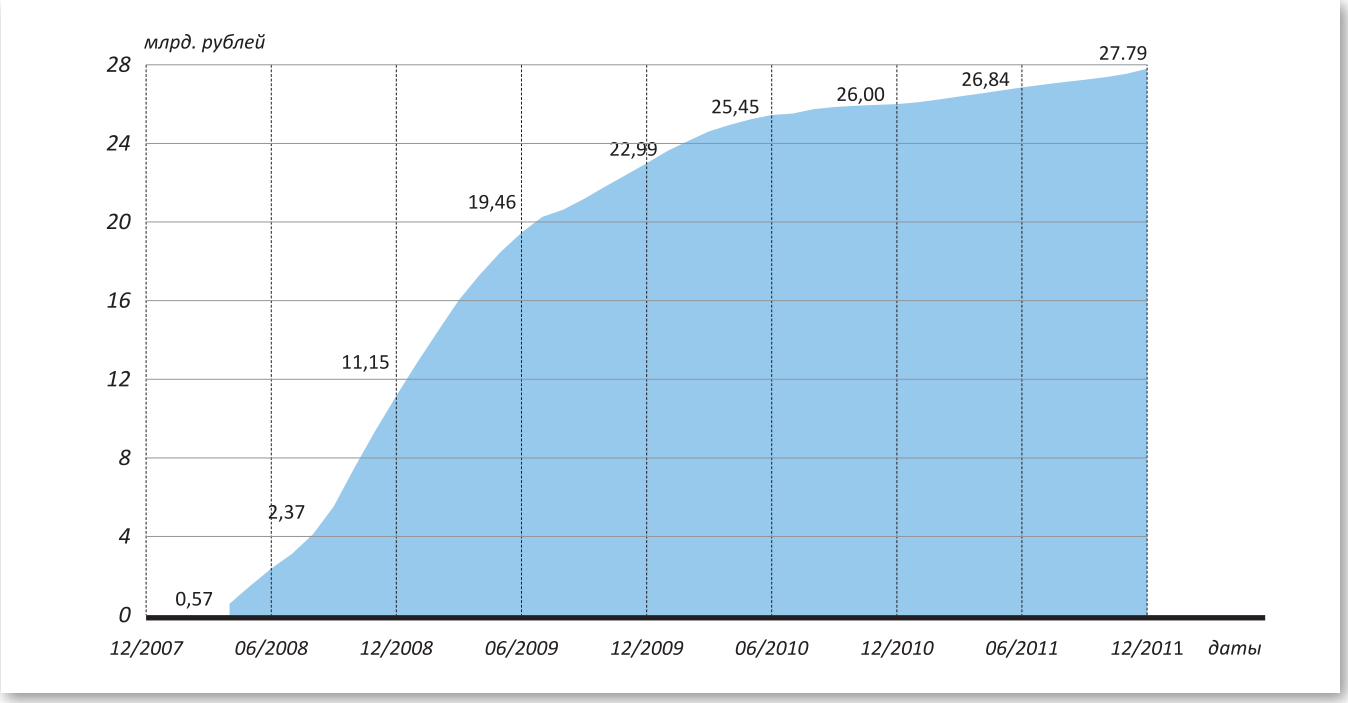


Рисунок 55. Доход от инвестирования временно свободных средств Фонда (нарастающим итогом, млрд. рублей)

размещения в 2008 году депозитов в Центральном банке Российской Федерации, 17 183,18 млн. рублей от размещения депозитов в российских кредитных организациях, 6 700,13 млн. рублей от вложений в облигации российских эмитентов (с учетом дисконтов стоимости облигаций при покупке к их номинальной стоимости) и 4,23 млн. рублей прочих доходов.

Доход Фонда от инвестирования временно свободных средств за 2011 год составил 1 792,59 млн. рублей, в том числе 1 783,14 млн. рублей от размещения депозитов в российских кредитных организациях и 9,45 млн. рублей от вложений в облигации российских эмитентов (с учетом дисконтов стоимости облигаций при покупке к их номинальной стоимости).

По состоянию на 1 января 2012 года средневзвешенная доходность инвестирования средств в депозиты российских кредитных организаций составила 7,30 процента годовых.

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2008 года № 69–ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 21 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» Фонд утратил право размещать временно свободные средства в депозиты Банка России с 1 января 2009 года. Фонд прекратил эти операции 2 декабря 2008 года.

За весь период своей деятельности Фонд провел 138 биржевых аукционов по размещению средств **в депозиты российских кредитных организаций.** В 2011 году Фондом было проведено 44 биржевых аукциона, на которых инвестировано 162,17 млрд. рублей на срок от 27 дней до 181 дня, а также до востребования.

По состоянию на 1 января 2012 года сумма требований Фонда к российским кредитным организациям составила 44 046,27 млн. рублей, в том числе 43 974,23 млн. рублей по размещенным депозитам, 72,04 млн. рублей по начисленным, но не выплаченным процентам. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам составила 7,30 процента годовых.

Доходы Фонда от инвестирования средств в депозиты российских кредитных организаций по состоянию на 1 января 2012 года составили 17 183,19 млн. рублей, в том числе за 2011 год — 1 783,14 млн. рублей.

В российских кредитных организациях Фонд размещал депозиты до востребования, срочные депозиты на срок от 27 дней до полу года.

Фонд проводил операции по инвестированию временно свободных средств в облигации российских эмитентов по договорам доверительного управления с привлечением управляющих компаний и банков, выбранных в 2008 году по результатам открытого конкурса.

Временно свободные средства находились в доверительном управлении у девяти управляющих, в том числе семи управляющих компаний и двух банков: «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах–Инвестиции», ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», ЗАО «УК УралСиб»,

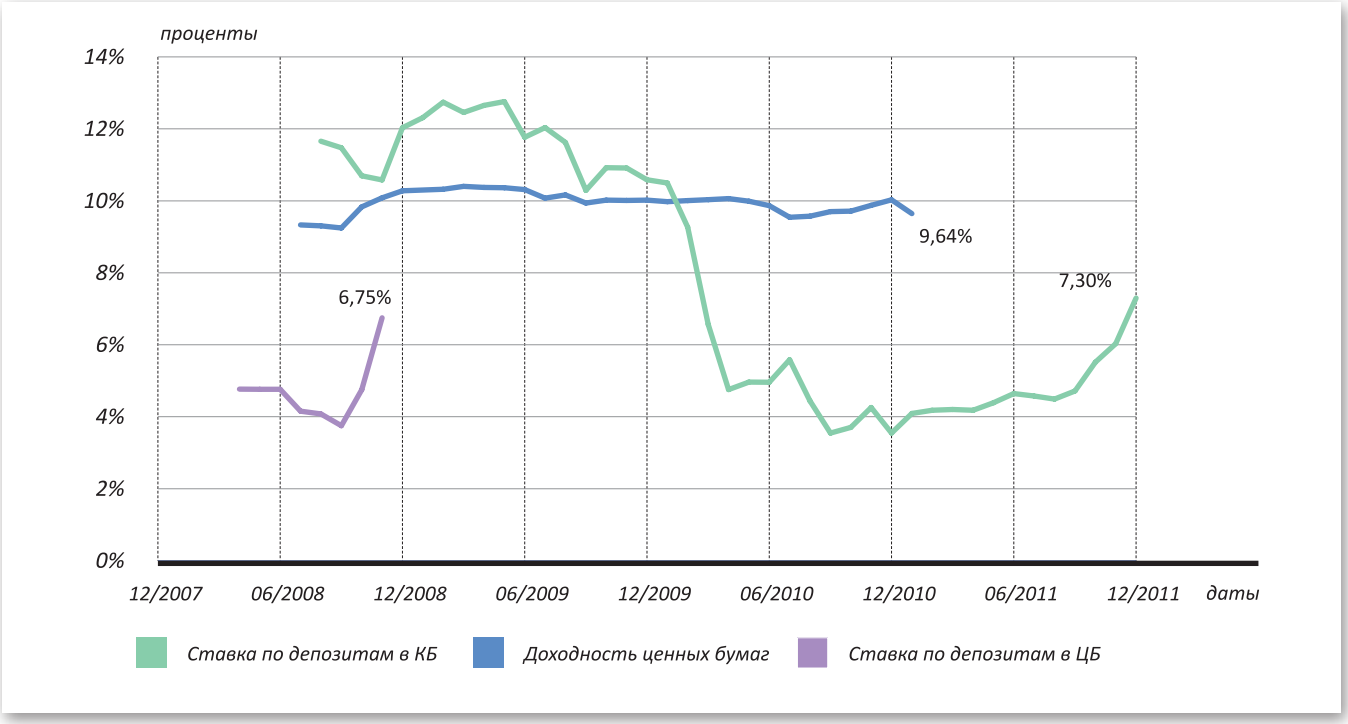


Рисунок 56. Доходность активов в инвестиционном портфеле Фонда (процентов годовых)

ООО «Управляющая компания «Альфа–Капитал», ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», ООО «УК «Атон–менеджмент».

Средства Фонда были инвестированы в ценные бумаги, номинированные в российских рублях, в том числе в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги и облигации других российских эмитентов, соответствующих критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

В апреле 2011 года Фонд завершил программу инвестирования временно свободных средств в ценные бумаги.

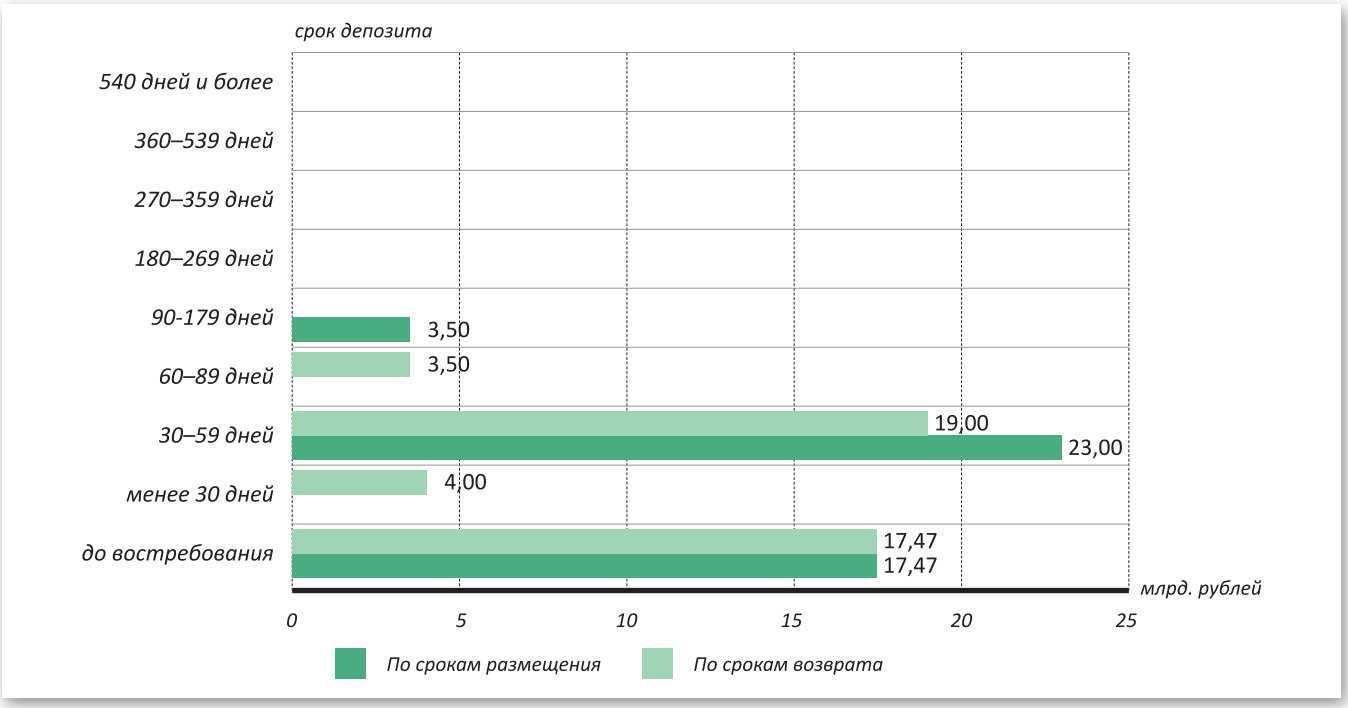


Рисунок 57. Структура депозитов по срокам инвестирования и возврата по состоянию на 1 января 2012 года (млрд. рублей)

По состоянию на 1 января 2012 года доход от доверительного управления средствами Фонда, по данным управленческого учета, составил 6 700,13 млн. рублей, в том числе за 2011 год 9,45 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года временно свободные средства Фонда состояли из активов, инвестированных в депозиты российских кредитных организаций в размере 43 974,23 млн. рублей, денежных средств на расчетных счетах Фонда в размере 715,52 млн. рублей, а также прочих активов в размере 72,04 млн. рублей.

За 2011 год доля депозитов в российских кредитных организациях в общем объеме временно свободных средств увеличилась с 83,8 процента до 98,2 процента, доля ценных бумаг снизилась с 4,2 процента до нуля, доля денежных средств снизилась с 10,6 процента до 1,6 процента, доля прочих активов снизилась с 1,4 процента до 0,2 процента.

В составе прочих активов учтены суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам в коммерческих банках.

Финансовая и аналитическая информация о результатах инвестирования временно свободных средств Фонда ежемесячно опубликовывается на официальном сайте Фонда.

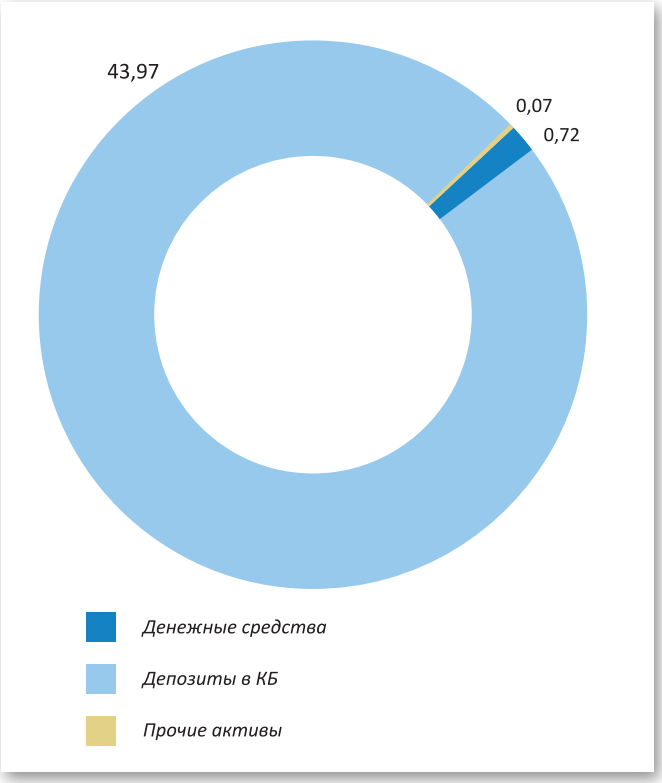


Рисунок 58. Структура временно свободных средств (млрд. рублей)

Административно-хозяйственная деятельность Фонда

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 185–ФЗ объем средств, направляемых на обеспечение административно–хозяйственной деятельности Фонда, еже годно устанавливается наблюдательным советом Фонда.

Объем административно–хозяйственных расходов Фонда на 2011 год первоначально по решению наблюдательного совета Фонда от 4 февраля 2011 года (протокол № 24) был утвержден в сумме 603,4 млн. рублей на уровне планового объема расходов 2010 года.

Решением наблюдательного совета Фонда от 3 ноября 2011 года (протокол № 28) в связи с принятием решения о продолжении проведения системной информационной кампании по вопросам реформирования жилищно–коммунального хозяйства общий объем административно–хозяйственных расходов Фонда был увеличен до 623,9 млн. рублей.

По итогам 2011 года фактический общий объем административно–хозяйственных расходов Фонда составил 572,0 млн. рублей (экономия около восьми процентов). Исполнение по расходам осуществлено с экономией по всем статьям сметы.

Оплата труда работников Фонда осуществлялась по системе, введенной в 2009 году во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся мер по оптимизации оплаты труда в государственных корпорациях, в соответствии с Положением об оплате труда работников Фонда.

Согласно положениям заработная плата складывается из двух частей — постоянной (должностного оклада) и переменной (стимулирующие и компенсационные выплаты).

Должностной оклад является фиксированной частью заработной платы и устанавливается на основе штатного расписания за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц. Должностные оклады в Фонде установлены в 2008 году и с тех пор не изменялись.

Стимулирующие выплаты (премии) осуществляются по результатам труда и предназначены для мотивации достижения текущих и долговременных целей работы Фонда, выполнения поставленных задач и повышения эффективности труда.Выплата стимулирующей части заработной платы работникам Фонда осуществлялась в 2011 году по итогам работы за 2010 год с учетом достигнутого уровня ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, рассмотренного наблюдательным советом Фонда 27 апреля 2011 года (протокол № 25).

Выплата стимулирующей части заработной платы членам правления Фонда за указанный период осуществлялась в соответствии с решениями Комитета по вознаграждениям членов правления Фонда от 23 июня 2011 года (протокол № 4) и наблюдательного совета Фонда от 7 июня 2011 года (протокол № 26).

На основании анализа динамики достигнутого уровня ключевых показателей эффективности деятельности Фонда и ключевых показателей эффективности деятельности структурных подразделений Фонда в соответствии с Положением об оплате труда работников Фонда произведена выплата авансовой части премии по итогам работы за первое полу годие 2011 года.

Оказание услуг и закупка материальных ценностей осуществлялись на конкурсной основе в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Фондом, утвержденно правлением Фонда 21 января 2008 года (протокол № 5). Вышеназванное Положение разрабатывалось на основании протокола заседания наблюдательного совета Фонда от 22 ноября 2007 года № 1 с учетом положений и норм Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Положение о закупках товаров (работ, услуг) Фонда регламентирует процедуру выбора Фондом поставщика (подрядчика) для закупки товаров (работ, услуг) в целях обеспечения максимальной экономичности и эффективности закупки, открытости процедуры выбора поставщика (подрядчика), содействия объективности и беспристрастности принятия решений о выборе поставщика (подрядчика). Данное Положение применяется к закупке любых товаров (работ, услуг), осуществляемой Фондом для обеспечения его деятельности, в том числе к закупке юридических услуг, консультационных услуг, аудиторских услуг, услуг по обучению, коммунальных услуг и т.д. По рекомендации Счетной палаты Российской Федерации в 2011 году действие Положения, ранее применяемое только при закупке у юридических лиц, распространено также на закупку товаров (работ, услуг) у физических лиц.

Положение о закупках товаров (работ, услуг) Фонда предусматривает осуществление закупок следующими способами:

- открытый конкурс (стоимость закупки от 500 000 (пятисот тысяч) рублей и более);
- двухэтапный конкурс (предварительный отбор);
- запрос предложений;
- запрос котировок (стоимость закупки от 100 000 (ста тысяч) до 500 000 (пятисот тысяч) рублей);
- простая закупка (стоимость закупки не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей);
- закупка у единственного поставщика (подрядчика).

Решение о способе закупки принимается Комиссией Фонда по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с вышеназванным Положением. В отчетном году Фондом для закупки товаров (работ, услуг) проведены 12 открытых конкурса, 16 запросов котировок, 11 запросов предложений, 10 закупок у единственного источника, иные закупки осуществлялись по протоколам простой закупки.

Информация об исполнении сметы административно–хозяйственных расходов Фонда представлена в приложении.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательным советом Фонда 20 декабря 2011 года, протокол заседания № 29, утверждено новое Положение о закупках товаров, работ, услуг, которое регулирует деятельность Фонда при осуществлении закупки продукции и регламентирует закупочную деятельность Фонда, определяет требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. Данное Положение вступило в силу с 1 января 2012 года.









ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА

реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ и выполнения ими условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году

Отчет о результатах мониторинга реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ

В 2011 году проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялись в 81 субъекте Российской Федерации, за исключением города федерального значения Москвы и Чеченской Республики.

Стоимость мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом дополнительных источников финансирования в соответствии с региональными адресными программами составила 60 606,2 млн. рублей.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда, предоставленная в 2011 году, направлена на капитальный ремонт 7 287 многоквартирных домов, в которых проживают 898,7 тыс. человек, а также на переселение 86,6 тыс.человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 1 297,3 тыс. кв. м.

Во исполнение требований части 2 статьи 22 Федерального закона № 185–ФЗ высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 81 субъекта Российской Федерации, которым предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда на реализацию региональных адресных программ, представлены отчеты о ходе их реализации.

В соответствии с указанными отчетами в 2011 году субъектами Российской Федерации осуществлялась реализация региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые финансовая поддержка была предоставлена в 2008–2011 годах, в том числе с использованием сэкономленных средств на новые мероприятия по ранее утвержденным программам.

В 2011 году в рамках реализации региональных адресных программ подрядными организациями выполнены работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 27,7 млрд. рублей; стоимость приобретенных жилых помещений, которые расположенны во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах, а также выкупленных у собственников жилых помещений в аварийных домах, составляет 19,9 млрд. рублей.

На 1 января 2012 года доля средств, направленных подрядным организациям и застройщикам, составила 90,6 процента от запланированного уровня, в том числе 98,3 процента по региональным адресным программам по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 74,2 процента по региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

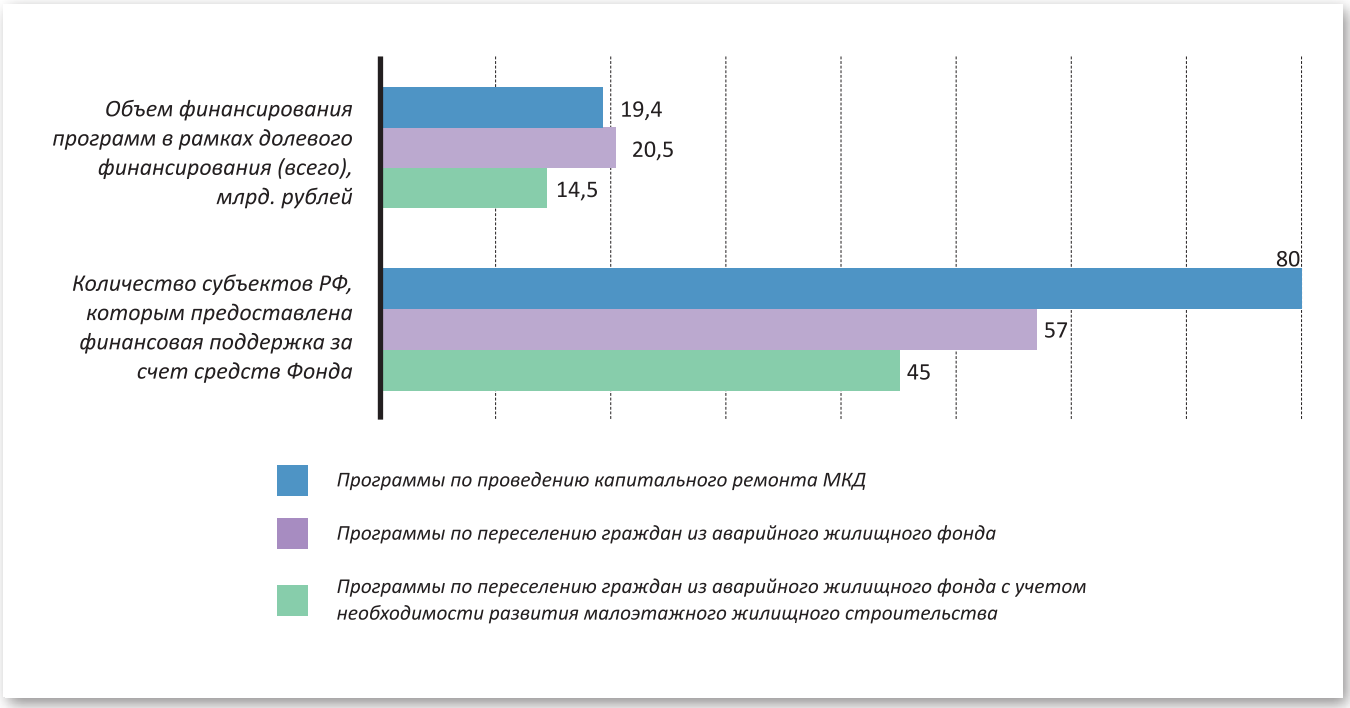


Рисунок 59. Объем финансирования региональных адресных программ в 2011 году и количество субъектов Российской Федерации, которым предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда

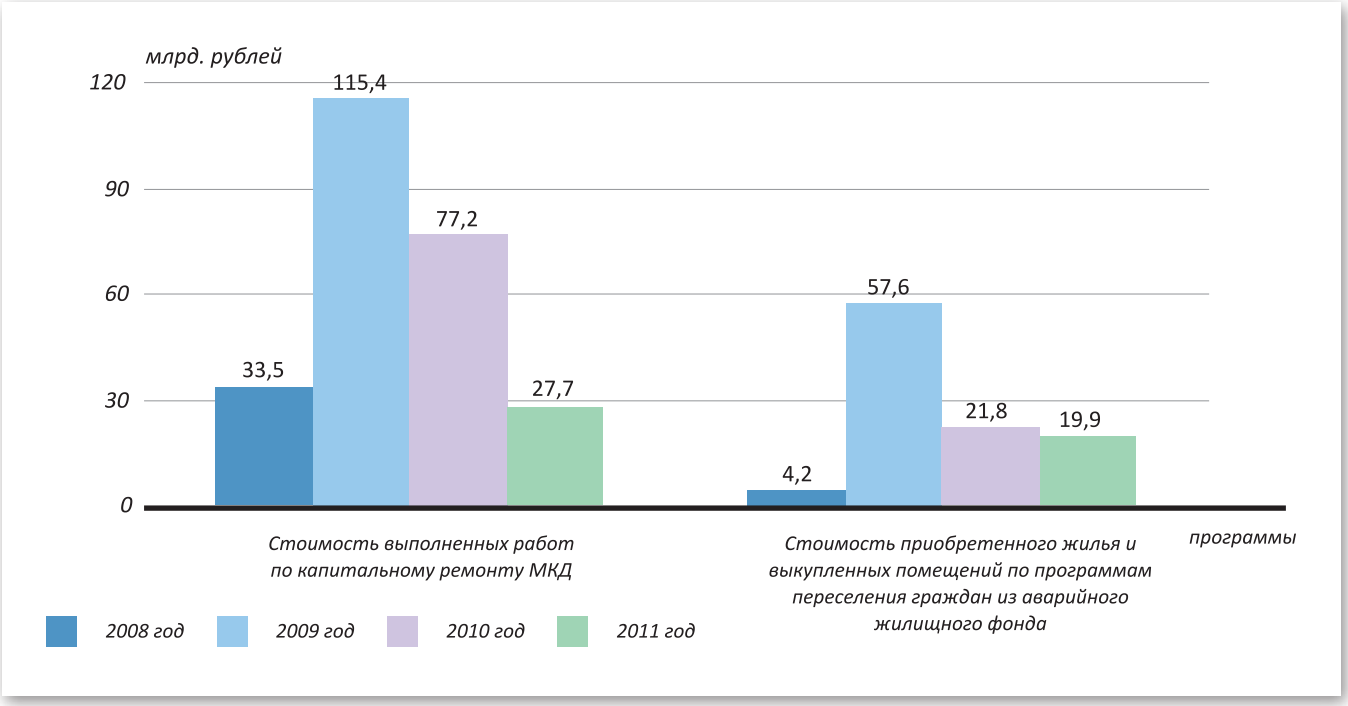


Рисунок 60. Стоимость мероприятий по региональным адресным программам, реализованным в 2008–2011 годах (млрд. рублей)

Оценка результатов реализации региональных адресных программ на 1 января 2012 года проводилась в соответствии с Порядком определения завершения реализации региональных адресных программ субъектами Российской Федерации, утвержденным правлением Фонда от 30 января 2012 года (протокол № 309).

По результатам данной оценки реализация субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансовая поддержка на которые предоставлена в 2008–2010

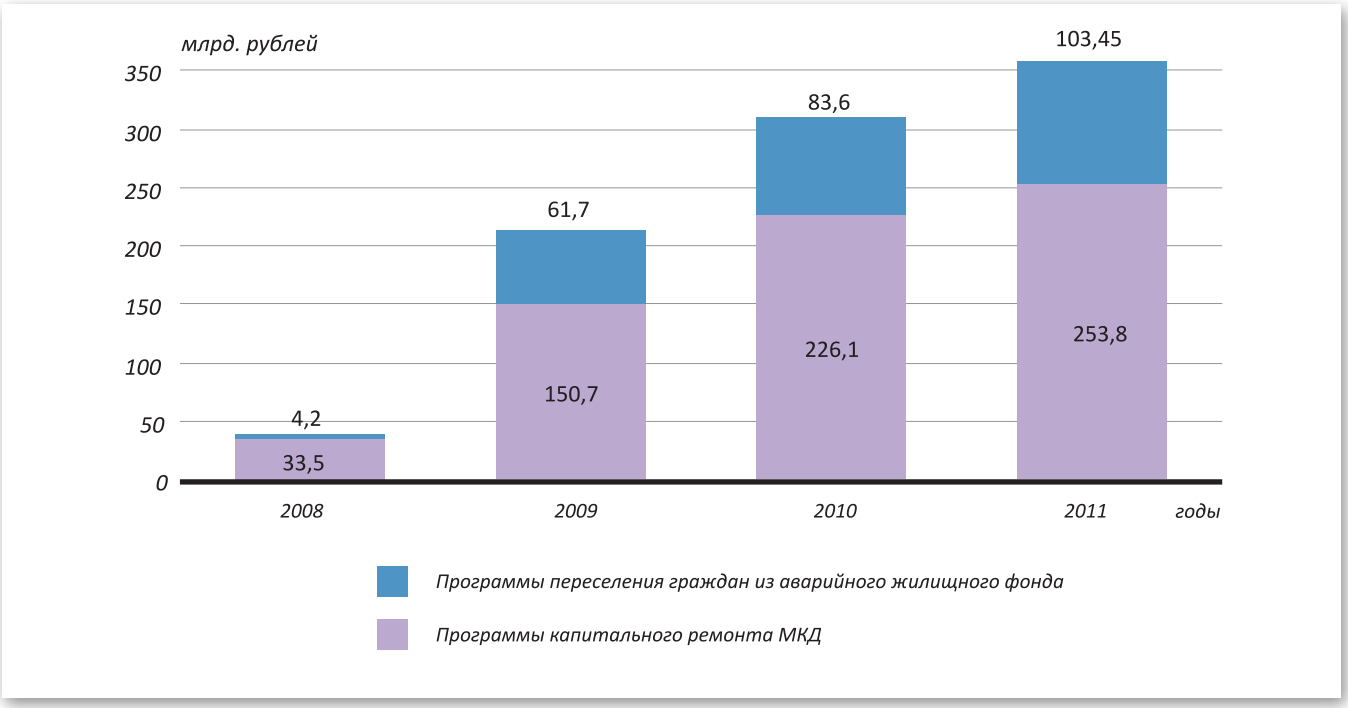


Рисунок 61. Динамика выполнения региональных адресных программ в 2008–2011 годах (накопительным итогом), млрд. рублей

годах, завершена в 59 субъектах Российской Федерации. Программы 2011 года, срок реализации которых в соответствии с Федеральным законом установлен до 1 января 2013 года, завершены в Республике Башкортостан, Омской области и Ярославской области.

По основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185–ФЗ (нецелевое использование), принято решение о приостановке предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по результатам рассмотрения отчетов Курганской области и Мурманской области. В связи с нарушением сроков реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (пункт 2 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185–ФЗ) приостановлено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда Республике Карелия, Вологодской области, Костромской области, Московской области, городу федерального значения Санкт–Петербургу, Тульской области и Тюменской области, а также в связи с невыполнением показателей и (или) нарушением сроков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (пункт 2 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185–ФЗ) — Республике Карелия, Республике Коми, Республике Хакасия, Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, Архангельской области, Вологодской области, Калужской области, Курганской области, Ленинградской области, Московской области, Мурманской области, Ростовской области, Сахалинской области, Тверской области, Тульской области, Тюменской области.

Информация об объеме финансирования региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации представлена в приложении.

Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

В 2011 году финансовая поддержка за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставлена 80 субъектам Российской Федерации. Заявки на финансирование региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов не поступили от Чеченской Республики, города федерального значенияМосквы и Магаданской области.

Объем финансирования региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств собственников помещений в многоквартирных домах составил 19 421,5 млн. рублей.

Данные средства направлены на ремонт 7 287 многоквартирных домов общей площадью 23,4 млн. кв. м, в которых проживают 898,7 тыс. человек.

Наибольшее количество заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов приходится на II–III кварталы 2011 года.

В 2011 году в 9 490 многоквартирных домов общей площадью 29,4 млн. кв. м, в которых проживают 1,5 млн. человек, завершен капитальный ремонт по заявкам, финансовая поддержка на реализацию

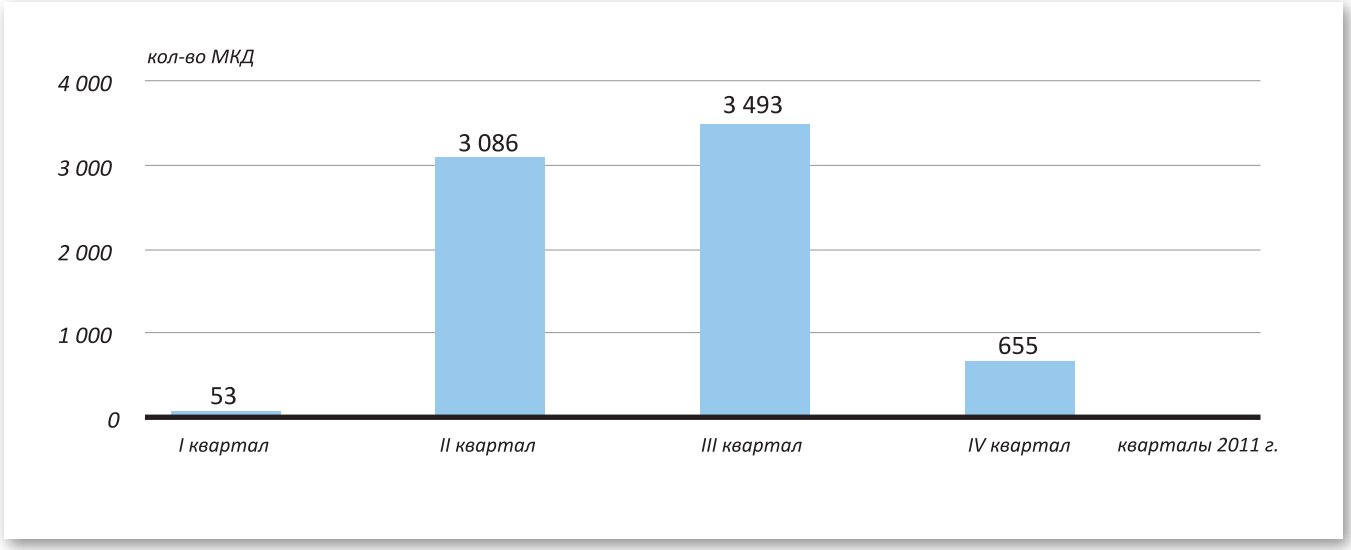


Рисунок 62. Динамика заявок по количеству многоквартирных домов в соответствие с региональными адресными программами с учетом внесенных изменений

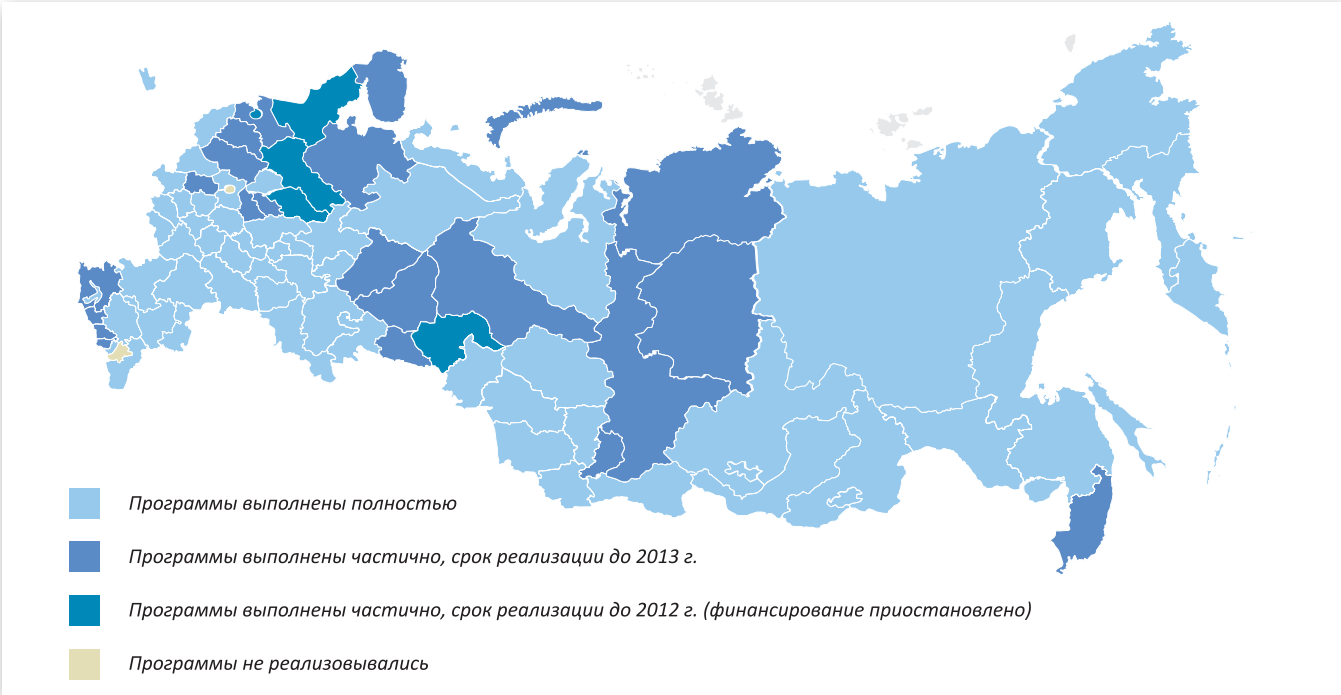


Рисунок 63. Степень выполнения региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации исходя из первоначально запланированных сроков их реализации (без учета последующего продления сроков реализации программ)

которых предоставлена в 2008–2011 годах. В моно–профильных муниципальных образованиях работы по проведению капитального ремонта завершены в 1 096 многоквартирных домах.

Региональные адресные программы по про–ведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансовая поддержка на реализацию ко–торых предоставлена в 2008 и 2009 годах, выпол–нены в полном объеме во всех субъектах Россий–ской Федерации.

Работы по региональным адресным программам 2010 и 2011 годов, которые должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с требованием Фе–дерального закона № 185–ФЗ до 1 января 2012 года,

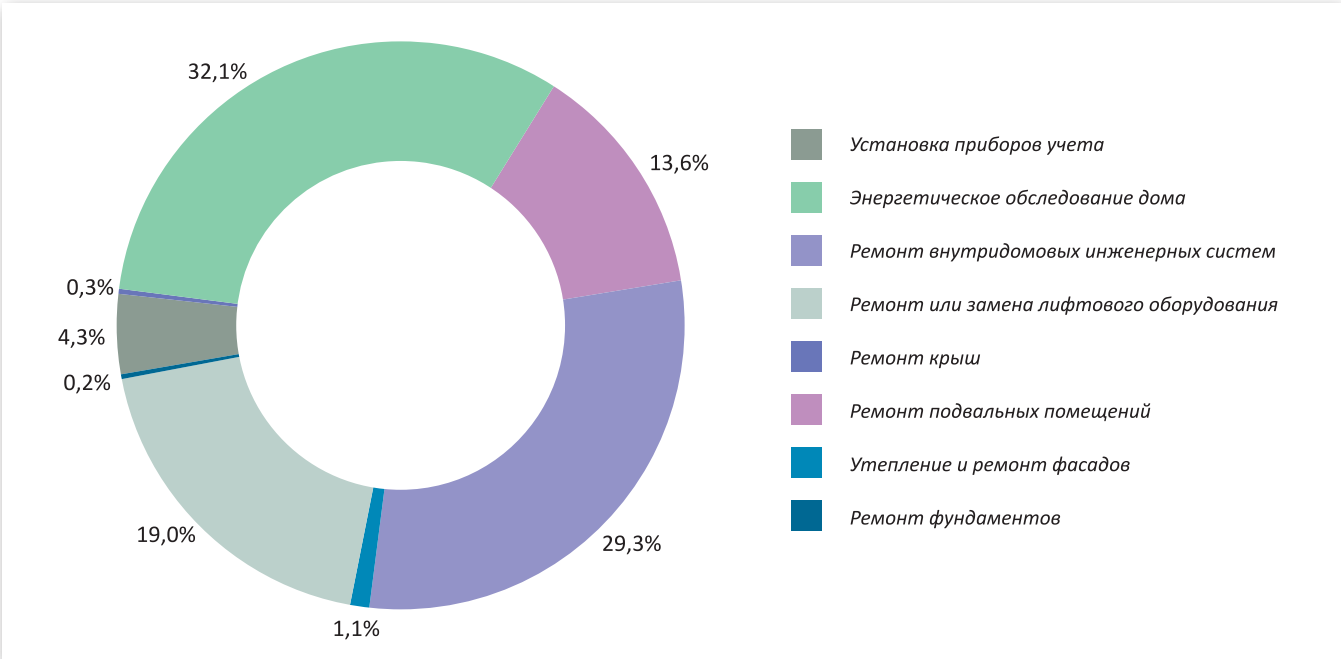


Рисунок 64. Структура региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (по объему финансирования в процентах)

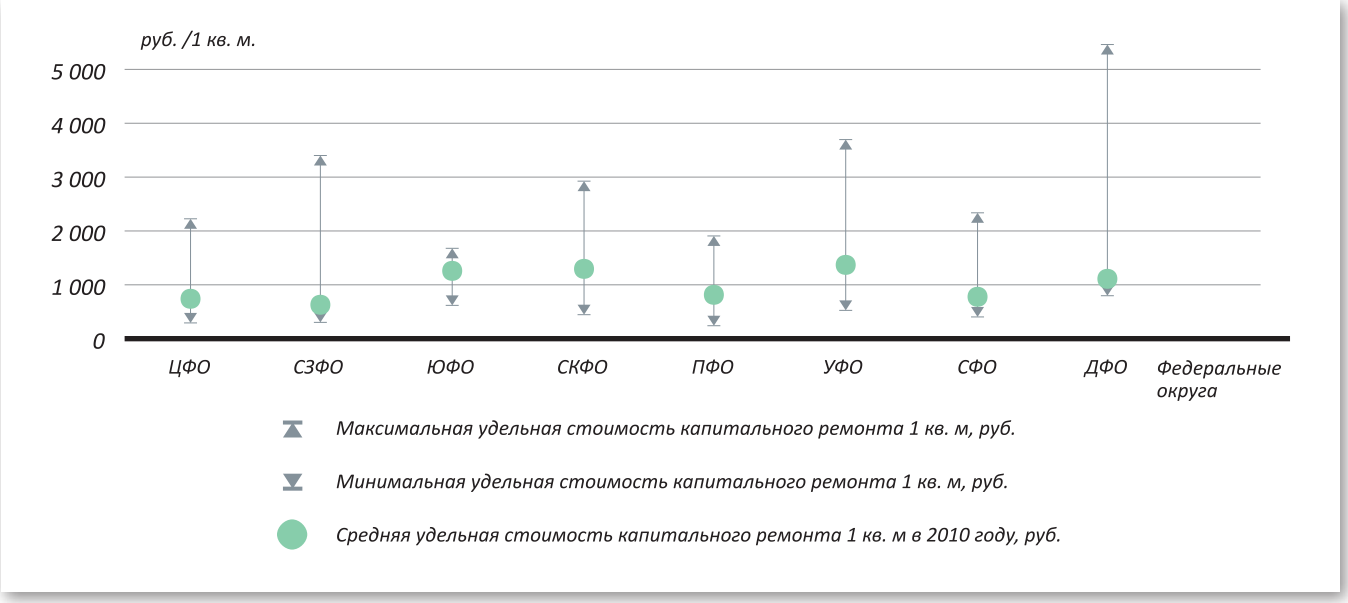


Рисунок 65. Средняя стоимость ремонта 1 кв. м помещений в многоквартирных домах в 2011 году

не завершены в трех субъектах Российской Федерации — Московской области (44,5 процента), Республике Карелия (69,5 процента) и Тульской области (99,4 процента).

Региональные адресные программы 2011 года со сроком реализации до 1 января 2013 года завершены в 2011 году в 30 из 52 субъектов Российской Федерации.

В структуре расходов в рамках реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансовая поддержка на реализацию которых предоставлена в 2011 году, наибольшую долю занимают работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (32,1 процента) и ремонту крыш (29,3 процента).

По сравнению с реализацией программ в 2010 году соотношение объема финансирования работ по капитального ремонту многоквартирных домов изменилось незначительно: сократилась доля финансирования мероприятий по ремонту внутридомовых инженерных систем и соответственно увеличилась доля расходов на ремонт лифтового оборудования, финансировались новые виды работ — ремонт фундаментов и энергетическое обследование многоквартирных домов.

Реализация региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 2011 года в разрезе видов работ следующая:

- установлено 8 679 приборов учета вотребление ресурсов в 3 729 многоквартирных домах на сумму 6 73,6 млн. рублей;
- произведен ремонт внутридомовых инженерных систем на сумму 5 556,2 млн. рублей;
- отремонтирована кровля площадью 5 017 тыс. кв. м на сумму 4 994,5 млн. рублей;
- произведены утепление и ремонт фасадов площадью 4 536 тыс. кв. м на сумму 3 279,5 млн. рублей;
- осуществлены ремонт или замена 1 382 лифтов на сумму 1 819,2 млн. рублей;
- отремонтированы подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, площадью 334 тыс. кв. м на сумму 188,4 млн. рублей;
- осуществлен ремонт фундаментов многоквартирных домов объемом 1 311 куб. м на сумму 46,5 млн. рублей;
- произведено энергетическое обследование многоквартирных домов на сумму 54,2 млн. рублей.

Средняя удельная стоимость проведения помещений в многоквартирных домах в 2011 году составила 862 рубля. По сравнению с 2010 годом указанная стоимость в 2011 году уменьшилась на 8 рублей. Наибольшая удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м установлена в Чукотском автономном округе (5 409 рублей), Ненецком автономном округе (3 315 рублей), Калужской области (3 298 рублей), Республике Ингушетия (2 842 рубля), Курганской области (2 804 рубля), Приморском крае (2 715 рублей).

Доля расходов на финансирование мероприятий по комплексному ремонту многоквартирных домов в 2011 году составляет 16 процентов от общего объема финансирования региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Основные параметры реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации представлены в приложении.

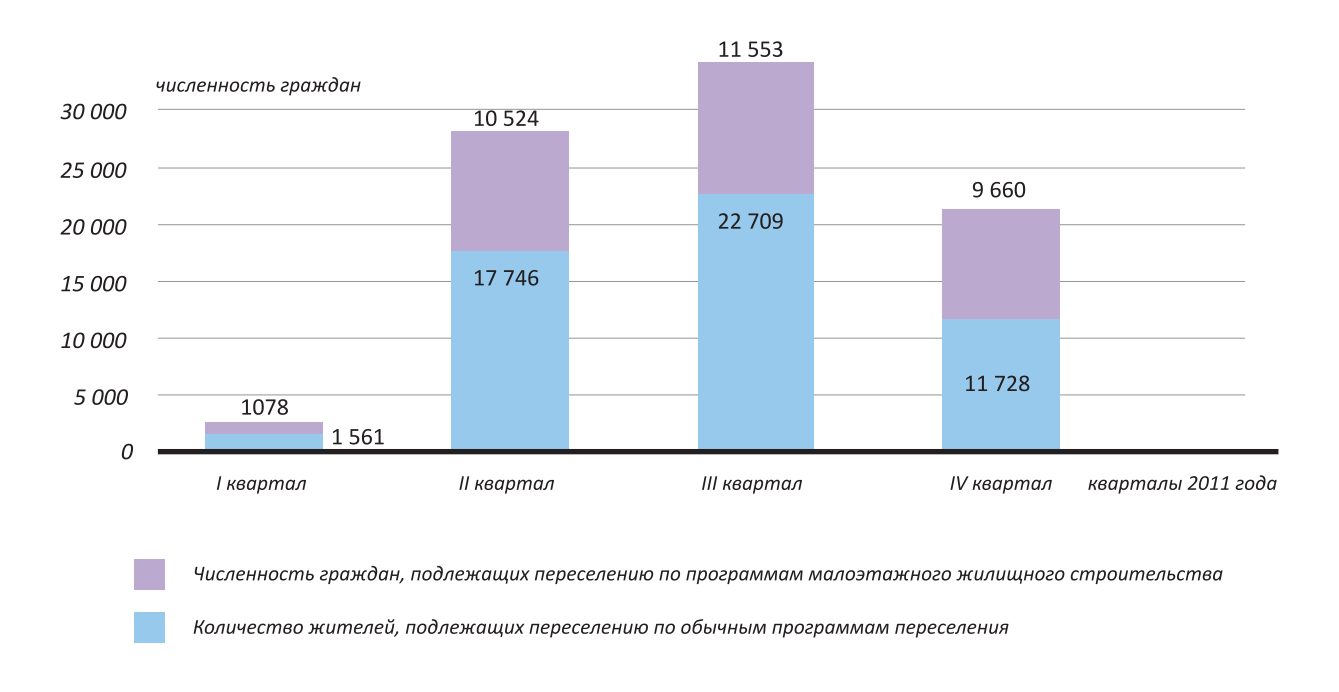


Рисунок 66. Динамика заявок по численности переселяемых граждан в соответствии с региональными адресными программами с учетом внесенных изменений

Региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В 2011 году Фондом одобрены заявки 78 субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; Чеченская Республика, Магаданская область, город федерального значения Москва, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ заявки не представляли.

Объем финансирования региональных адресных программ по переселению граждан из ава–



Рисунок 67. Степень выполнения региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации исходя из первоначально запланированных сроков их реализации (без учета последующего продления сроков реализации программ)

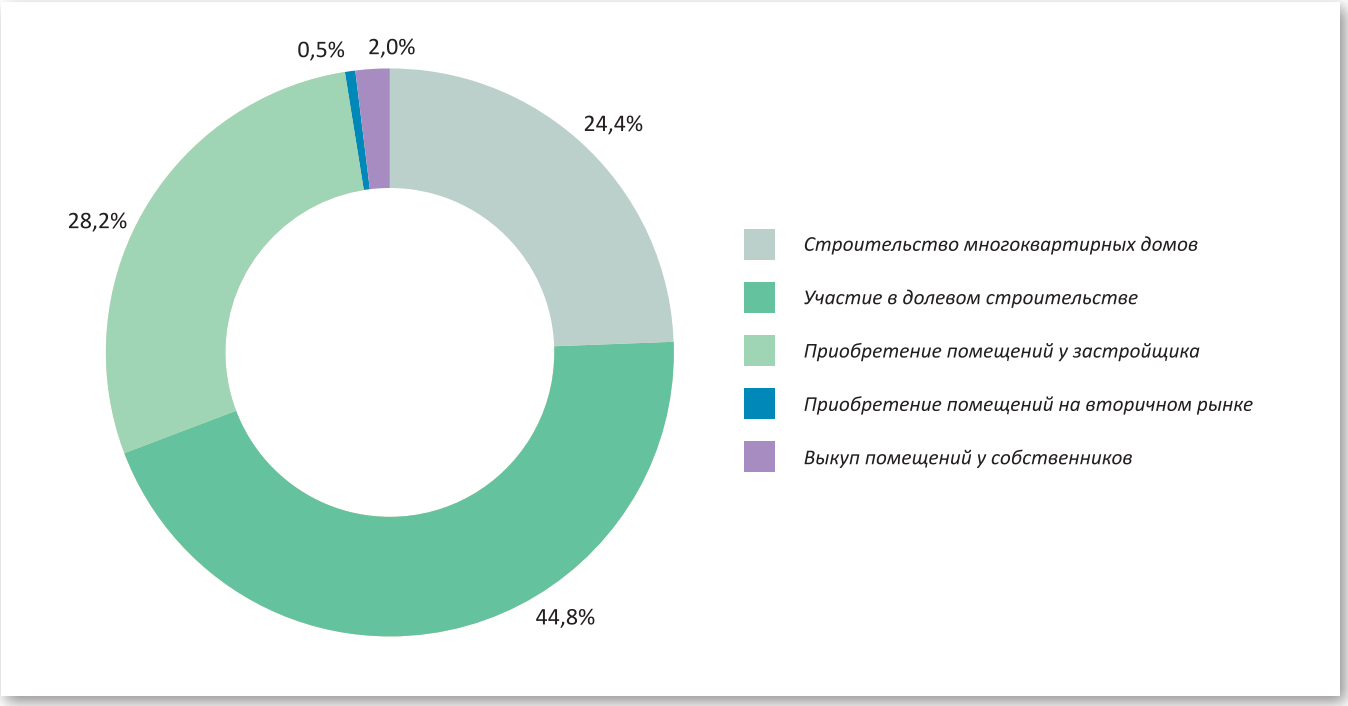


Рисунок 68. Структура реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2011 года (по объему финансирования, в процентах)

рийного жилищного фонда всего составил 41 181 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда с учетом долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — 34 973,5 млн. рублей, за счет дополнительных источников — 6 207,5 млн. рублей. Данные средства направлены на переселение 86,6 тыс. человек из 5 000 аварийных домов, площадь помещений в которых составляет 1 297,3 тыс. кв. м.

Наибольшее количество заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приходится на II и III кварталы 2011 года.

В 2011 году завершено переселение граждан из 22,3 тыс. жилых помещений, общая площадь которых составляет 908,3 тыс. кв. м в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансовая поддержка на реализацию которых предоставлена в 2008–2011 годах. Фактически переселено 63,0 тыс.человек, полностью переселены граждане из 3 927 аварийных жилых дома. В рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в монопрофильных муниципальных образованиях переселено 1 126 человек.

Региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансовая поддержка на реализацию которых предоставлена в 2008–2010 годах, выполнены в полном объеме в 60 субъектах Российской Федерации. Указанные программы 2011 года, срок реализации которых в соответствии с Федеральным законом № 185–ФЗ установлен до 1 января 2013 года, завершены в Республике Башкортостан, Омской области и Ярославской области.

В 13 субъектах Российской Федерации нарушен срок переселения граждан из аварийного жилищного фонда, установленный в соответствии с Федеральным законом № 185–ФЗ (до 1 января 2012 года), в связи с чем приостановлено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

По указанным программам не переселено 7 267 человек (за исключением жителей, которые не переселены по причине судебных споров), в том числе из аварийного жилищного фонда, расположенного в Ставропольском крае (1 733 человека), Тульской области (1 043 человека), Ростовской области (1 023 человека), Тюменской области (963 человека), Архангельской области (543 человека), Ленинградской области (422 человека), Курганской области (407 человек), Республике Карелия (359 человек), Вологодской области (351 человек), Мурманской области (196 человек), Республике Коми (135 человек), Сахалинской области (54 человека) и Калужской области (38 человек).

Нарушение субъектами Российской Федерации сроков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда обусловлено следующими причинами:

- низкое качество планирования мероприятий программ;

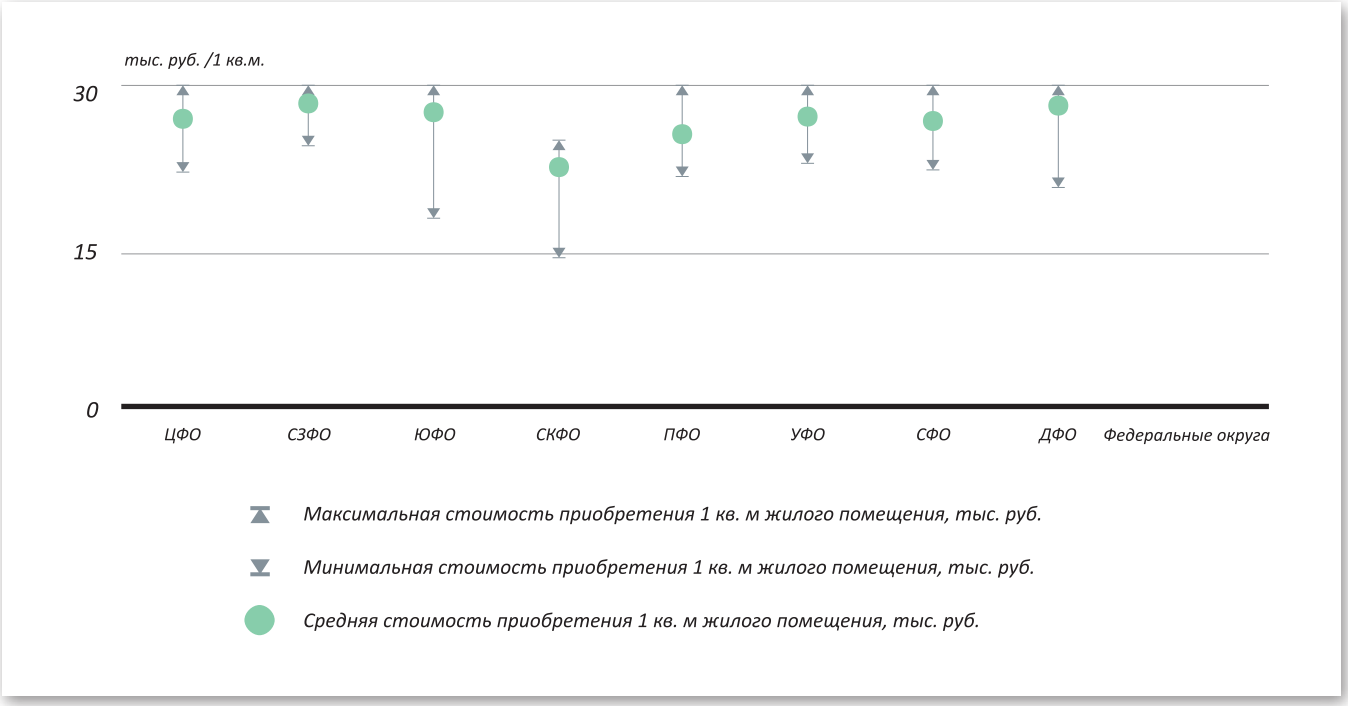


Рисунок 69. Средняя стоимость 1 кв. м жилых помещений в 2011 году в рамках долевого финансирования (тыс. рублей)

- отсутствие подготовительных мероприятий, разъяснительной работы с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда;
- недостаточный контроль за ходом реализации программ на региональном и муниципальном уровнях.

Наибольший объем средств в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлен на участие в долевом строительстве (44,8 процента), покупку жилых помещений у застройщиков (28,2 процента) и строительство многоквартирных домов (24,4 процента).

В рамках реализации региональных адресных программ, финансовая поддержка на реализацию которых предоставлена в 2011 году, субъектами Российской Федерации направлены средства застройщикам (с учетом авансовых платежей) на:

- строительство жилья — 4 312,6 млн. рублей;
- участие в долевом строительстве — 7 914,0 млн. рублей;
- приобретение жилья у застройщика — 4 984,9 млн. рублей;
- приобретение жилых помещений на вторичном рынке — 88,4 млн. рублей;
- выкуп помещений у собственников жилых помещений в многоквартирных домах — 349,1 млн. рублей.

Реализация программ в части приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, и выплаты выкупной цены осуществляется исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185–ФЗ.

Средняя стоимость приобретаемых в рамках долевого финансирования 1 кв. м жилого помещения в 2011 году составила 26,6 тыс. рублей (в 2010 году указанная стоимость составляла 26,5 тыс. рублей).

Средняя стоимость приобретаемого жилого помещения в 2011 году с учетом дополнительного финансирования (на оплату расходов, связанных с приобретением жилых помещений по цене, превышающей стоимость приобретения 1 кв. м жилого помещения и приобретения дополнительной площади) составила 27,6 тыс. рублей.

Максимальная стоимость 1 кв. м жилого помещения (30 тыс. рублей) в рамках долевого финансирования в соответствии с заключенными контрактами сложилась в Республике Алтай, Калужской области, Нижегородской области, Новосибирской области и Самарской области.

В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона № 185–ФЗ в случае приобретения муниципальными образованиями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей стоимость приобретения 1 кв. м жилых помещений, определенную Минрегионом России, либо предоставление гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществлялось за

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов.

На оплату расходов, связанных с приобретением помещений по цене, превышающей стоимость приобретения 1 кв. м жилых помещений, определенную Минрегионом России, в 2011 году за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов направлено 265,1 млн. рублей (4,0 процента от долевого финансирования региональных адресных программ).

Дополнительная площадь помещений, предоставленная гражданам при их переселении из аварийного жилищного фонда, составила 28,0 тыс. кв. м (12,7 процента от площади аварийного жилищного фонда, из которого переселены граждане). Объем финансирования приобретения указанной дополнительной площади за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов составил 758,8 млн. рублей.

В соответствии с частью 8 статьи 20[5] Федерального закона № 185–ФЗ экономия средств, предусмотренных региональными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, может быть направлена на финансирование работ по формированию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые предназначены для строительства многоквартирных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и работ по проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры. На проведение указанных мероприятий направлено 18,80 млн. рублей.

Основные параметры реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации представлены в приложении.

Отчет о результатах мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда

В соответствии с положениями Федерального закона № 185–ФЗ Фонд предоставляет финансовую поддержку субъектам Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда только при выполнении ими условий, установленных статьей 14 указанного Федерального закона.

Условия предоставления финансовой поддержки предусматривают реформирование отношений в сфере управления и содержания многоквартирных домов, преобразование предприятий коммунально–

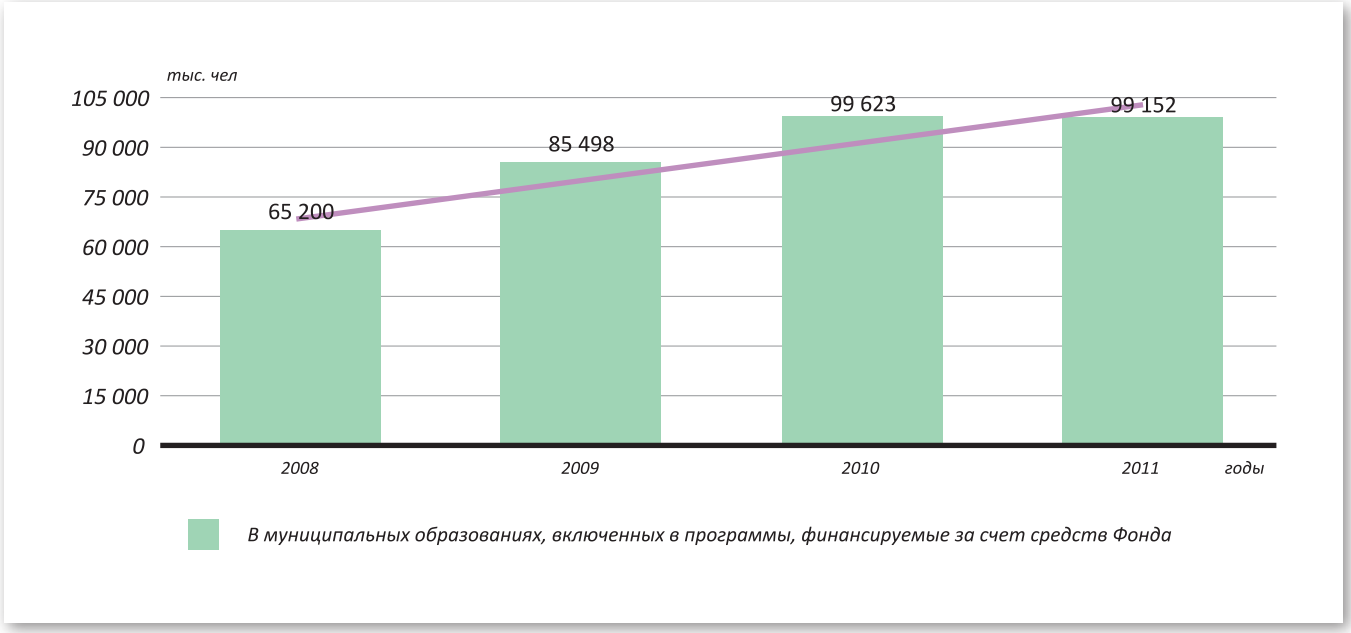


Рисунок 70. Динамика доли численности населения, проживающего на территориях муниципальных образований, включенных в региональные адресные программы, финансируемые за счет средств Фонда

го комплекса, создание условий для их безубыточной деятельности и развития, реализацию мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также преобразование отношений в сфере предоставления гражданам субсидий и мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

С начала деятельности Фонда перечень вышеуказанных условий оставался практически неизменным, при этом начиная с 2008 года изменялись количественные показатели, установленные статьей 14 Федерального закона № 185–ФЗ, а также сроки их достижения.

Так, Федеральным законом № 441–ФЗ срок прекращения практики установления тарифов организаций коммунального комплекса в сфере тепло– и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом перекрестного субсидирования продлен до 1 января 2013 года; снижен до 10 процентов минимально допустимый порог для показателя «доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья».

В течение 2011 года положения статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ также претерпевали изменения. Федеральным законом от № 124–ФЗ были продлены сроки достижения доли коммерческих организаций коммунального комплекса в муниципальных образованиях, включенных в заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, до 80 процентов до 1 июля 2012 года, а сроки завершения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта, продлены до 1 января 2012 года.

Вышеуказанные изменения, внесенные в статью 14 Федерального закона № 185–ФЗ, были направлены на закрепление достигнутых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, включенными в софинансируемые за счет средств Фонда региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, результатов преобразований в жилищно–коммунальной сфере.

Кроме того, внесенные в нормативную правовую базу изменения позволили большему количеству муниципальных образований субъектов Российской Федерации принять участие в региональных адресных программах, софинансируемых за счет средств Фонда.

При этом согласно Федеральному закону № 185–ФЗ суммарная численность населения муниципальных образований, которым предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, должна составлять не менее чем 20 процентов от общей численности населения субъекта Российской Федерации. Общее количество граждан, проживающих в муниципальных образованиях, участвующих в региональных адресных программах, достигло в 2011 году 99 152 126 человек, что составляет 76,1 процента от общего количества граждан Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики и города федерального значения Москвы). Снижение доли численности населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с уточнением численности населения по результатам проведенной переписи населения Российской Федерации 2010 года и сокращением численности населения в целом по Российской Федерации. При сопоставимых данных рост численности населения, проживающего на территориях муниципальных образований, включенных в софинансируемые Фондом региональные адресные программы, по сравнению с 2010 годом составил 108,5 процента.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 185–ФЗ, а также с Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом № 185–ФЗ, Фонд осуществляет мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 указанного Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки. Данный мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа предоставляемой в Фонд субъектами Российской Федерации квартальной и годовой отчетности.

Результаты мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки в 2011 году представлены ниже.

Развитие системы управления имущественным комплексом организаций коммунального комплекса

Одним из условий предоставлений финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ являлась деятельность на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро–, газо–, тепло–, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялось на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению (далее — коммерческие организации коммунального комплек–

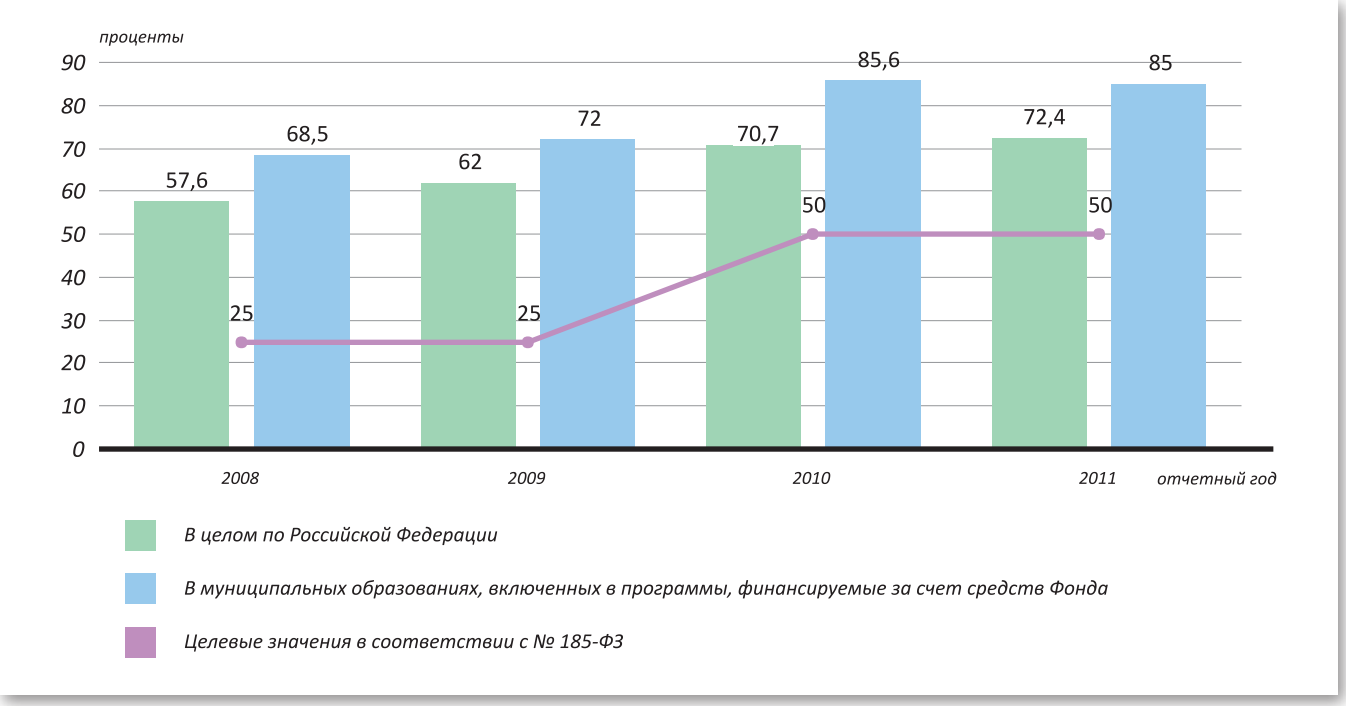


Рисунок 71. Динамика доли коммерческих организаций коммунального комплекса (в процентах)

са), и составляющих не менее чем 50 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории такого муниципального образования организаций коммунального комплекса (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации).

При этом Федеральным законом № 185–ФЗ установлено обязательство увеличения до 1 июля 2012 года доли коммерческих организаций коммунального комплекса от их общего количества на территории муниципальных образований до 80 процентов.

По итогам отчетности за 2011 год доля коммерческих организаций коммунального комплекса от их общего количества достигла 85,0 процента.

Наилучшие результаты (более 90 процентов) достигнуты в Республике Мордовия, Забайкальском крае, Амурской области, Кемеровской области, Липецкой области, Магаданской области, Новгородской области, Еврейской автономной области.

В среднем по Российской Федерации наблюдается стабильный рост указанного показателя: в 2008 году доля коммерческих организаций коммунального комплекса составляла 57,6 процента, в 2009 году — 62,0 процента, в 2010 году — 70,8 процента и в 2011 году — 72,4 процента.

Проведенный на примере Сибирского федерального округа анализ информации, представленной в годовой отчетности за 2011 год, показал, что на территориях муниципальных образований, включенных в заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, в большей степени (61,2 процента) реализуются договоры аренды объектов коммунальной инфраструктуры.

При этом заключение договоров аренды наиболее характерно для организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (80 процентов), деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (64,9 процента) и теплоснабжению (58,9 процента).

Использование организациями коммунального комплекса объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется и на праве частной собственности (23,6 процента). В основном это организации, оказывающие услуги по электро– и газоснабжению (соответственно 51,3 и 45,8 процента). В меньшей степени это относится к организациям, осуществляющим деятельность по теплоснабжению (24,1 процента), водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (19,7 процента).

В силу несовершенства законодательства о концессионных соглашениях такие соглашения на территориях муниципальных образований, включенных в заявки, заключаются редко (2,1 процента). При этом концессионные соглашения в отношении объектов энергоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на территориях муниципальных образований, включенных в заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, не заключаются.

Следует также отметить, что по–прежнему достаточно высока доля государственных (федеральных, субъектов Российской Федерации),

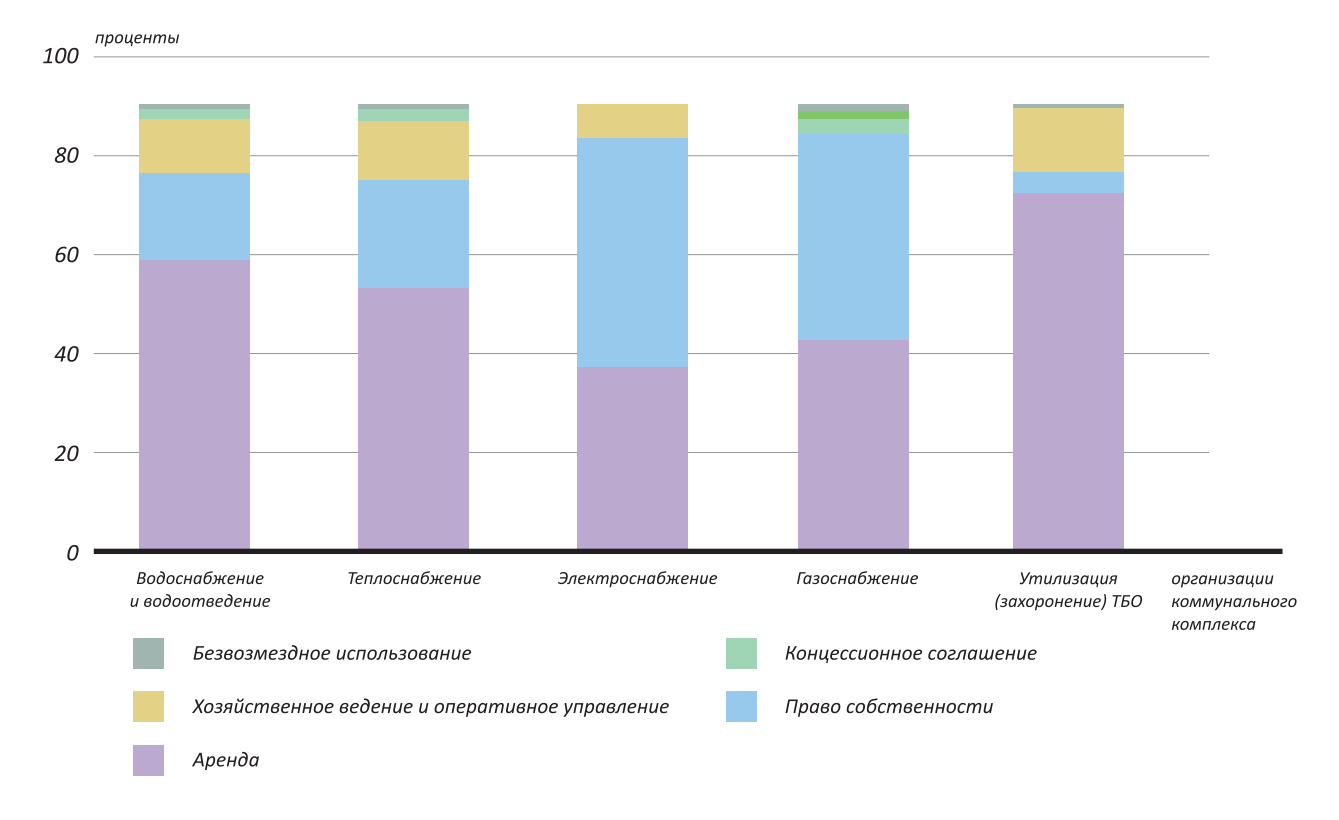


Рисунок 72. Право, на основании которого организациями коммунального комплекса осуществляется использование объектов коммунальной инфраструктуры

муниципальных и муниципальных казенных предприятий, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, включенных в заявки, от общего числа осуществляющих свою деятельность на территориях таких муниципальных образований организаций коммунального комплекса. Соответственно, довольно высока доля объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся у таких предприятий в хозяйственном ведении и оперативном управлении (12,1 процента).

Развитие отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда

В соответствии с требованием пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ при подаче субъектом Российской Федерации заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году на территории каждого претендующего на предоставление финансовой поддержки муниципального образования должно выполняться условие о деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, составляющих долю не менее 80 процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований (далее — частные управляющие организации) при условии управления такими организациями не менее чем 80 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

По итогам 2011 года в муниципальных образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда, частные управляющие организации в среднем составили 96,7 процента от общего числа управляющих организаций.

Необходимо отметить, что наилучших результатов в достижении указанного показателя развития рынка услуг управления жилищным фондом (100 процентов) удалось достичь в Республике Адыгея, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Мордовия, Республике Тыва, Амурской области, Липецкой области, Омской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

По состоянию на начало 2011 года указанный показатель составлял 96 процентов.

При этом в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года частные управляющие организации составила 89,7 процента от общего числа управляющих организаций.

Таким образом, наблюдается стабильный рост указанного показателя как по муниципальным образованиям, получившим финансовую поддержку

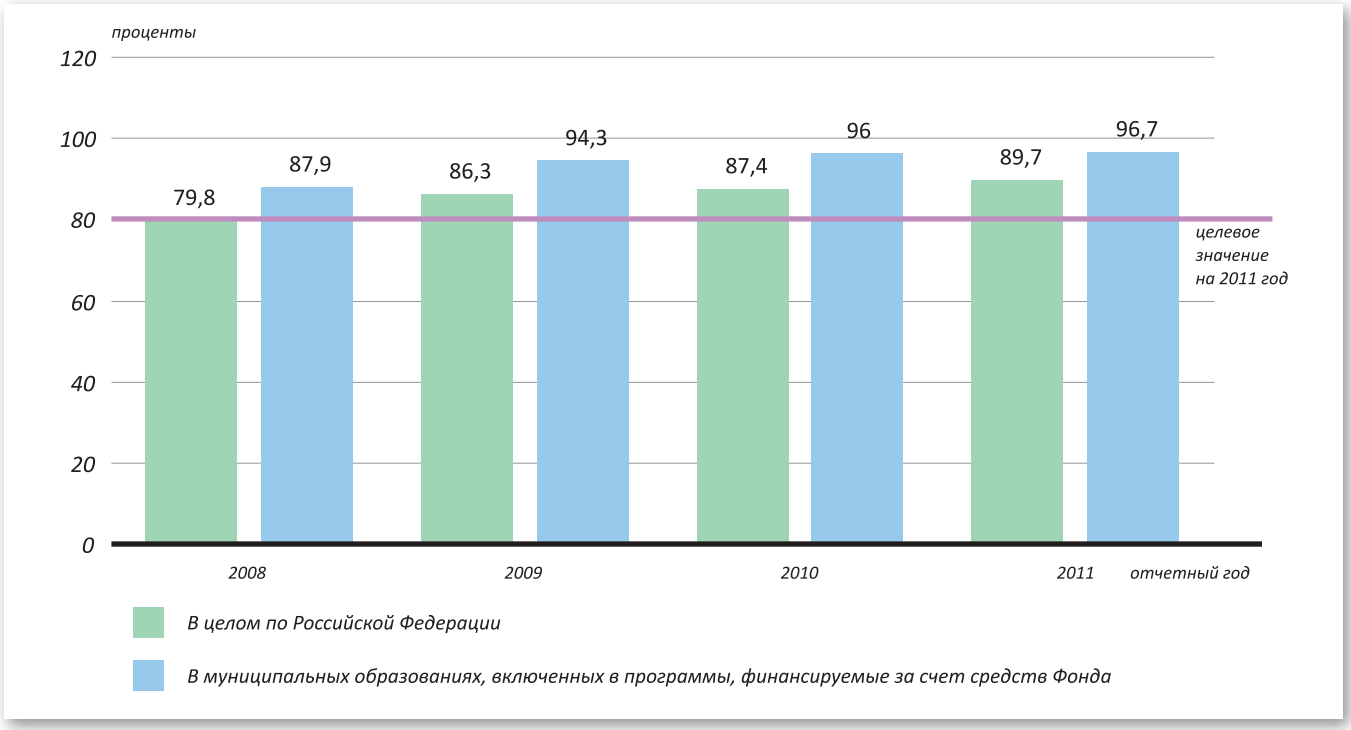


Рисунок 73. Динамика доли частных управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

за счет средств Фонда, так и в целом по Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2008 года в управлении частных управляющих организаций находилось только 8,8 процента многоквартирных домов в Российской Федерации. В первый год работы Фонда количество таких домов увеличилось в 3,9 раза.

По итогам 2011 года доля многоквартирных домов, находящихся в управлении частных управляющих организаций, составила 89,7 процента.

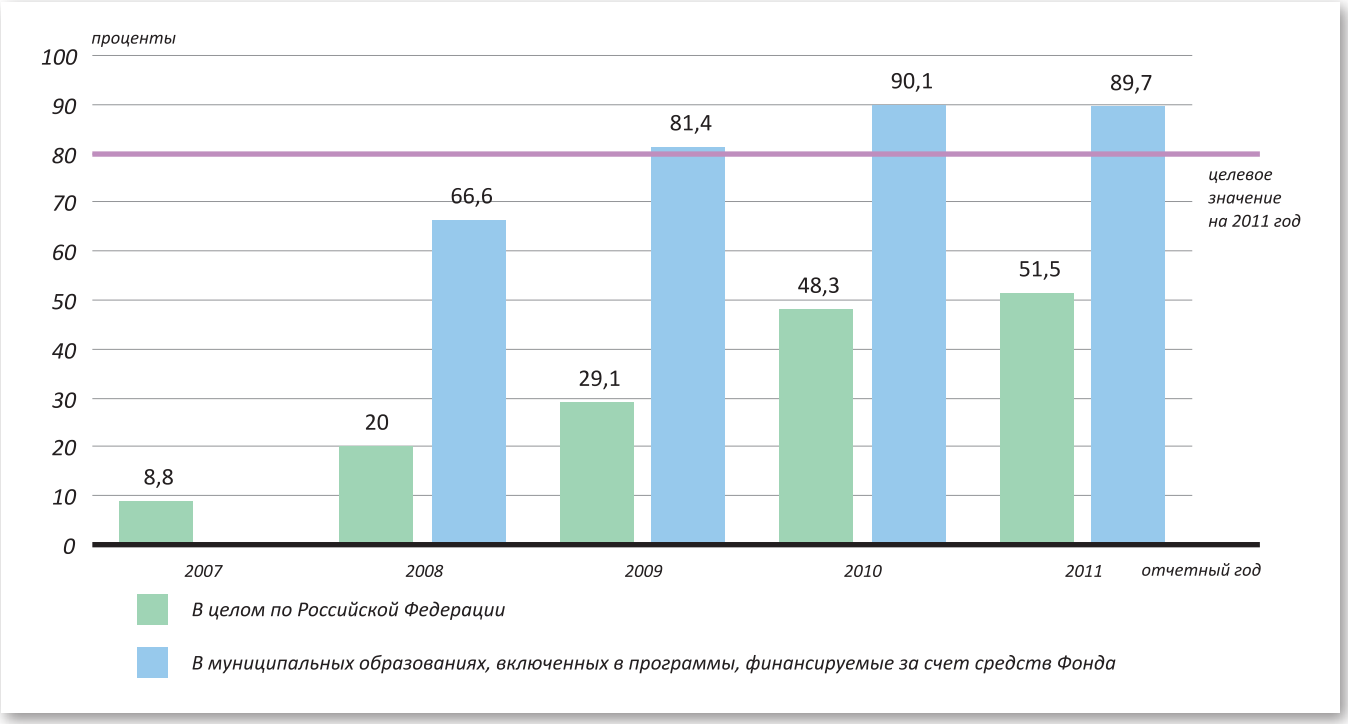


Рисунок 74. Динамика доли многоквартирных домов, находящихся под управлением частных управляющих организаций

Наилучшие результаты в достижении данного показателя зафиксированы в Республике Тыва (100 процентов) и высокие результаты (более 90 процентов) — в Республике Мордовия, Республике Хакасия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Красноярском крае, Волгоградской области, Кемеровской области, Тюменской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Исходя из вышеприведенных данных можно судить о стабильном развитии правоотношений в сфере управления многоквартирными домами.

Развитие инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах

В соответствии с требованием пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ в случае подачи субъектом Российской Федерации заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году товарищества собственников жилья должны быть созданы не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов.

По итогам 2011 года доля многоквартирных домов, собственники жилых помещений в которых выбрали и реализуют способ управления посредством создания товариществ собственников жилья, в муниципальных образованиях, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда, в среднем составила 19,9 процента.

Необходимо отметить, что по итогам 2010 года указанный показатель составлял 20,4 процента.

Все субъекты Российской Федерации, получившие финансовую поддержку за счет средств Фонда, выполнили требование пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ, установленное на 2011 год. Наилучшие результаты в развитии инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах в части выбора способа управления посредством создания товариществ собственников жилья наблюдаются в Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Мордовия, Республике Татарстан, Белгородской области, Тамбовской области и Омской области.

В среднем по Российской Федерации к 1 января 2012 года указанный показатель составил 13,6 процента (по сравнению с 2011 годом прирост составил почти 10 процентов).

Таким образом, даже при снижении порогового значения указанного показателя до 10 процентов в 2011 году его уровень практически не меняется, что свидетельствует о заинтересованности собственников помещений в многоквартирных домах в процессе управления своим имуществом.

Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков

В ходе преобразования отношений собственности в жилищной сфере, связанных с передачей прав собственности на общее имущество в многоквартирных домах и ответственности за его содержание собственникам жилых помещений в много–

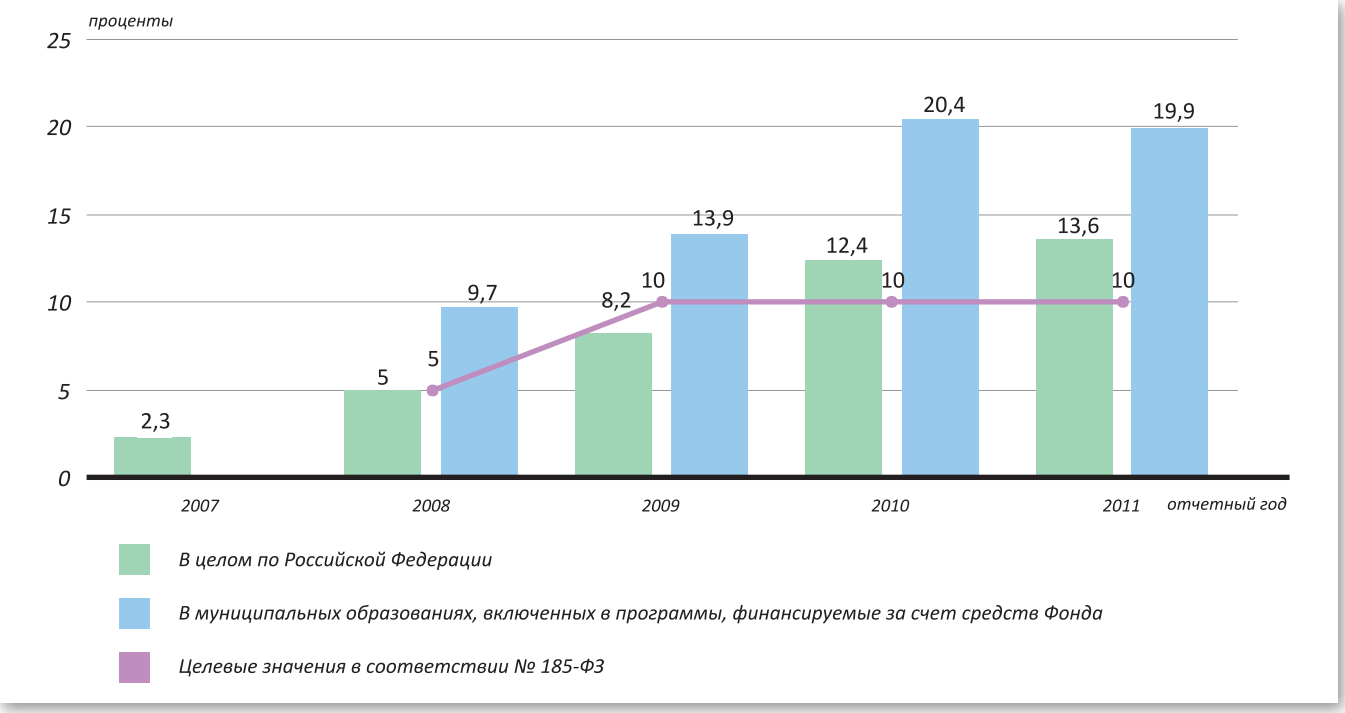


Рисунок 75. Динамика доли многоквартирных домов, выбравших способ управления посредством товариществ собственников жилья (процентов)

квартирных домах, одной из ключевых задач стало выделение земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в общую долевую собственность собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действия Жилищного кодекса Российской Федерации» в существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ до 1 января 2012 года в субъектах Российской Федерации должны быть завершены работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирные дома.

В региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется в том числе за счет средств Фонда, включены 114 885 многоквартирных домов, из них в соответствии с информацией, представленной субъектами Российской Федерации в ходе рассмотрения годовых отчетов, земельные участки под 114 662 многоквартирными домами сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, что составляет 99,8 процента от общего числа многоквартирных домов, включенных в данные программы.

В целом по России, по данным, поступившим в Фонд от субъектов Российской Федерации (без учета Чеченской Республики и города федерального значения Москвы) из 1 221 345 многоквартирных домов, расположенных на территории Российской Федерации, только под 488 538 из них земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, что составляет 40 процентов от общего количества многоквартирных домов (рост к 2010 году составляет 103,2 процента).

Анализ представленных в Фонд годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2011 год показал, что требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ не выполняется в 6 субъектах Российской Федерации, что составляет 7,4 процента от всех субъектов Российской Федерации, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда (Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Тюменская область, Ульяновская область и Чукотский автономный округ).

Необходимо отметить, что по итогам 2010 года данное условие не выполнялось в 23 субъектах Российской Федерации.

Основной причиной невыполнения указанного выше требования Федерального закона № 185–ФЗ в 2010 и 2011 годах стало отсутствие согласия правообладателя земельного участка (Российской Федерации) на государственный кадастровый учет изменений объектов недвижимости. В основном это относится к землям, находящимся в ведении Минобороны России, ОАО «Российские железные дороги».

В целях решения указанной проблемы с участием и по инициативе Фонда были предприняты меры, результатом которых стало существенное сокращение количества субъектов Российской Федерации, которые по состоянию на 1 января 2012 года не выполнили требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ.

Так, по инициативе Фонда была отмечена необходимость внесения изменений в ряд нормативных правовых актов в целях упрощения процедуры согласования указанных документов и в Федеральный закон № 185–ФЗ в части продления сроков проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков до 1 января 2012 года.

Кроме того, данная проблема рассматривалась на селекторном совещании, которое было проведенно заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козаком и по результатам которого было дано поручение Минобороны России, Росреестру, ОАО «Российские железные дороги», органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по организации работы и согласованию документов, необходимых для завершения формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

В то же время для полного устранения объективных причин невыполнения субъектами Российской Федерации условия пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ необходимо принятие законопроекта № 455471–5 «О внесении изменений в статью 11^2 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», который предусматривает возможность образования

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, без согласия собственника.

Предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме

Условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренными пунктом 5 и пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ, является предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, а также иных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг только в денежной форме.

Во всех муниципальных образованиях, входящих в состав субъектов Российской Федерации, которым была предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, указанные меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме, в том числе путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские счета.

В 2011 году субъекты Российской Федерации продолжили работу по приведению своих нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствие с требованием пункта 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ. Этому, в частности, способствовало принятие Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 439–ФЗ «О внесении изменений в статьи 52^2 и 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», в котором была закреплена денежная форма предоставления мер социальной поддержки педагогам, работающим и проживающим в сельской местности, и источники финансирования.

Двум субъектам Российской Федерации — Карачаево–Черкесской Республике и Республике Калмыкия в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 185–ФЗ в 2011 году Фонд приостанавливал предоставление финансовой поддержки в связи с выявлением нарушения условия, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона. В настоящее время все нарушения устранены, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приведены в соответствии с требованиями законодательства.

Совершенствование системы ценообразования и повышение эффективности расходования бюджетных средств в коммунальной сфере

Федеральный закон № 185–ФЗ предусматривает комплекс мер по совершенствованию ценообразования и повышению эффективности расходования бюджетных средств, в том числе наличие графиков, предусматривающих установление не позднее 1 января 2013 года тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей

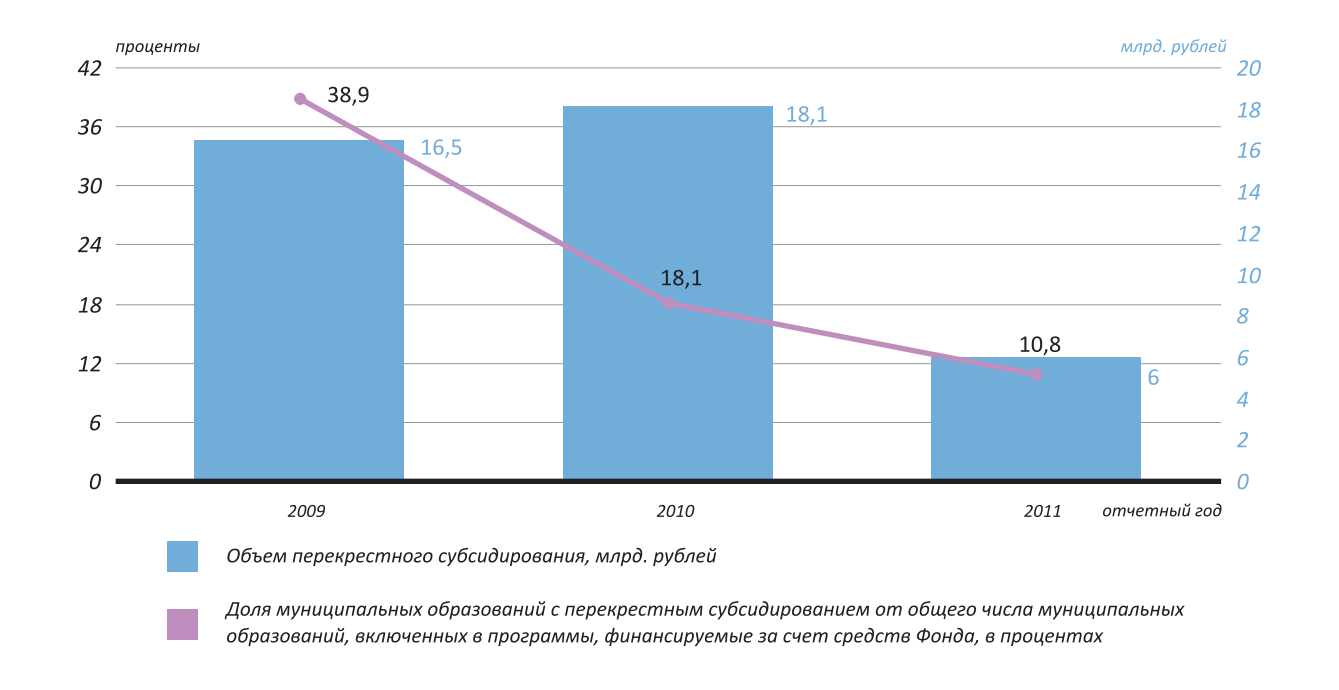


Рисунок 76. Информация об объеме перекрестного субсидирования тарифов организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжении в муниципальных образованиях, включенных в финансируемые с участием средств Фонда программы

коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.

В 2010 году, выполняя требования Федерального закона № 185–ФЗ, муниципальные образования 32 субъектов Российской Федерации, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда, полностью ликвидировали перекрестное субсидирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

На 1 января 2012 года перекрестное субсидирование отсутствовало в муниципальных образованиях, включенных в финансируемые с участием средств Фонда региональные адресные программы программы, по 50 субъектам Российской Федерации.

При этом перекрестное субсидирование тарифов организаций коммунального комплекса было сохранено на территориях 312 муниципальных образований в 2011 году, что составляет 10,8 процента от общего количества муниципальных образований, включенных в софинансируемые Фондом программы. По сравнению с 2010 годом количество муниципальных образований, где сохраняется перекрестное субсидирование тарифов организаций коммунального комплекса, сократилось почти в полтора раза (2010 год — 465 муниципальных образований).

По итогам рассмотрения годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2011 год объем перекрестного субсидирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, составил 6,0 млрд. рублей (в 2010 году данный показатель составлял 18,1 млрд. рублей).

Таким образом, по итогам 2011 года наблюдается положительная динамика в части сокращения объема перекрестного субсидирования тарифов организаций коммунального комплекса.

В целом субъекты Российской Федерации выходят на новый уровень в установлении тарифов организаций коммунального комплекса и сокращают разницу в уровне тарифов между потребителями, что способствует достижению баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса при выполнении требований прозрачности государственного регулирования тарифов указанных организаций, а также способствует совершенствованию системы компенсации малоимущим слоям населения разницы в тарифах в зависимости от совокупного дохода семьи через субсидии в денежной форме.

Во исполнение пункта 8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ с 1 января 2010 года должно быть прекращено предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло– и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод в муниципальных образованиях, ранее включенных в финансируемые с участием средств Фонда программы, а в муниципальных образованиях, впервые претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, с момента подачи субъектом Российской Федерации соответствующей заявки.

По итогам рассмотрения годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2011 год данное условие было выполнено всеми субъектами Российской Федерации, получившими финансовую поддержку за счет средств Фонда.

Условием предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда также является наличие установленных тарифов, надбавок и (или) тарифов на подключение, обеспечивающих необходимые для реализации производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры финансовые потребности организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление (пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185–ФЗ).

В соответствии с документами, представляемыми в Фонд субъектами Российской Федерации для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда, практически повсеместно тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, устанавливаются на основе утвержденных и согласованных в установленном порядке производственных программ данных организаций.

В 2011 году инвестиционные программы организаций коммунального комплекса реализовывались всего в 4,3 процента организаций от общего количества организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, находящихся на территориях 321 муниципального образования, включенного в финансируемые с участием средств Фонда программы (12,1 процента от общего количества муниципальных образований, включенных в софинансируемые Фондом программы).

Развитие системы ресурсо- и энергосбережения

На территориях всех субъектов Российской Федерации, получивших финансовую поддержку за счет средств Фонда, реализуются региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответ–

ствующие требованиям Федерального закона от № 261–ФЗ, и региональные (или) муниципальные программы по установке общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.

Проведенный анализ утвержденных субъектами Российской Федерации, получившими финансовую поддержку за счет средств Фонда, региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показал, что все эти программы соответствуют требованиям федерального законодательства.

В целом результаты проведенного анализа показывают, что в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, включенных в финансируемые с участием средств Фонда программы, проведена значительная работа по оснащению многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления указанных ресурсов. По состоянию на 1 января 2012 года установлено 841476 приборов учета, из которых:

приборов учета тепловой энергии	161 843 шт. (31,0 процента от общего числа домов с услугой);
приборов учета горячего водоснабжения	104 036 шт. (31,6 процента от общего числа домов с услугой);
приборов учета холодного водоснабжения	195 040 шт. (30,4 процента от общего числа домов с услугой);
приборов учета электроснабжения	380 557 шт. (44,8 процента от общего числа домов с услугой).

По итогам мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки с 2008 по 2011 годы можно сделать вывод, что за период деятельности Фонда заложенный в Федеральном законе № 185–ФЗ механизм софинансирования за счет средств Фонда региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при условии реформирования жилищно–коммунального комплекса муниципальных образований, включенных в указанные программы, по ряду направлений, обозначенных в Федеральном законе № 185–ФЗ (далее — механизм обусловленного финансирования), показал свою высокую эффективность:

- существенно возросло количество частных управляющих организаций, а также их долях на рынке услуг по управлению многоквартирными домами;
- все чаще собственниками помещений в многоквартирных домах стал выбираться такой способ управления как товарищество собственников жилья;
- под многоквартирными домами, включенными в вышеуказанные региональные адресные программы, практически в полном объеме завершены формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков;

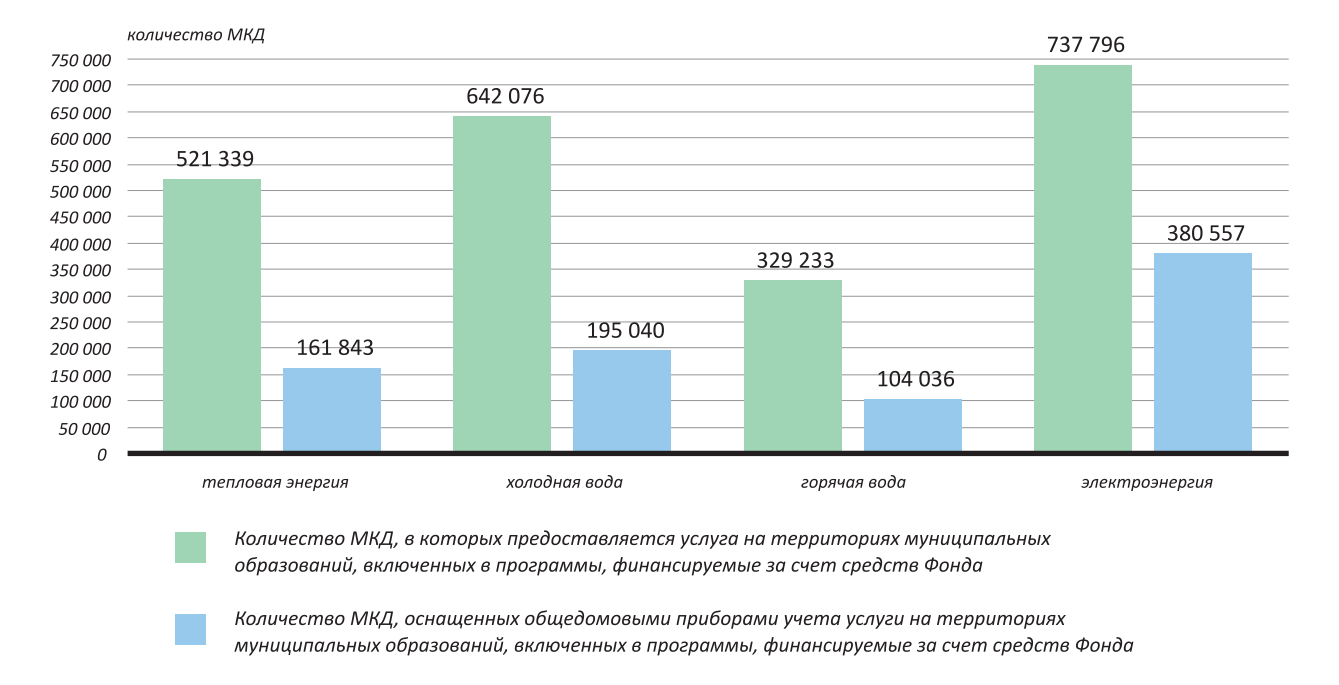


Рисунок 77. Количество установленных в многоквартирных домах общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных образованиях, включенных в программы, финансируемые за счет средств Фонда

• существенно сократился объем перекрестного субсидирования тарифов организаций коммунального комплекса в сфере тепло– и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

• прекращена практика предоставления организациям коммунального комплекса субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло– и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Обобщая итоги деятельности Фонда с 2008 года, можно констатировать, что цели реформирования отрасли, определенные Федеральным законом № 185–ФЗ, к 1 января 2012 года в целом достигнуты.

В дальнейшем, с учетом необходимости решения остающихся в настоящее время значительных проблем в жилищно–коммунальном комплексе страны, принято решение о продолжении активного использования имеющего свою высокую эффективность механизма обусловленного финансирования, с одновременным нацеливанием этого механизма на качественные преобразования в отрасли.

Сведения о выполнении субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году представлены в приложении.

Отчет о расходовании средств Фонда, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ

Особенности предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году

В 2011 году Фондом приняты решения о предоставлении финансовой поддержки субъектам Российской Федерации по 166 заявкам на общую сумму 34 127,06 млн. рублей, в том числе на капитальный ремонт многоквартирных домов — 9 865,56 млн. рублей, на переселение граждан — 14 543,34 млн. рублей и на переселение граждан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства — 9 718,16 млн. рублей. Из них 1 289,99 млн. рублей зачтено из экономии по заявкам прошлых лет.

Всего в 2011 году в соответствии с поданными субъектами Российской Федерации заявками и принятыми Фондом решениями предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 2 4641,34 млн. рублей (в том числе 310,275 млн. рублей по заявкам 2010 года).

Наличие остатка средств в объеме 8 068,33 млн. рублей, не перечисленных Фондом по одобренным заявкам субъектов Российской Федерации на 1 января 2012 года, обусловлено применением Фондом Порядка перечисления средств Фонда, в соответствии с которым по 102 заявкам субъектов Российской Федерации финансовая поддержка перечислена в размере 30 процентов; оставшиеся средства перечисляются Фондом после получения и рассмотрения правлением Фондом отчетов субъектов Российской Федерации о завершении реализации соответствующих региональных адресных программ, а также реестров контрактов, заключенных в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По итогам реализации региональных адресных программ по заявкам 2008–2011 годов на счетах субъектов Российской Федерации образовались неизрасходованные денежные средства в объеме 3 721,28 млн. рублей. На основании внесенных субъектами Российской Федерации изменений в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда правлением Фонда при рассмотрении этих изменений приняты решения об изменении объема финансирования ранее представленных программ и внесены соответствующие изменения в дополнительные соглашения. Из указанной суммы по заявкам субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, одобренное правлением Фонда, в 2009–2011 годах в порядке зачета направлено 3 629,45 млн. рублей. Из них зачтено из экономии по заявкам 2008 года 1 010,70 млн. рублей, из экономии по заявкам 2009 года 1 669,25 млн. рублей и из экономии по заявкам 2010 года 949,51 млн. рублей.

Объем не использованных средств Фонда на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, которые отражены в измененных региональных адресных программах и которые можно будет направить на реализацию программ 2012 года, составил 91,83 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года из 81 субъекта Российской Федерации 19 выбрали лимит 2011 года на 100 процентов и только 6 субъектов Российской Федерации — менее чем на 90 процентов.

Всего возвращено на счет Фонда в 2011 году 323,03 млн. рублей. Из них 313,71 млн. рублей возвращено в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 17 декабря 2009 года № 316–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищ–

но–коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» из неиспользованных средств Фонда, возникших при заключении контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья. Остальные средства Фонда в сумме 9,3 млн. рублей были возвращены в соответствии с пунктом 2 соглашений, заключенных Фондом с соответствующими субъектами Российской Федерации. В соответствии с частями 3 и 3^1 статьи 17 Федерального закона № 185–ФЗ возвращенные в Фонд средства в сумме 319,56 млн. рублей были распределены между субъектами Российской Федерации на реализацию адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2008 года

В 2011 году по заявкам 2008 года перечисление средств на счета бюджетов субъектов Российской Федерации или на счета местных бюджетов не производилось. Субъекты Российской Федерации завершали реализовывать региональные адресные программы и, как следствие, расходовать средства по заявкам 2008 года, а именно по:

- региональным адресным программам по проведению капитального ремонта многоквартирных домов завершалось списание средств в 21 субъекте Российской Федерации из 77 субъектов Российской Федерации, представивших заявки;
- региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по 3 субъектам Российской Федерации из 52 субъектов Российской Федерации, представивших заявки;
- региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья осуществлен возврат средств Фонда по 5 субъектам Российской Федерации из 22 субъектов Российской Федерации.

Всего на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2008 года за период с 1 января 2008 года по 1 января 2012 года направлено 84 045,22 млн. рублей, из которых средства Фонда составляют 52 622,47 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований и собственников жилья — 31 422,75 млн. рублей, в том числе:

1) на капитальный ремонт многоквартирных домов 5 7884,39 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 35 680,40 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 100 96,66 тыс. рублей;

в) средств муниципальных образований — 8 926,56 млн. рублей;

г) средств собственников жилья — 3 180,77 млн. рублей;

2) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 13 737,26 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 8 877,27 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 2 812,26 млн. рублей;

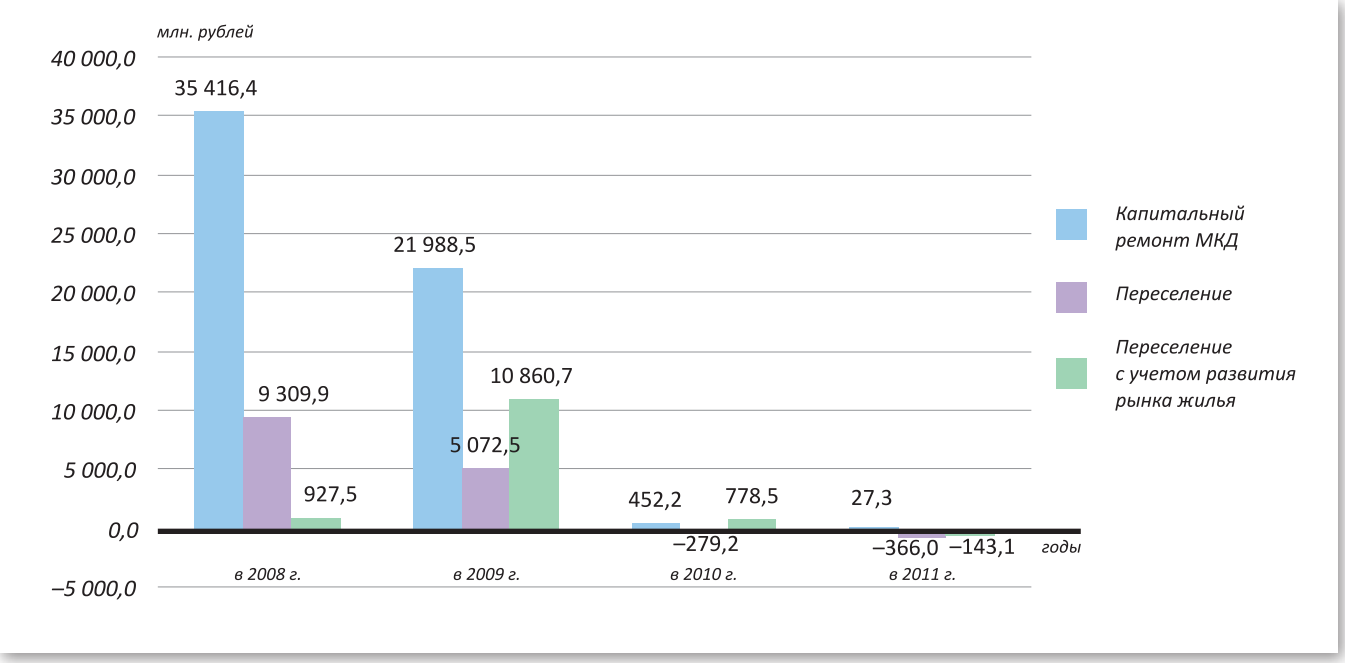


Рисунок 78. Расходование субъектами Российской Федерации денежных средств в 2011 году на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2008 года (млн. рублей)

в) средств муниципальных образований — 2 047,73 млн. рублей;

3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 12 423,57 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 8 064,80 млн. рублей;

б) средств бюджета субъектов Российской Федерации — 4 358,77 млн. рублей.

В целом движение денежных средств в 2011 году было связано с возникшей экономией и последующей корректировкой региональных адресных программ. Из возвратов на счета субъектов Российской Федерации средств Фонда, полученных в результате экономии при реализации региональных адресных программ по заявкам 2008 года на сумму 1 117,78 млн. рублей, было произведено зачетов в заявках 2009–2011 годов на сумму 1 010,70 млн. рублей.

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2009 года

В 2011 году по заявкам 2009 года перечисление средств на счета бюджетов субъектов Российской Федерации или на счета местных бюджетов не производилось. Субъекты Российской Федерации завершали реализовывать региональные адресные программы и, как следствие, расходовать средства по заявкам 2009 года, а именно по:

- региональным адресным программам по проведению капитального ремонта многоквартирных домов завершилось списание средств по 24 субъектам Российской Федерации из 74 субъектов Российской Федерации, представивших заявки;
- региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по 6 субъектам Российской Федерации из 39 субъектов Российской Федерации, представивших заявки;
- региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья осуществлен возврат средств Фонда по 18 субъектам Российской Федерации из 54 субъектов Российской Федерации.

Всего на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2009 года со счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований за период с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года направлено 128 223,26 млн. рублей, из которых средства Фонда составляют 107 106,29 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований и собственников жилья — 21 116,97 млн. рублей, в том числе:

1) на капитальный ремонт многоквартирных домов 93 352,74 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 75 678,90 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 7 788,70 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 5 097,09 млн. рублей;

г) средств собственников жилья — 4 788,05 млн. рублей;

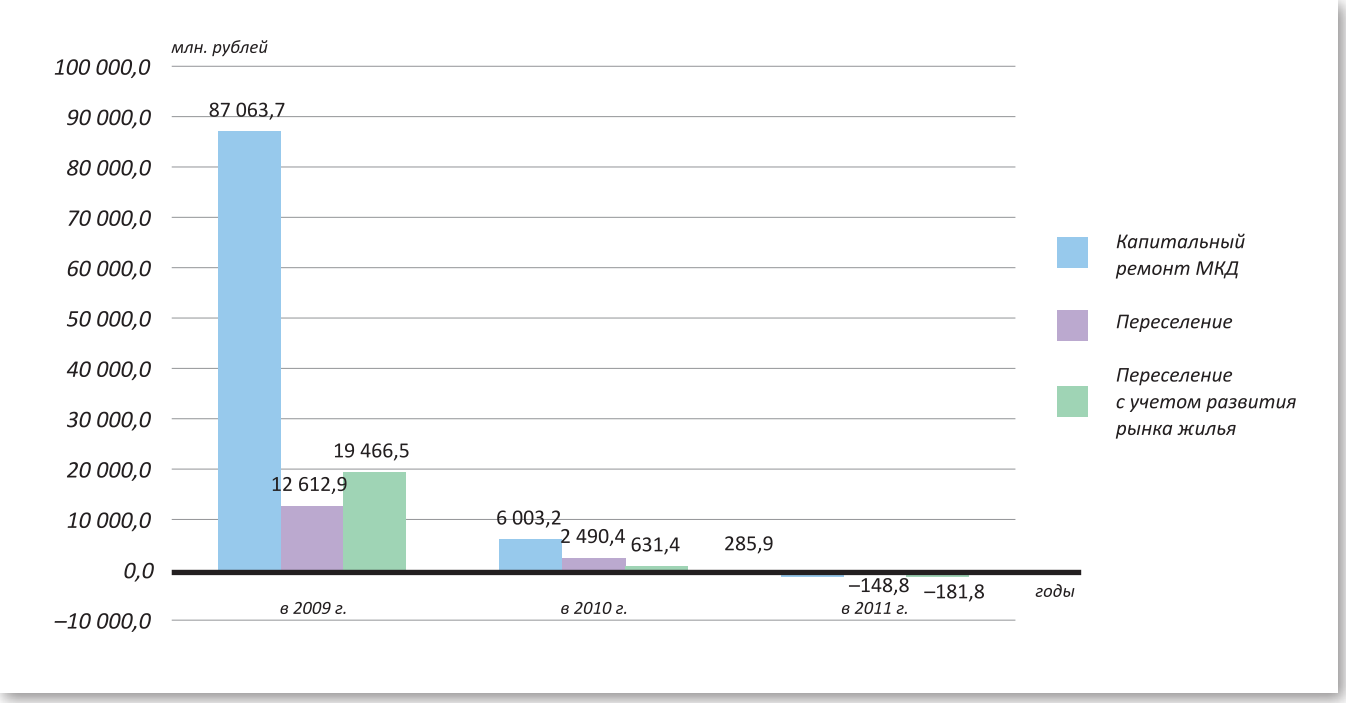


Рисунок 79. Расходование субъектами Российской Федерации денежных средств в 2011 году на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2009 года (млн. рублей)

2) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 14 954,49 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 13 361,80 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 879,81 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 712,87 млн. рублей;

3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 19 916,03 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 18 065,58 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъекта Российской Федерации — 1 850,45 млн. рублей.

Из возвратов на счета субъектов Российской Федерации средств Фонда, полученных в результате экономии при реализации программ по заявкам 2009 года на сумму 1 678,25 млн. рублей, были произведены зачеты в заявках 2010–2011 годов на сумму 1 669,25 млн. рублей.

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2010 года

В 2011 году по заявкам 2010 года был перечислен остаток средств в объеме 310,27 млн. рублей, не перечисленный Фондом по одобренным заявкам 5 субъектов Российской Федерации на 1 января 2011 года. Наличие остатка средств обусловлено применением Фондом Порядка перечисления средств.

Всего на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2010 года за период с 1 января 2010 года по 1 января 2012 года направлено 111 884,77 млн. рублей, из которых средства Фонда составляют 93 680,97 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований и собственников жилья — 18 203,80 млн. рублей, в том числе:

1) на капитальный ремонт многоквартирных домов 80 886,90 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 66 350,50 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 5 017,92 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 401,93 млн. рублей;

г) средств собственников жилья — 4 116,54 млн. рублей;

2) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 16 067,05 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 14 536,59 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 977,47 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 552,99 млн. рублей;

3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 8 654,51 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 7 797,71 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъекта Российской Федерации — 584,84 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 271,97 млн. рублей.

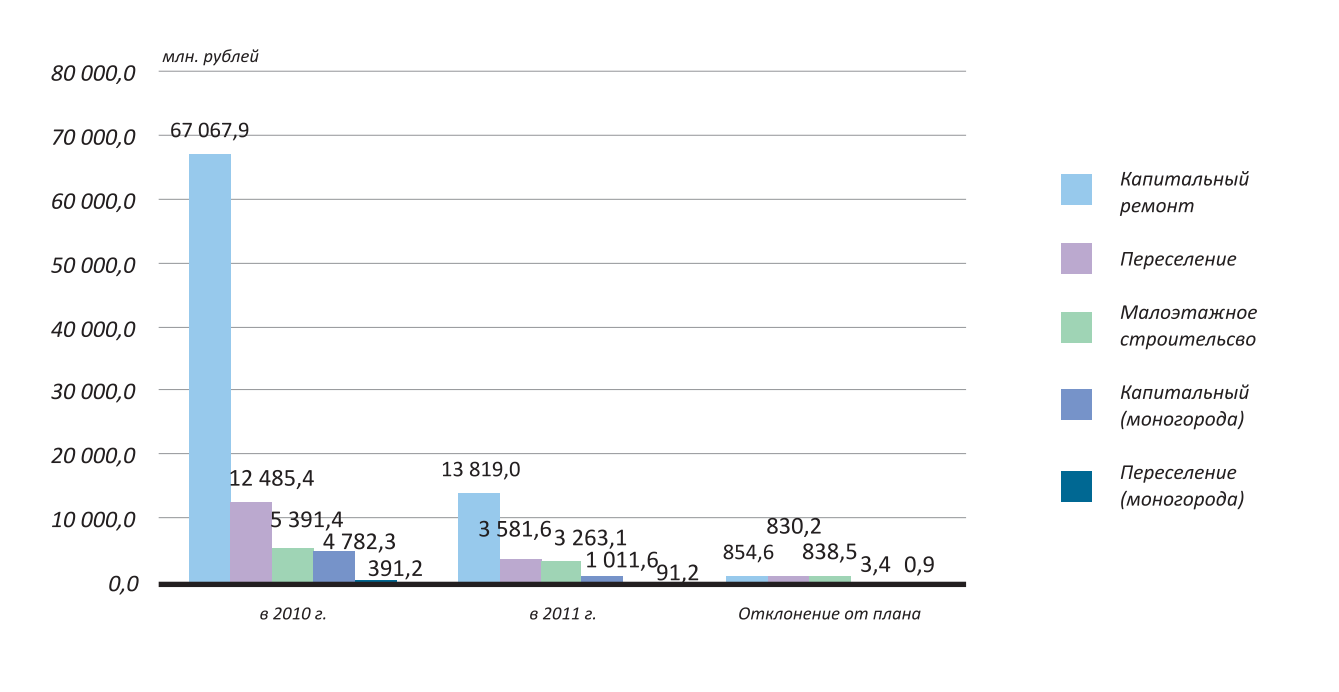


Рисунок 80. Расходование субъектами Российской Федерации денежных средств в 2011 году на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2010 года (млн. рублей)

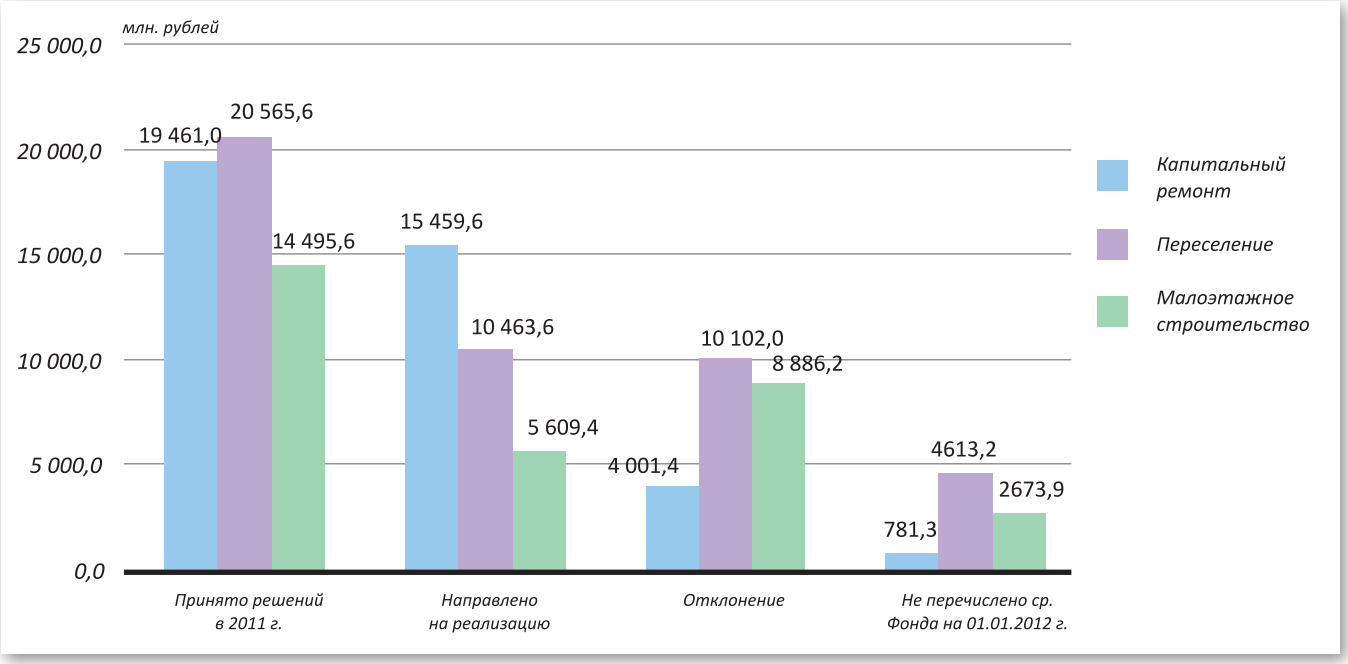


Рисунок 81. Расходование субъектами Российской Федерации денежных средств в 2011 году на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2011 года (млн. рублей)

4) на капитальный ремонт многоквартирных домов в монопрофильных муниципальных образованиях 5 793,89 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 4 558,67 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъекта Российской Федерации — 237,66 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 453,75 млн. рублей.

г) средств собственников жилья — 543,81 млн. рублей;

5) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в монопрофильных муниципальных образованиях 482,41 млн. рублей,

а) средств Фонда — 437,49 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъекта Российской Федерации — 27,69 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 17,23 млн. рублей.

Из возвратов на счета субъекта Российской Федерации средств Фонда, полученных в результате экономии при реализации региональных адресных программ по заявкам 2010 года на сумму 1 174,93 млн. рублей, были произведены зачеты в заявках 2010–2011 года на сумму 949,51 млн. рублей.

Расходование средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по заявкам 2011 года

На реализацию региональных адресных программ по заявкам 2011 года по состоянию на 1 января 2012 года направлено 31 532,49 млн. рублей, из которых средства Фонда составляют 18 938,24 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований и собственников жилья — 12 594,25 млн. рублей, в том числе:

1) на капитальный ремонт многоквартирных домов 15 459,56 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 8 500,03 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 3 538,18 млн. рублей;

в) средств муниципальных образований — 3 289,38 млн. рублей;

г) средств собственников жилья — 131,96 млн. рублей;

2) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 10 463,57 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 6 730,04 млн. рублей;

б) средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 2 278,34 млн. рублей;

с) средств муниципальных образований — 1 455,19 млн. рублей;

3) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 5 609,37 млн. рублей, из которых:

а) средств Фонда — 3 708,17 млн. рублей;

б) средств бюджета субъекта Российской Федерации — 1 498,43 млн. рублей.

с) средств муниципальных образований — 402,76 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ СТРАТЕГИИ

государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на период до 2013 года

Информация о выполнении стратегии государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на период до 2013 года

Стратегия Фонда определяет статус, цели и функции государственной корпорации, основные принципы, направления и ожидаемые результаты деятельности Фонда на 2011 и 2012 годы. Оценка результатов этой деятельности осуществляется по основным показателям эффективности деятельности Фонда по четырем ключевым направлениям. Целевые значения показателей установлены исходя из объема средств Фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, прогноза использования субъектами Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств Фонда и результатов реализации соответствующих региональных адресных программ, а также в соответствии с установленными Федеральным законом № 185–ФЗ условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в части проведения преобразований жилищно–коммунального комплекса.

Участие субъектов Российской Федерации в программахФонда

Несмотря на сокращение возможного объема финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств государственной корпорации, активность субъектов Российской Федерации по участию в программах Фонда в отчетном периоде осталась высокой.

Подтвержденная в предыдущие годы эффективность такого инструмента поддержки, расширение видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и механизмов реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволили обеспечить вовлеченность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в программы Фонда на уровне выше ожидаемого. При этом необходимо отметить, что объем мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации, возможная степень охвата многоквартирных домов и вовлечения муниципальных образований были ограничены объемом лимитов финансовой поддержки, оставшихся для использования в 2011 году. Вместе

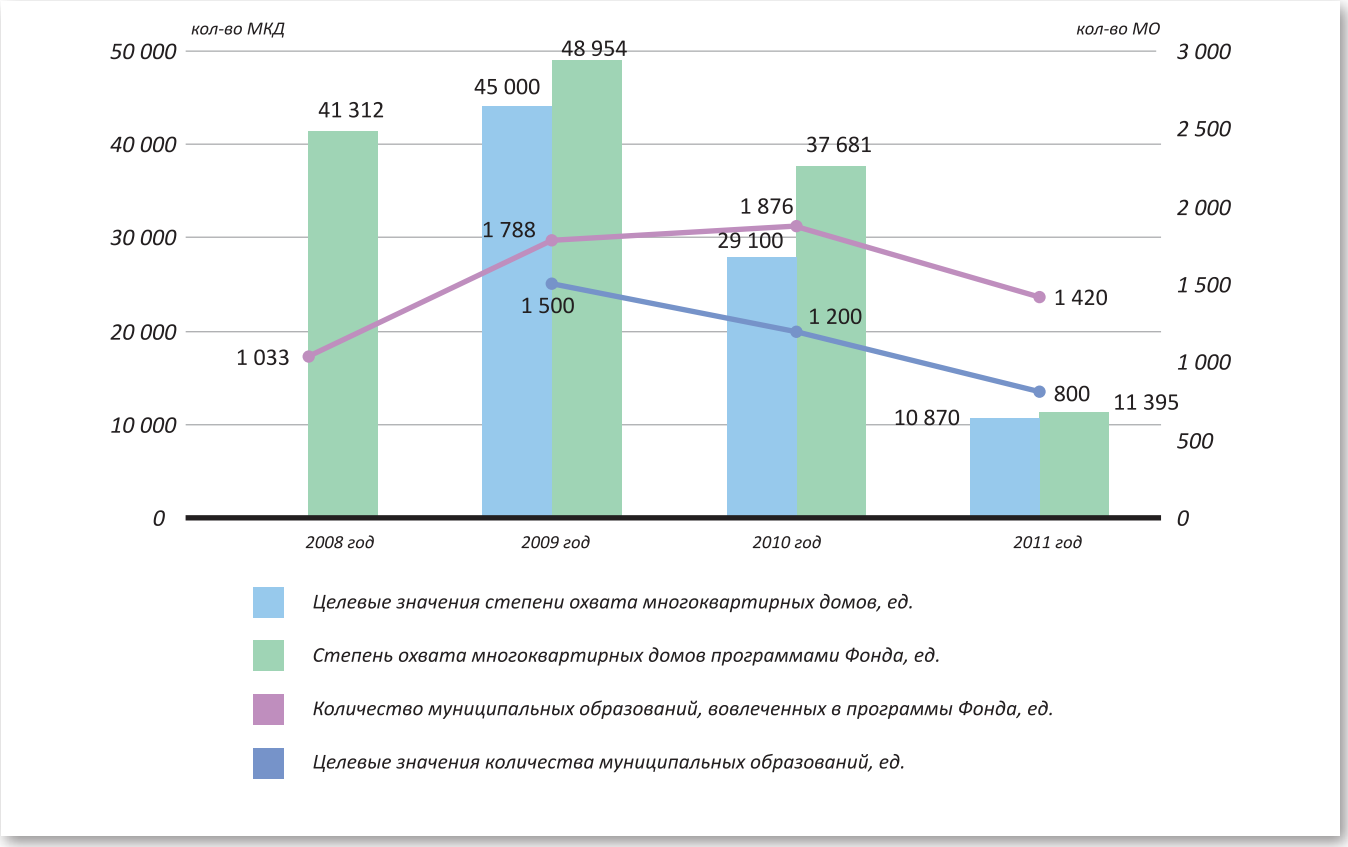


Рисунок 82. Динамика численности муниципальных образований и многоквартирных домов в составе программ Фонда

с тем, рядом субъектов Российской Федерации в дополнение к обязательному объему софинансирования привлечены дополнительные финансовые ресурсы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, что увеличило объем расходов на реализацию мероприятий, проводимых в рамках региональных адресных программ.

Реализация преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Оценка состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2008–2011 годах свидетельствует об активизации с началом деятельности Фонда процесса реформирования отрасли и о положительной динамике индикаторов, характеризующих развитие инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах, демонополизацию обслуживания жилищного фонда, расширение деятельности на рынке жилищно-коммунальных услуг организаций частной формы собственности.

В рамках передачи прав собственности на общее имущество в многоквартирных домах осуществляется выделение земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в общую долевую собственность собственников жилых помещений в этих домах. По итогам 2011 года доля многоквартирных домов, земельные участки под которыми сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов, находящихся на территориях муниципальных образований, участвующих в программах Фонда, составила 45,3 процента. Указанное значение соответствует установленному Стратегией Фонда целевому уровню и превышает значение указанного показателя, сложившееся в целом по Российской Федерации (40 процентов).

Повышение энергетической эффективности является одним из инструментов улучшения функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом и оптимизации затрат граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Исходя из установленных целей, деятельность государственной корпорации направлена на содействие внедрению ресурсосберегающих технологий.

Программы энергосбережения субъектов Российской Федерации, реализуемые как одно из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, включают в себя меры, которые способствуют повышению энергетической эффективности жилищного фонда и направлены на повышение уровня оснащенности приборами учета потребления энергетических ресурсов и энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов, повышения энергоэффективности систем освещения, лифтового хозяйства, сокращения потерь воды.

С участием средств Фонда в ходе реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов также выполняются работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

По итогам 2011 года запланированные показатели объема энергетических ресурсов и ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, которые потребляются (используются) в многоквартирных домах и расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энергетических ре-

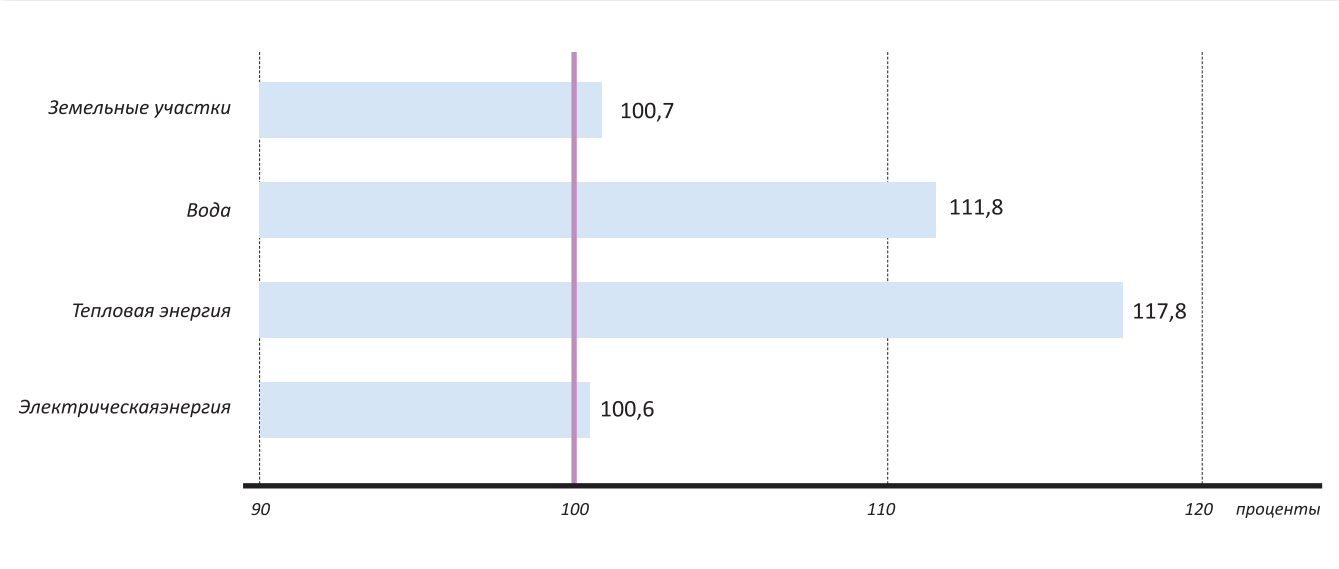


Рисунок 83. Достижение целевых значений показателей эффективности деятельности Фонда в части реализации преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства

сурсов, в общем объеме ресурсов, потребляемых (используемых) в многоквартирных домах, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда, достигнуты в полном объеме.

Реализация региональных адресных программ

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, успешно реализовавшие необходимые изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, продолжили в 2011 году проведение региональных адресных программ, способствующих созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

С использованием средств финансовой поддержки государственной корпорации в отчетном году проведен капитальный ремонт 9 490 многоквартирных домов общей площадью 29 396 тыс. кв. м, в которых проживают 1 505,1 тыс. человек.

Установленные целевые значения показателей, характеризующих реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, достигнуты в полном объеме, за исключением показателя площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. Данный факт объясняется тем, что площадь многоквартирных домов, которые были включены в эти программы в 2011 году, фактически оказалась меньшей прогнозируемой (значение данного показателя устанавливалось из расчета средней площади многоквартирного дома 2,9 тыс. кв. м). При этом число многоквартирных домов и численность проживающих в них граждан превысил установленный целевой уровень.

Реализация региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отчетном году сдерживалась наличием у 25 субъектов Российской Федерации таких незавершенных в предыдущие периоды программ, что исходя из Порядка перечисления средств Фонда не позволяло государственной корпорации профинансировать программы 2011 года в полном объеме. По-прежнему существуют проблемы с качеством планирования мероприятий таких программ, в недостаточной мере проводятся подготовительные мероприятия, разъяснительная работа с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, в недостаточном объеме осуществляется контроль за ходом реализации таких программ на региональном и муниципальном уровнях.

Несмотря на указанные обстоятельства в ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемых с участием средств Фонда, в 2011 году в новое жилье переселены 63 015 человек, общая площадь жилых помещений, из которых переселены граждане, составила 908,3 тыс. кв. м. В отчетном году полностью переселены граждане из 3 927 аварийных многоквартирных домов.

Показатель, отражающий долю граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в малоэтажные дома, от общего числа граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, значительно перевыполнен. Данный факт объясняется активным использованием субъектами Российской Федерации финансовой поддержки на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

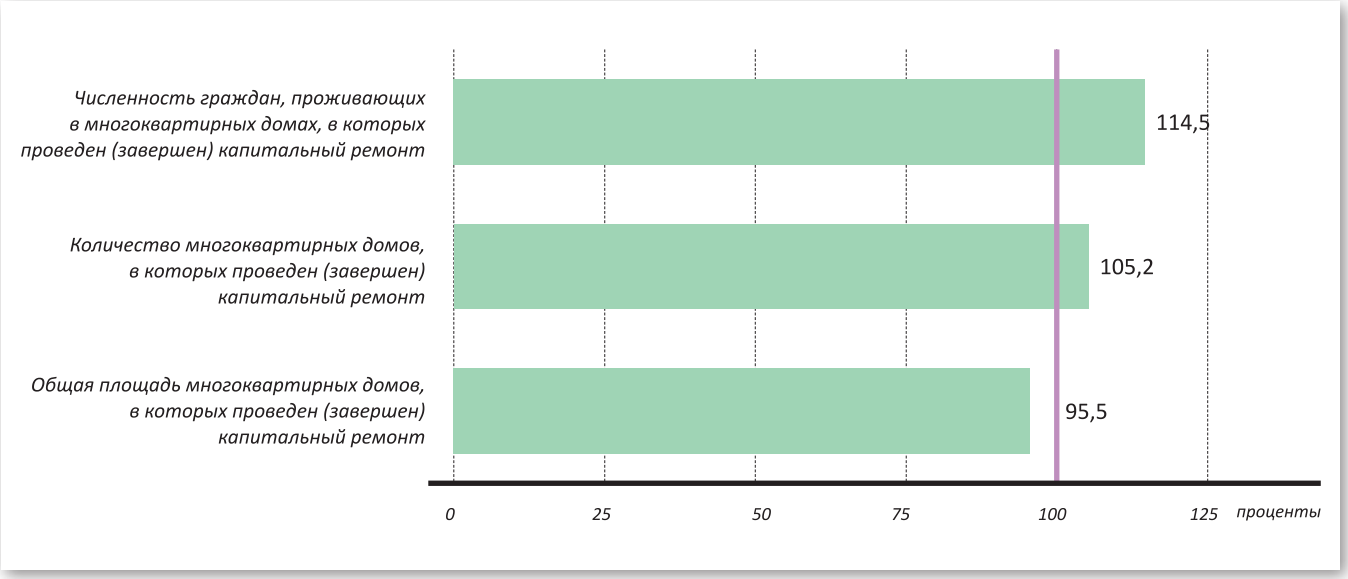


Рисунок 84. Достижение целевых показателей эффективности деятельности Фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов

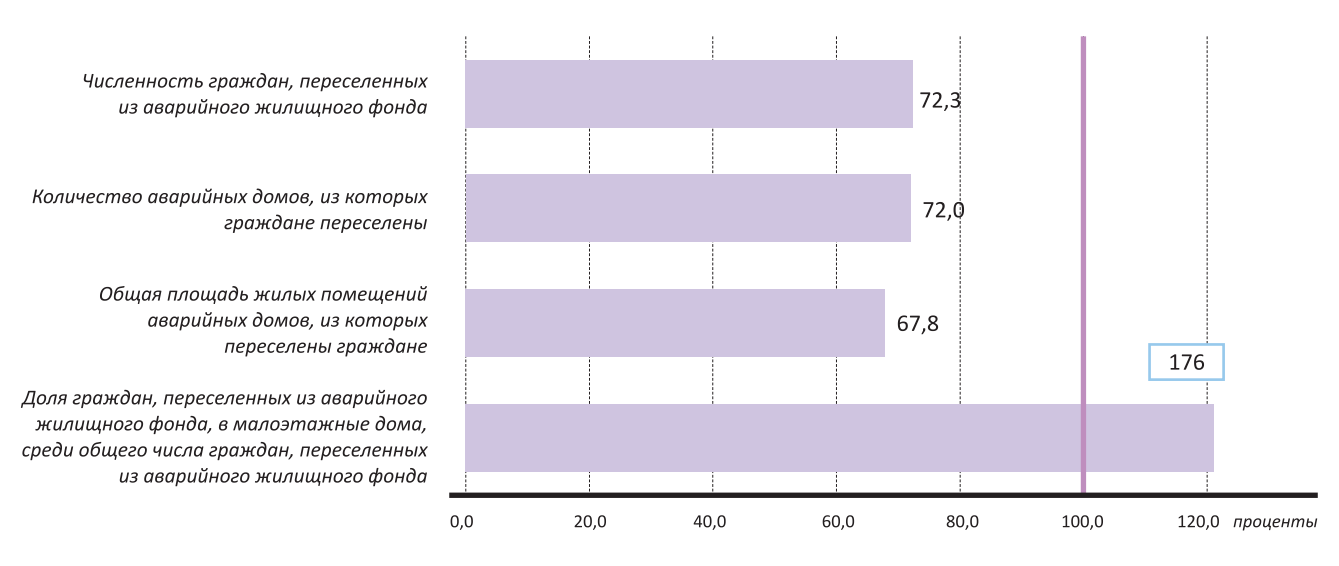


Рисунок 85. Достижение целевых показателей эффективности деятельности Фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

строительства, а также строительством малоэтажных домов в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, короткий цикл возведения которых позволяет быстрее решать проблему ликвидации аварийного жилья.

Таким образом, в 2011 году продолжилось активное участие субъектов Российской Федерации в программах Фонда. Это потребовало от субъектов Российской Федерации продолжения реализации мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Основные показатели, отражающие процесс реформирования отрасли, превышают целевые значения.

Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в целом успешно реализуются в полном объеме заявленных обязательств и в установленные сроки. Ввиду наличия в субъектах Российской Федерации незавершенных региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, профинансированных Фондом в предыдущие периоды, этапности проведения мероприятий, наличия временнуго разрыва между завершением строительных работ и фактическим переселением граждан в новое жилье многие субъекты Российской Федерации не смогли до конца 2011 года завершить реализацию региональных адресных программ, что не позволило в полном объеме достичь предусмотренных Стратегий Фонда параметров реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилья.

Перечень ключевых показателей эффективности деятельности Фонда с оценкой достижения целевых значений представлен в приложении.









ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

деятельности Фонда в 2012 году

Основные направления деятельности Фонда в 2012 году

Результаты, достигнутые Фондом за прошедший четырехлетний период, фактически являются итогом первого этапа деятельности Фонда, цели и задачи которого определены при принятии Федерального закона № 185–ФЗ.

На следующем этапе функционирования с учетом сложившихся итогов деятельность государственной корпорации будет направлена на решение следующих задач.

Исходя из имеющихся финансовых ресурсов будут расширены региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2012 году на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда планируется направить 21 858,7 млн. рублей. С учетом средств субъектов Российской Федерации и собственников жилых помещений в многоквартирных домах общий объем расходов составит 33 682,8 млн. рублей, что позволит провести капитальный ремонт 12 336 многоквартирных домов.

Необходимо отметить, что для поддержания жилья на уровне, соответствующем нормативным требованиям, еже годный объем капитального ремонта должен составлять не менее 4 процентов от общей площади жилищного фонда, что было достигнуто за период деятельности Фонда. Вместе с тем общее число многоквартирных домов в Российской Федерации, имеющих износ от 30 до 65 процентов[5], составляет 1,64 млн. единиц. С учетом числа многоквартирных домов, которые были включены в

5 По данным Росстата (по состоянию на 1 января 2011 года).

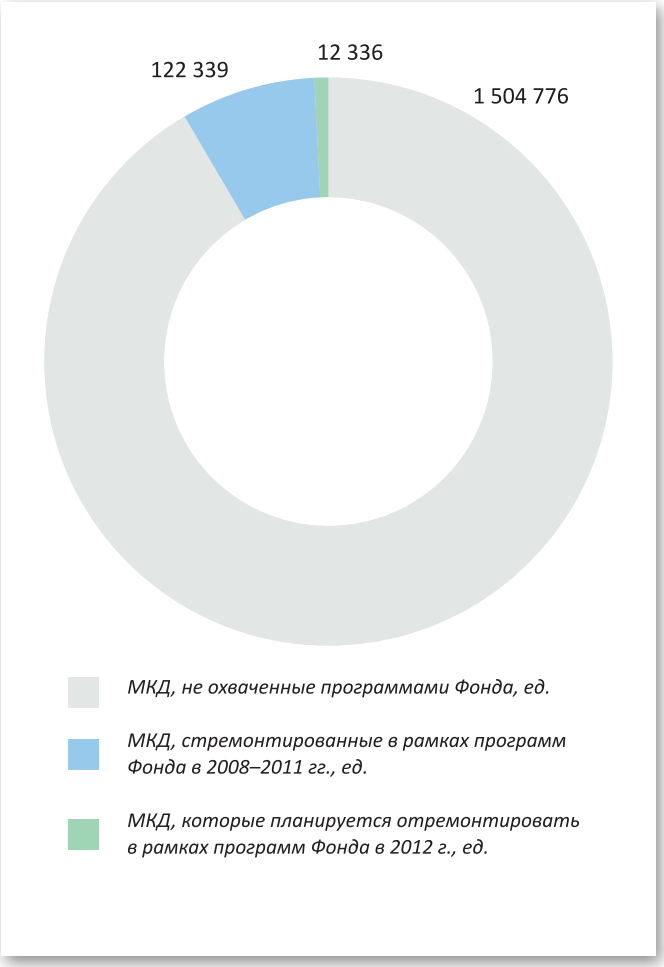


Рисунок 86. Оценка потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов в Российской Федерации

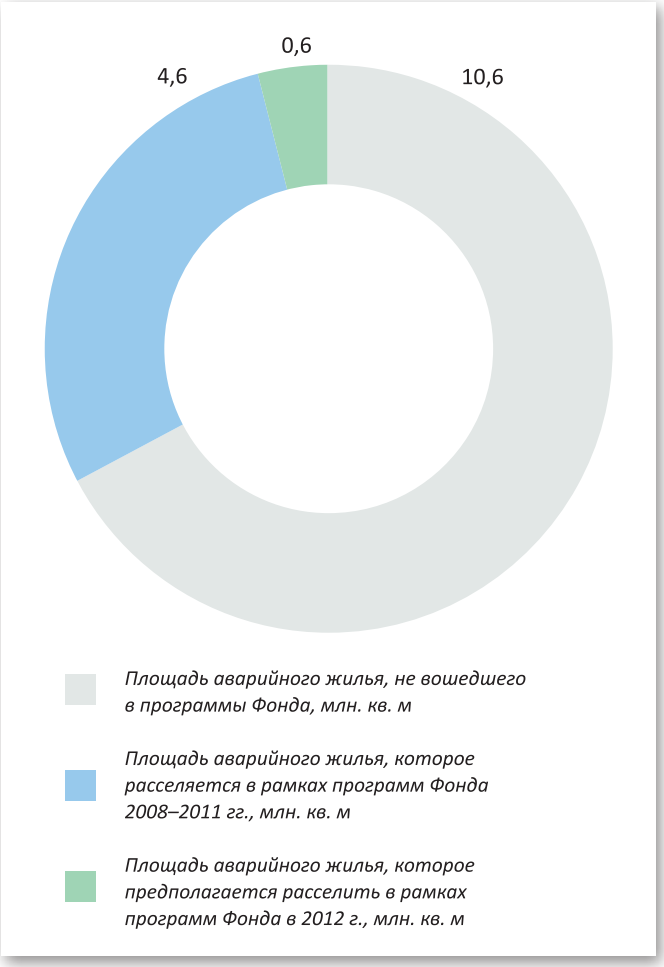


Рисунок 87. Оценка потребности расселения аварийного жилищного фонда в РоссийскойФедерации

программы Фонда в 2008–2011 годах, и сроков эксплуатации еще более 1,5 млн. многоквартирных домов требуют капитального ремонта.

Исходя из указанной выше потребности в обеспечении восстановления жилищного фонда государственной корпорацией в текущем году будет продолжена работа по созданию единых механизмов финансового обеспечения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов после прекращения деятельности Фонда.

В 2012 году за счет средств государственной корпорации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется направить 12 023,3 млн. рублей. С учетом средств субъектов Российской Федерации общий объем расходов составит 17 176,2 млн. рублей, что позволит переселить 39 760 граждан из 0,6 млн. кв. м аварийного жилищного фонда.

Таким образом, с использованием средств Фонда за период с 2008 по 2012 год будет ликвидировано 5 млн. кв. м аварийного жилищного фонда, более 340 250 граждан улучшат условия проживания. Вместе с тем, исходя из анализа состояния жилищного фонда в Российской Федерации, требуется переселить граждан еще из 10,6 млн. кв. м аварийных жилых домов.

Фонд продолжит работу, направленную на стимулирование использования технологий строительства малоэтажных жилых домов. Особое внимание будет уделено проектам строительства жилья (в том числе малоэтажного), реализуемым с использованием энергоэффективных технологий, материалов, возобновляемых источников энергии.

Важное направление деятельности Фонда также составит контроль за ходом исполнения субъектами Российской Федерации в полном объеме обязательств по проведению преобразований в сфере жилищно–коммунального хозяйства, в том числе за соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В связи с обсуждением вопроса о продлении деятельности Фонда в 2012 году будут подготовлены предложения об основных направлениях финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в предстоящий период и о механизмах предоставления такой поддержки. Также предстоит определить новые параметры проведения преобразований в сфере жилищно–коммунального хозяйства, предусмотрев, в частности, принятие субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов, направленных на создание постоянно действующей системы капитального ремонта многоквартирных домов; принятие субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями комплекса мер по привлечению инвестиций в коммунальную инфраструктуру; осуществление субъектами Российской Федерации необходимых мер по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета энергетических ресурсов; принятие субъектами Российской Федерации мер по сокращению задолженности за потребленные энергетические ресурсы.









ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Фонда за 2011 год

Аудиторское заключение по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности фонда за 2011 год

RSM Top-Audit

АКГ «РСМ Топ-Аудит»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел.: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@top-audit.ru
www.top-audit.ru

20.04.2012 г. №621-725

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2011 год

Наблюдательному совету Государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Аудируемое лицо:
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (сокращенное наименование **ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»**).
Место нахождения – юридический адрес: Россия, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр.3;
Место нахождения – фактический адрес: Россия, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр.3;
Основной государственный регистрационный номер – 1077799028251.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит".
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2011 год, другие приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках., отчет об использовании полученных средств за 2011 год и пояснительную записку.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Член RSM International международной аудиторской и консалтинговой ассоциации

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель Правления **Р.М.Лернер**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: **Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства**	по ОКПО	84018672		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид экономической деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды / Федеральная**	по ОКОПФ / ОКФС	82	12	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50а, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	53 814	31 988	583
	Основные средства	1130	8 457	8 186	7 622
	Финансовые вложения	1150	-	-	9 332 436
	Итого по разделу I	1100	62 271	40 174	9 340 641
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	304	29	145
1	Дебиторская задолженность	1230	91 170	48 562	3 222 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 499 999	11 311 016	59 777 002
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 190 130	19 533 081	4 754 321
	Прочие оборотные активы	1260	83	2 995	5 618
	Итого по разделу II	1200	44 781 686	30 895 683	67 759 582
	БАЛАНС	**1600**	**44 843 957**	**30 935 857**	**77 100 223**

3

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Целевое финансирование	1310	34 635 530	19 824 441	61 383 406
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 271	40 174	8 205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 860 763	10 739 150	15 699 044
	Итого по разделу III	1300	36 558 564	30 603 765	77 090 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	8 071 644	332 092	9 568
	Оценочные обязательства	1540	213 749	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 285 393	332 092	9 568
	БАЛАНС	1700	44 843 957	30 935 857	77 100 223

Руководитель (подпись) К.Г. Цицин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) К.В. Серганов (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	84018672		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	82	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2011г.	За 2010г.
2	Проценты к получению	2320	1 796 419	3 055 435
3	Прочие доходы	2340	1 296 775	21 478 745
4	Прочие расходы	2350	(1 314 950)	(21 625 415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 778 244	2 908 765
	Текущий налог на прибыль	2410	(14)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 778 230	2 908 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2011г.	За 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 778 230	2 908 765

Руководитель (подпись) К.Г. Цицин (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер (подпись) К.В. Серганов (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2011 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число,месяц,год)	31	12	2011
Организация Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	84018672		
Индетификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно правовая форма/форма собственности Фонды / Федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	82	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	Целевое финансирование	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Оценочные обязательства	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 года	3100	61 383 406	-	8 205	-	15 699 044	77 090 655
За 2010 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	52 023 585	-	32 332	-	3 060 290	55 116 207
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 908 765	2 908 765
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредстаенно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
имущественный взнос РФ	3217	44 000 000	-	-	-	-	44 000 000
добавочный капитал, сформированный за счет использования целевого финанансировая на приобретение ОС и	3218	-	-	32 332	-	-	32 332
прибыль направленная на возмещение расходов по обеспечению деятельности Фонда в 2010 году.	3219	170 662	-	-	-	-	170 662
прибыль направленная на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки регионам	3219а	7 849 521	-	-	-	151 525	8 001 046
целевые взносы	32195	3 402	-	-	-	-	3 402
Уменьшение капитала - всего:	3220	(93 582 550)	-	(363)	-	(8 020 184)	(101 603 097)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-		-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
добавочный капитал, сформированный за счет использования целевого финанансировая при выбытии ОС и НМА	3228	-	-	(363)	-	-	(363)
прибыль текущего года направленная на возмещение расходов по обеспечению деятельности Фонда в 2010 году	3229	-	-	-	-	(170 662)	(170 662)
прибыль направленная на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки регионам	3229а	(151 525)	-	-	-	(7 849 522)	(8 001 047)
целевое использование средств	32295	(93 431 025)	-	-	-	-	(93 431 025)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 года	3200	19 824 441	-	40 174	-	10 739 150	30 603 765

6

Наименование показателя	Код	Целевое финансирование	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 2011 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	47 495 504	-	30 980		1 616 296	49 142 780
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 564 480	1 564 480
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	
имущественный взнос РФ	3317	37 000 000	-	-	-	-	37 000 000
добавочный капитал, сформированный за счет использования целевого финанансировая на приобретение ОС и НМА	3318	-	-	30 980	-	-	30 980
прибыль направленная на возмещение расходов по обеспечению деятельности Фонда в 2011-2012 годах.	3319	1 358 935	-	-		-	1 358 935
прибыль направленная на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки регионам	3319а	9 135 748	-	-	-	51 816	9 187 564
целевой взнос	33196	821	-	-	-	-	821
Уменьшение капитала - всего:	3320	(32 684 415)	-	(8 883)	-	(10 494 683)	(43 187 981)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-		-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-		-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-		-		-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
добавочный капитал, сформированный за счет использования целевого финанансировая при выбытии ОС и НМА	3328	-	-	(8 883)	-	-	(8 883)
прибыль, направленная на возмещение расходов по обеспечению деятельности Фонда в 2011-2012 годах	3329	-	-	-	-	(1 358 935)	(1 358 935)
прибыль, направленная на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки регионам	3329а	(51 816)	-	-	-	(9 135 748)	(9 187 564)
целевое использование средств	33296	(32 632 599)	-	-	-	-	(32 632 599)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 год	3300	34 635 530	-	62 271	-	1 860 763	36 558 564

Руководитель (подпись) К.Г. Цицин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) К.В. Серганов (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 года

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	84018672		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Фонды / Федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	82	12	
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 328 210	46 535 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	37 000 000	44 000 494
возврат остатка неисп. ср-в по целевым программам	4115	321 012	1 304 925
прочие поступления	4119	7 198	1 229 716
Платежи - всего	4120	(25 214 419)	(95 632 759)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 581)	(163 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 955)	(265 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
налогов и страховых взносов	4125	(67 786)	(57 154)
целевое финансирование субъектов РФ	4126	(24 641 337)	(93 922 490)
прочие платежи	4129	(2 751)	(1 224 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 113 791	(49 097 624)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 785 840	146 945 355
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 300 730	21 457 035
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 752 082	6 189 331
возврат депозитов	4215	126 149 996	105 123 993
прочие поступления	4219	6 583 032	14 174 996
Платежи - всего	4220	(149 242 581)	(83 068 971)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(900 038)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
инвестирование денежных средств в депозиты	4225	(149 233 002)	(82 013 004)
прочие платежи	4229	(9 579)	(155 929)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 456 741)	63 876 384

8

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 342 950)	14 778 760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 533 081	4 754 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 190 131	19 533 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель (подпись) К.Г. Цицин (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер (подпись) К.В. Серганов (расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	84018672		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Фонды / Федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	82	12	
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	19 824 441	61 383 406
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	37 000 000	44 000 000
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	821	3 402
Прибыль от инвестирования временно свободных средств	6240	9 135 748	7 849 521
Прочие	6250	1 307 119	19 137
Всего поступило средств	6200	47 443 688	51 872 060
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(32 060 553)	(92 945 193)
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(569 984)	(482 826)
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(337 950)	(322 427)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(10 506)	(13 267)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(18 965)	(17 993)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(117)
прочие	6326	(202 563)	(129 022)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 062)	(3 006)
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(32 632 599)	(92 431 025)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	34 635 530	19 824 441

Руководитель (подпись) К.Б. Цицин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) К.В.Серганов (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2011 год

1. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) является некоммерческой организацией, созданной в форме государственной корпорации. Согласно статье 7 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

Статус Фонда определяется Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон), Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность некоммерческих организаций, с особенностями, установленными Федеральным законом.

Фонд зарегистрирован в качестве юридического лица 12 ноября 2007 года. Фонд имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, счета в Банке России; Фонд также вправе открывать в установленном законодательством Российской Федерации порядке иные банковские счета на территории Российской Федерации в российских кредитных организациях в целях инвестирования временно свободных средств в депозиты и депозитные сертификаты.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Фонда – 1077799028251.

Адрес местонахождения Фонда: город Москва, 109028, улица Земляной Вал, дом 50А, строение 3.

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в

11

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Цели деятельности Фонда определены статьей 4 Федерального закона и связаны с совершенствованием системы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, а именно:

- созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
- стимулированием реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
- формированием эффективных механизмов управления жилищным фондом,
- внедрением ресурсосберегающих технологий.

Способом реализации перечисленных целей является предоставление Фондом субъектам Российской Федерации и в установленных Федеральным законом случаях муниципальным образованиям целевых средств на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Органами управления Фонда являются наблюдательный совет Фонда, правление Фонда, генеральный директор Фонда.

Наблюдательный совет Фонда осуществляет контроль за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления Фонда решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом Федерального закона.

Список членов наблюдательного совета Фонда

1. Козак Дмитрий Николаевич	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – председатель наблюдательного совета
2. Басаргин Виктор Федорович	Министр регионального развития Российской Федерации – заместитель председателя наблюдательного совета
3. Глазычев Вячеслав Леонидович	Директор Института продвижения инноваций Общественной палаты Российской Федерации

12

4. Исаев Андрей Константинович	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
5. Никольский Михаил Эрикович	Управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура капитал»
6. Новиков Сергей Геннадьевич	Руководитель Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
7. Орлова Светлана Юрьевна	Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
8. Парфенов Валерий Павлович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
9. Попова Анна Владиславовна	Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
10. Плутник Александр Альбертович	Помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
11. Разворотнева Светлана Викторовна	Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по региональному развитию и местному самоуправлению
12. Садиков Алексей Львович	Начальник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации
13. Сиваев Сергей Борисович	Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города»
14. Силуанов Антон Германович	Министр финансов Российской Федерации
15. Чистяков Александр Николаевич	Президент общества с ограниченной ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент»

13

16. Цицин Константин Георгиевич	Генеральный директор Фонда
17. Шаккум Мартин Люцианович	Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Оперативное управление Фондом осуществляет коллегиальный орган – правление Фонда.

Список членов правления Фонда

1. Цицин Константин Георгиевич	председатель правления– генеральный директор
2. Адамович Геннадий Леонидович	директор Юридического департамента
3. Рурин Олег Станиславович	директор Департамента региональных программ
4. Сердюк Ольга Владимировна	заместитель генерального директора
5. Сучков Сергей Львович	заместитель генерального директора
6. Талалыкин Владимир Михайлович	первый заместитель генерального директора
7. Чепурина Анна Анатольевна	заместитель генерального директора

Руководство текущей деятельностью и функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Члены правления Фонда назначаются на должность и освобождаются от должности наблюдательным советом Фонда по представлению генерального директора.

Генеральный директор назначается на должность Правительством Российской Федерации.

Среднегодовая численность работников Фонда по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 146 человек.

14

На предоставление Фондом субъектам Российской Федерации и в установленных Федеральным законом случаях муниципальным образованиям целевых средств на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в отчетном периоде было направлено 32 388 656 тысяч рублей.

В 2011 году обеспечение деятельности Фонда осуществлялось за счет доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда на сумму 572 046 тысяч рублей. В 2011 году были внесены изменения в смету административно-хозяйственных расходов, в результате чего за счет прибыли был увеличен на 20 460 тысяч рублей источник покрытия административно-хозяйственных расходов Фонда 2011 года. Кроме того, в 2011 году за счет прибыли был сформирован источник покрытия административно-хозяйственных расходов Фонда на 2012 год в размере 735 073 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма неиспользованных средств (экономии) по смете 2011 года составила 51 816 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2011 года было осуществлено восстановление прибыли Фонда на сумму экономии. В соответствии с требованиями пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н, сформировано оценочное обязательство на сумму 213 749 тысяч рублей.

Направления использования средств, предназначенных для осуществления целей деятельности Фонда, приведены в приложении 1 к пояснительной записке.

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 27 января 2011 года на расчетный счет Фонда поступили денежные средства в размере 15 000 000 000 рублей, ранее перечисленные в бюджет Российской Федерации, а также имущественный взнос Российской Федерации в размере 22 000 000 000 рублей, поступивший 11 ноября 2011 года. Указанный взнос направляется Фондом на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки:

а) Приморскому краю – в размере 2 000 000 000 рублей на выполнение в рамках

15

подготовки к форуму «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

б) в субъекты Российской Федерации – в размере 10 000 000 000 рублей на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

в) в субъекты Российской Федерации – в размере 10 000 000 000 рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За отчетный период прибыль Фонда составила 1 569 384 тысяч рублей.

Отчет о результатах инвестирования временно свободных средств Фонда в 2011 году приведен в приложении 2 к пояснительной записке.

В 2011 году сумма возврата из внебюджетных фондов составила 1 403 тысяч рублей.

2. В соответствии с утвержденной правлением Фонда инвестиционной стратегией для управления инвестиционным портфелем применялась статичная стратегия инвестирования временно свободных средств, которая предполагает держать ценные бумаги (облигации) до их погашения или оферты.

Основными инвестиционными целями деятельности по инвестированию временно свободных средств Фонда (в порядке убывания приоритетов) являются:

• сохранность временно свободных средств Фонда в пределах установленных и неизрасходованных лимитов на предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в рамках долевого финансирования региональных адресных программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства (цель минимизации рыночных и операционных рисков);

• обеспечение соответствия денежных потоков, связанных с размещением временно свободных средств Фонда, обязательствам Фонда по предоставлению целевого финансирования в течение всего срока действия Фонда (цель управления дюрацией);

• обеспечение текущей ликвидности для выполнения полного и своевременного финансирования заявок субъектов Российской Федерации и финансирования административно-хозяйственных расходов Фонда на каждый момент времени (цель минимизации риска ликвидности);

16

• обеспечение рыночной ставки доходности с учетом экономических и финансовых рыночных условий, в том числе соответствующих рыночных циклов, и соответствующего уровня риска (цель доходности).

В отчетном периоде в связи с исполнением сторонами обязательств было прекращено действие договора доверительного управления временно свободными средствами со следующими организациями:

- ООО УК «Альфа-Капитал»;
- ООО УК «Атон-менеджмент»;
- ОАО «Банк Москвы»;
- ОАО «Газпромбанк»;
- ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции»;
- ООО «Управляющая компания "КапиталЪ"»;
- ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
- ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»;
- ЗАО УК «УралСиб».

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется, исходя из первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

При выбытии финансовых вложений по каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применяется один способ оценки. В течение отчетного периода способы оценки финансовых вложений не менялись.

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, нет.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

На начало отчетного периода стоимость арендованного основного средства (помещений, занимаемых Фондом по адресу месторасположения) составила 4 183 тысячи рублей, на конец отчетного периода – 4 328 тысяч рублей. Изменение стоимости произошло за счет увеличения площади арендуемых помещений.

14

В течение 2011 года Фонд осуществлял инвестирование временно свободных средств в депозиты коммерческих банков самостоятельно, а в ценные бумаги – через доверительных управляющих.

На начало и конец отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженностей с истекшим сроком требования нет.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты) – строка 1230[1] баланса – включает сумму начисленных процентов по договорам депозитного вклада, срок погашения которых менее 365 дней, в размере 72 038 тысяч рублей.

По строке 2320[2] формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год указаны проценты по депозитам в банках на сумму 1 783 195 тысяч рублей, 12 289 тысяч рублей – проценты по долговым финансовым вложениям, а также проценты, полученные доверительными управляющими по остаткам денежных средств на счетах в банках, на сумму 935 тысяч рублей.

По строке 2340[3] формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год в составе прочих доходов указаны доходы от выбытия ценных бумаг в сумме 1 296 730 тысяч рублей и иные доходы в сумме 45 тысяч рублей.

По строке 2350[4] формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год в составе прочих расходов указана себестоимость выбывших ценных бумаг в сумме 1 311 016 тысяч рублей и иные расходы в сумме 3 802 тысячи рублей, в том числе:

- вознаграждение доверительным управляющим – 3 686 тысяч рублей,
- расходы на депозитарий и услуги банков – 116 тысяч рублей,
- суммы налогов и сборов – 146 тысяч рублей.

По строке 3329б формы 3 «Отчет об изменениях капитала» за 2011 год сумма целевого использования средств скорректирована в сторону уменьшения на сумму возвратов от субъектов Российской Федерации неиспользованных средств в размере 321 012 тысяч рублей.

В связи с вступлением в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год приказа Минфина России от 2 февраля 2011 года № 11н «Об утверждении Положе-

18

ния по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» (зарегистрировано в Минюсте России 29 марта 2011 года, № 20336), с целью обеспечения сопоставления данных бухгалтерской отчетности в части отражения сумм депозитов до востребования в качестве денежных эквивалентов на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2009 года, в форму № 1 бухгалтерской отчетности внесены изменения (таблица 1)[5]:

Таблица 1.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Старое значение		Новое значение	
		на 31.12.2010 г.	на 31.12.2009 г.	на 31.12.2010 г.	на 31.12.2009 г.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 158 014	63 677 002	11 311 016	59 777 002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 686 083	854 321	19 533 081	4 754 321

По состоянию на 31 декабря 2011 года остаток денежных средств на депозитных счетах до востребования составил 17 474 227 тысяч рублей.

В связи с вступлением в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год приказа Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2011 года № 19691) Фондом внесены следующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2011 год:

«Пункт 3.23 Учетной политики изложить в следующей редакции:

«3.23. Порядок формирования оценочного обязательства

3.23.1. Оценочные обязательства отражаются на счете бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов». Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» ведется по отдельным видам резервов.

19

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам в бухгалтерском учете отражается сумма затрат по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции со счетами учета расчетов. Суммы таких расходов списываются в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» по соответствующему аналитическому признаку.

3.23.2. Фонд рассчитывает величину оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря года, предшествующего расчетному. Расчетным годом признается календарный год, на который произведен расчет оценочного обязательства. Расчетные значения резервов оценочных обязательств округляются до тысячи.

Контроль за определением размера оценочного обязательства осуществляется 1 раз в квартал по состоянию на последнюю отчетную дату квартала.

3.23.3. Величина оценочного обязательства определяется на основании расчета, являющегося приложением к учетной политике для целей бухгалтерского учета на соответствующий период.

3.23.4. Источником формирования оценочного обязательства на период: 2011 года является счет 86 «Целевое финансирование»; 2012 и последующие годы – нераспределенная прибыль отчетного периода.

Сумма неиспользованных резервов оценочных обязательств подлежит восстановлению на счете 86 «Целевое финансирование» в 2011 году и на счете 99 «Прибыли и убытки» в последующие периоды».

Согласно договору аренды величина оплаты потребляемых энергоресурсов входит в ставку арендной платы и отдельно в расчетных документах по оплате арендованного имущества не выделяется. Иных затрат на энергоресурсы нет.

Фонд на начало и конец отчетного периода выданных и (или) полученных обеспечений обязательств и платежей, а также резерва по сомнительным долгам не имеет.

Приложения:

1. Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджет) Фонда за 2011 год
2. Отчет об исполнении сметы административно-

20

хозяйственных расходов Фонда за 2010-2011 гг.

3. Отчет о результатах инвестирования временно свободных средств Фонда в 2011 году
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Фонда за 2011 г.

Генеральный директор К.Г. Цицин

Главный бухгалтер К.В. Серганов

24 февраля 2012 г.



Приложение 1

**Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджет)
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
за 2011 год**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Плановый показатель Сумма	Фактический показатель Сумма
Доходы:	**38 700 000**	**38 779 050**
Имущественный взнос Российской Федерации	37 000 000	37 000 000
От инвестирования (размещения) временно свободных средств	1 700 000	1 778 229
Прочие доходы	-	821
Расходы:	**31 338 129**	**32 960 702**
Объем предоставления финансовой поддержки субъектов Российской Федерации всего, в том числе:	30 714 267	32 388 656
1. По заявкам:	21 881 927	24 320 325
1.1. прошлых лет	284 642	310 275
1.2. текущего года	21 842 053	24 331 062
1.3. возврат средств в Фонд[1]	- 244 768	-321 012
2. Подлежит перечислению по принятым решениям правления Фонда[2]	8 832 340	8 068 331
Объем средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда (Смета)	623 862	572 046
Прочие расходы	-	-

Руководитель _____ **К.Г. Цицин** — **Главный бухгалтер** _____ **К.В. Серганов**

подпись — расшифровка подписи — подпись — расшифровка подписи

[1] Указывается отрицательное значение показателя

[2] В соответствии с п.п. 6,7 «Порядка перечисления средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, исходя из результатов реализации региональных адресных программ, а также иных обстоятельств, указанных в части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

12

ОТЧЕТ об исполнении
СМЕТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2010-2011 гг.

Единица измерения: **тыс. руб.**

№ п/п	Наименование статьи расходов	2011 год		2010 год	
		План	Исполнение	План	Исполнение
1	Заработная плата	228 684	217 321	209 000	199 204
2	Премии	90 500	87 459	109 132	96 942
3	Материальная помощь	7 400	4 583	8 000	7 249
4	Страховые взносы в территориальные фонды	30 600	28 588	20 700	19 032
5	Командировочные расходы	14 760	10 506	13 750	13 267
6	Приобретение ОС, оплата расходных мате - риалов и МБП	2 065	2 061	4 000	3 006
7	Транспортные услуги	18 600	16 858	17 200	15 322
8	Услуги связи	8 950	8 826	9 800	8 227
9	Оплата содержания помещений	2 800	2 107	2 700	2 125
10	Аренда	52 200	51 819	54 900	52 484
11	Прочие коммунальные услуги	650	585	610	546
12	Товары, работы, услуги по договорам	29 419	19 628	27 000	22 332
13	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	325	-	480	39
14	Информационное обеспечение	105 284	104 368	72 200	25 880
15	Прочие текущие расходы	6 300	5 313	13 680	2 003
16	Развитие информационных систем	21 000	11 045	33 950	12 428
17	Расходы будущих периодов	4 325	979	6 300	5 746
18	ИТОГО	623 862	572 046	603 402	485 832

Руководитель К.Г. Цицин
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер К.В. Серганов
подпись расшифровка подписи

24 февраля 2012 г.

13

Приложение 3

Отчет о результатах инвестирования временно свободных средств Фонда в 2011 году

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	по ОКПО	840018672		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736243140		
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	82	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За 2011 год	За 2010 год
Наименование показателя	код		
1	2	3	4
Проценты к получению всего, в т.ч.	060	1 796 419	3 055 435
Проценты по ценным бумагам	061	13 224	1 073 286
Проценты по депозитам в банках	062	1 783 195	1 982 149
Прочие доходы всего, в т.ч.	090	1 296 774	21 478 745
Доходы от выбытия ценных бумаг	091	1 296 729	21 457 035
Доходы от переоценки ценных бумаг	092	-	20 441
Иные доходы	093	45	1 269
Прочие расходы, всего, в т.ч.	100	(1 314 818)	(21 625 290)
Себестоимость выбывших ценных бумаг	101	(1 311 016)	(21 488 903)
Расходы от переоценки ценных бумаг	102	-	-
Иные расходы всего, в т.ч.:	103	(3802)	(136 387)
Расходы на продажу	103.1	-	(2 124)
Вознаграждение ДУ	103.2	(3686)	(128 616)
Расходы на страхование	103.3	-	(866)
Расходы на депозитарий	103.4	(108)	(4 737)
Брокерские и биржевые	103.5	-	(5)
Услуги банков	103.6	(8)	(39)
Прибыль отчетного периода	140	1 778 375	2 908 890

Руководитель (подпись) К.Г. Цицин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) К.В. Серганов (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.

24

Приложение 4
Таблица 1

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов
за 2011 год

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	31 988	53 814
2. Основные средства	1130	8 186	8 457
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	11 311 016	26 499 999
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	3 024	304
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	48 562	91 170
10. Денежные средства	1250	19 533 081	18 190 130
11. Прочие оборотные активы	1260	-	83
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		**30 935 857**	**44 843 957**
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	332 092	8 071 644
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	213 749
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		**332 092**	**8 285 393**
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		**30 603 765**	**36 558 564**

Руководитель _____ К.Г. Циник
подпись расшифровка подписи

24 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер _____ К.В. Серганов
подпись расшифровка подписи

25

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Таблица 2

Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	31 988	-	30 709	(8 883)	-	-	-	-	-	53 814	-
	5110	за 2010 г.	583	-	31 405	-	-	-	-	-	-	31 988	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2011 г.	31 988	-	30 709	(8 883)	-	-	-	-	-	53 814	-
	5113	за 2010 г.	583	-	31 405	-	-	-	-	-	-	31 988	-

Таблица 3

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Приложени

Таблица 4

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-

Таблица 5

Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

Основные средства

Таблица 7

Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	8 186	2 964	271	-	-	-	-	-	8 457	-
	5210	за 2010 г.	7 622	1 494	927	(363)	2 964	-	-	-	8 186	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	8 071	-	156	-	-	-	-	-	8 228	-
	5211	за 2010 г.	7 393	-	927	(248)	-	-	-	-	8 071	-
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	115	-	114	-	-	-	-	-	229	-
	5213	за 2010 г.	229	-	-	(114)	-	-	-	-	115	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 8

Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

Приложение 4

Таблица 9

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Таблица 10

Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 328	4 183	4 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Финансовые вложения

Таблица 11

Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	9 332 436	90 784	-	(9 332 436)	90 784	-	-	-	-
в том числе: Обл.суб.РФ	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	4 240 202	6 516	-	(4 240 202)	6 516	-	-	-	-
Обл.проч.эмит.	5303	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2010 г.	5 092 234	84 268	-	(5 092 234)	84 268	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	27 129 499	20 441	162 165 993	(145 321 266)	20 441	1 783 145	-	43 974 226	-
	5315	за 2010 г.	63 677 002	236 060	92 302 739	(128 850 242)	215 619	1 979 783	-	27 129 499	20 441
в том числе: Обл.суб.РФ	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	3 205 247	74 004	105 288	(3 310 535)	74 004	-	-	-	-
Обл.проч.эмит.	5307	за 2011 г.	1 282 501	20 441	-	1 282 501	20 441	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	9 341 756	162 056	303 461	(8 362 716)	141 615	-	-	1 282 501	20 441
Депозиты	5308	за 2011 г.	25 846 998	-	162 165 993	(144 038 765)	-	1 783 145	-	43 974 226	-
	5318	за 2010 г.	51 129 999	-	91 893 990	(117 176 991)	-	1 979 783	-	25 846 998	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	27 129 499	20 441	162 165 993	(145 321 266)	20 441	1 783 145	-	43 974 226	-
	5310	за 2010 г.	73 009 438	326 844	92 302 739	(138 182 678)	306 403	1 979 783	-	27 129 499	20 441

Таблица 12

Иное использование финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

30

Приложение

Запасы

Таблица 13

Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	29	-	1 892	(1 617)	-	-	X	304	-
	5420	за 2010 г.	145	-	1 726	(1 843)	-	-	X	29	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	29	-	1 892	(1617)	-	-	-	304	-
	5426	за 2010 г.	145	-	1726	(1843)	-	-	-	29	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31

Таблица 14

тыс. руб.

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

Приложение

Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 15

Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	48 562	-	136 967	1 783 145	1 877 490	14	-	-	91 170	-
	5530	за 2010 г.	3 222 496	-	180 315	3 053 068	6 407 317	-	-	-	48 562	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	18 893	-	78 660	-	83 294	-	-	-	14 259	-
	5532	за 2010 г.	18 287	-	95 030	-	94 424	-	-	-	18 893	-
Прочая	5513	за 2011 г.	27 782	-	12 240	1 783 145	1 747 982	14	-	-	75 171	-
	5533	за 2010 г.	3 202 536	-	25 280	3 053 068	6 253 101	-	-	-	27 782	-
Налоги	5514	за 2011 г.	1 888	-	46 066	-	46 214	-	-	-	1 740	-
	5534	за 2010 г.	1 673	-	60 005	-	59 791	-	-	-	1 887	-
Итого	5500	за 2011 г.	48 562	-	136 967	1 783 145	1 877 490	14	-	X	91 170	-
	5520	за 2010 г.	3 222 496	-	180 315	3 053 068	6 407 317	-	-	X	48 562	-

33

Таблица 16

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	332 092	24 869 032	-	32 608 581	3	-	8 071 644
	5580	за 2010 г.	9 568	96 871 037	-	97 193 562	-	-	332 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	490	221 757	-	222 131	3	-	867
	5581	за 2010 г.	1 368	150 533	-	149 655	-	-	490
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	383	461	-	99	-	-	21
	5583	за 2010 г.	56	153	-	480	-	-	383
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	331 219	24 646 814	-	32 386 351	-	-	8 070 755
	5586	за 2010 г.	8 144	96 720 351	-	97 043 427	-	-	331 219
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	332 092	24 869 032	-	32 608 581	3	X	8 071 644
	5570	за 2010 г.	9 568	96 871 037	-	97 193 562	-	X	332 092

341

Приложени

Таблица 17

Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

35

Таблица 18

Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

Приложени

Таблица 19

Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

37

Таблица 20

тыс. руб.

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	-	224 661	(10 912)	-	213 749
в том числе: оценочное обязательство по страх. взносам в Фонды	5701	-	19 996	(212)	-	19 784
оценочное обязательство по оплате отпуска	5702	-	204 665	(10 700)	-	193 965

38

Приложени

Таблица 21

Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Таблица 22

Государственная помощь

тыс. руб.

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

39

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Информация о заявках субъектов Российской Федерации на получение финансовой поддержки для реализации региональных адресных программ в 2011 году

Информация о заявках субъектов Российской Федерации на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Объем предоставленных средств	Неизрасходованные средства Фонда	Зачет средств Фонда	программа капитального ремонта многоквартирных домов						программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда							
								стоимость капитального ремонта (млн. руб.)			многоквартирные дома			стоимость переселения (млн. руб.)				многоквартирные дома			
								всего	в том числе:		количество	общая площадь МКД	численность жителей	всего	в том числе:			количество	общая площадь помещений	Количество помещений	численность жителей
									из средств Фонда	в порядке софинансирования					из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования				
				ед.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	тыс. чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	ед.	чел.
1	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.03.2011	03.03.2011	11	108,80	0,00	0,00	159,43	108,80	50,63	53	220,01	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	05.03.2011	09.03.2011	30	691,61	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	602,02	338,46	202,45	61,11	113	22,48	601	1 561
3	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	11.04.2011	14.04.2011	3	21,74	0,00	0,00	30,01	21,74	8,27	8	23,02	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
4	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.04.2011	22.04.2011	4	39,02	0,00	0,00	72,66	39,02	33,64	14	29,39	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	25.04.2011	06.05.2011	12	976,02	0,28	4,69	398,90	275,54	123,37	75	410,06	17,08	1 153,18	704,89	257,29	191,00	107	37,17	887	2 367
6	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.04.2011	29.04.2011	22	164,56	0,00	0,00	214,32	123,37	90,96	114	281,51	10,57	67,76	41,19	21,92	4,65	6	2,93	69	196
7	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.05.2011	12.05.2011	9	309,37	1,39	0,00	187,58	88,73	98,85	131	498,51	17,54	348,49	219,24	66,56	62,68	44	12,27	355	919
8	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	06.05.2011	24.05.2011	41	272,50	0,00	0,00	3 758,34	272,50	3 485,84	756	3 732,43	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
9	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.05.2011	17.05.2011	4	253,30	1,17	27,40	139,61	98,77	40,84	36	287,01	12,79	288,58	180,76	80,71	27,10	26	8,76	228	656
10	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.05.2011	12.05.2011	26	712,07	1,19	0,27	329,63	201,05	128,58	143	496,97	21,90	920,88	510,11	269,95	140,82	132	30,68	794	1 868
11	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	11.05.2011	12.05.2011	5	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	272,57	206,12	66,45	0,00	37	11,70	347	812
12	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	12.05.2011	17.05.2011	4	76,25	0,00	1,75	30,55	21,74	8,81	7	13,59	0,56	85,50	56,26	17,70	11,53	10	2,47	71	187
13	ГОРОД САНКТ–ПЕТЕРБУРГ	13.05.2011	17.05.2011	1	309,17	4,96	104,85	866,89	409,06	457,83	377	2 306,14	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
14	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2011	17.05.2011	3	299,81	2,24	12,09	453,54	309,66	143,88	95	285,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2011	24.05.2011	32	310,31	1,00	0,91	147,88	106,47	41,41	52	69,22	2,74	323,71	203,76	60,86	59,09	49	9,87	292	701
16	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	23.05.2011	24.05.2011	16	220,13	0,17	0,45	162,12	96,04	66,08	70	128,53	4,91	244,45	124,37	75,07	45,02	25	7,20	204	562
17	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	23.05.2011	31.05.2011	2	96,33	0,26	11,29	70,82	33,64	37,18	12	55,09	2,58	339,84	73,72	73,72	192,40	33	5,42	111	343
18	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	31.05.2011	2	58,31	0,40	0,00	81,85	57,91	23,94	56	141,61	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
19	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.05.2011	31.05.2011	5	128,75	4,61	6,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	286,94	130,26	70,48	86,20	21	6,69	190	445
20	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	25.05.2011	03.06.2011	7	181,08	1,64	12,44	78,44	51,11	27,33	37	80,34	3,67	223,31	140,77	46,92	35,62	44	7,46	210	608
21	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.05.2011	03.06.2011	24	516,93	4,50	20,94	230,01	148,70	81,31	153	361,12	13,43	651,90	384,66	171,29	95,95	77	21,02	512	1 215
22	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	30.05.2011	31.05.2011	16	189,80	0,00	0,00	266,02	189,80	76,23	88	152,34	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
23	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	31.05.2011	03.06.2011	5	334,60	6,65	133,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	914,94	461,91	255,45	197,59	63	25,39	525	1 518
24	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	10.06.2011	18	213,63	0,00	0,00	73,18	53,02	20,16	51	42,89	1,73	207,76	160,61	47,14	0,00	33	8,60	266	693
25	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	08.06.2011	3	80,76	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,64	71,38	31,40	13,87	20	3,81	106	240
26	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	08.06.2011	7	215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	314,22	215,07	71,92	27,23	42	11,83	305	692

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Объем предоставленных средств	Неизрасходованные средства Фонда	Зачет средств Фонда	программа капитального ремонта многоквартирных домов						программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда							
								стоимость капитального ремонта (млн. руб.)			многоквартирные дома			стоимость переселения (млн. руб.)				многоквартирные дома			
								всего	в том числе:		количество	общая площадь МКД	численность жителей	всего	в том числе:			количество	общая площадь помещений	Количество помещений	численность жителей
									из средств Фонда	в порядке софинансирования					из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования				
				ед.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	тыс. чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	ед.	чел.
27	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	06.06.2011	08.06.2011	22	357,37	0,00	0,00	160,81	101,20	59,61	74	257,47	11,39	358,89	256,17	102,72	0,00	72	13,52	441	1 223
28	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.06.2011	08.06.2011	2	67,69	0,00	0,00	101,79	67,69	34,10	15	67,10	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
29	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.06.2011	22.06.2011	17	354,70	0,00	3,98	287,63	182,49	105,14	63	155,08	4,52	350,07	176,19	84,20	89,68	24	8,70	250	661
30	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.06.2011	16.06.2011	42	322,19	0,00	1,13	423,13	259,87	163,26	312	980,17	37,47	175,17	63,45	30,27	81,46	9	3,12	108	245
31	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	20.06.2011	22.06.2011	5	77,01	0,00	1,24	31,26	22,97	8,28	15	30,57	1,47	70,35	55,28	15,08	0,00	7	2,75	87	363
32	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	21.06.2011	22.06.2011	26	66,14	0,00	0,00	99,20	66,14	33,06	54	55,07	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
33	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	21.06.2011	22.06.2011	20	91,38	0,00	0,00	161,23	91,38	69,85	36	126,12	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
34	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.06.2011	08.07.2011	6	66,15	0,00	0,00	111,00	66,15	44,85	23	30,52	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
35	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	23.06.2011	28.06.2011	5	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	144,32	84,32	35,83	24,17	20	4,63	118	314
36	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.06.2011	08.07.2011	22	727,33	15,99	18,81	297,31	205,74	91,58	278	891,98	31,08	934,15	524,42	195,54	214,19	75	32,26	821	2 036
37	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.06.2011	28.06.2011	12	62,09	0,00	0,00	90,95	62,09	28,86	36	86,62	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
38	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	01.07.2011	7	103,40	4,72	0,00	190,29	98,68	91,60	76	85,85	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
39	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	28.06.2011	33	103,48	0,51	0,00	180,48	102,97	77,52	95	176,62	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
40	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	01.07.2011	5	102,81	0,00	0,00	170,81	102,81	68,00	81	155,93	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
41	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	28.06.2011	12	374,79	4,24	0,00	265,52	176,07	89,45	111	293,47	9,19	276,45	194,48	81,97	0,00	21	9,25	249	664
42	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	28.06.2011	2	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80,67	55,28	17,20	8,20	6	3,39	90	254
43	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2011	08.07.2011	10	101,80	0,97	1,14	147,70	101,97	45,74	38	63,41	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
44	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	01.07.2011	05.07.2011	2	21,74	0,00	0,06	45,87	21,79	24,08	3	8,48	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
45	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.07.2011	08.07.2011	39	336,28	1,29	24,30	301,45	210,57	90,88	165	440,52	17,07	239,93	148,72	53,54	37,66	29	8,13	214	499
46	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	05.07.2011	05.07.2011	6	35,42	0,00	0,00	49,90	35,42	14,48	30	71,82	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
47	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.07.2011	08.07.2011	5	57,51	0,00	0,00	92,80	57,51	35,29	36	121,04	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
48	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	06.07.2011	08.07.2011	14	91,61	6,67	0,00	38,93	26,00	12,92	21	37,09	1,41	154,10	58,93	21,62	73,55	17	2,72	74	174
49	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.07.2011	14.07.2011	15	482,59	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	909,77	541,59	219,39	148,79	116	32,36	853	2 261
50	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.07.2011	14.07.2011	25	256,37	4,92	3,70	377,38	255,15	122,24	186	618,55	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
51	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	11.07.2011	14.07.2011	5	98,04	0,00	0,00	139,50	98,04	41,46	36	158,10	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
52	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.07.2011	19.07.2011	9	324,16	1,07	0,00	545,63	323,09	222,54	125	259,62	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
53	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	12.07.2011	14.07.2011	10	62,60	0,00	0,00	89,14	62,60	26,55	51	101,87	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
54	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	12.07.2011	14.07.2011	4	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,63	159,20	51,76	0,68	51	9,13	189	545
55	РЕСПУБЛИКА КОМИ	13.07.2011	14.07.2011	15	274,72	0,00	46,07	140,80	77,66	63,13	75	157,40	6,99	344,46	243,13	101,33	0,00	58	12,34	279	722
56	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	13.07.2011	14.07.2011	36	621,57	0,00	0,91	249,01	175,80	73,21	153	412,58	13,90	594,25	446,68	144,17	3,41	67	23,54	792	1 822
57	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	14.07.2011	14.07.2011	10	403,47	25,38	0,00	205,86	149,49	56,38	42	90,18	3,85	431,42	228,60	65,89	136,93	20	12,69	343	1 125
58	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	19.07.2011	24	81,62	2,15	38,44	171,75	117,90	53,85	82	176,07	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
59	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.07.2011	26.07.2011	23	145,73	0,00	0,00	231,05	145,73	85,31	113	196,01	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Объем предоставленных средств	Неизрасходованные средства Фонда	Зачет средств Фонда	программа капитального ремонта многоквартирных домов						программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда							
								стоимость капитального ремонта (млн. руб.)			многоквартирные дома			стоимость переселения (млн. руб.)				многоквартирные дома			
								всего	в том числе:		количество	общая площадь МКД	численность жителей	всего	в том числе:			количество	общая площадь помещений	Количество помещений	численность жителей
									из средств Фонда	в порядке софинансирования					из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования				
				ед.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	тыс. чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	ед.	чел.
60	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.07.2011	19.07.2011	16	84,57	0,00	0,00	118,79	84,57	34,22	40	77,71	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
61	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	15.07.2011	19.07.2011	8	211,56	3,59	0,00	419,06	207,97	211,09	65	587,91	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
62	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	21.07.2011	26.07.2011	6	92,65	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	205,12	86,97	61,98	56,17	24	5,68	147	416
63	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.07.2011	26.07.2011	9	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	389,49	257,92	71,06	60,51	52	11,46	308	718
64	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.07.2011	01.08.2011	16	225,47	0,21	0,00	90,30	64,32	25,98	87	113,12	4,22	240,18	160,94	53,71	25,53	32	7,78	210	508
65	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.07.2011	01.08.2011	12	95,65	0,75	0,00	136,88	94,90	41,97	35	99,64	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
66	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	27.07.2011	01.08.2011	3	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	125,91	90,07	30,49	5,35	22	6,20	149	426
67	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	29.07.2011	04.08.2011	8	64,59	0,00	0,00	175,32	64,59	110,73	57	130,97	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
68	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.08.2011	04.08.2011	21	223,23	0,21	0,00	135,09	91,65	43,44	71	173,97	7,15	220,56	131,37	44,87	44,32	20	6,08	169	425
69	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.08.2011	04.08.2011	18	664,54	1,03	36,25	271,26	187,56	83,70	150	504,09	14,63	845,32	512,20	175,50	157,61	63	23,41	548	1 507
70	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.08.2011	04.08.2011	5	232,51	0,00	26,21	439,96	258,72	181,24	65	269,16	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
71	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	09.08.2011	2	158,89	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	318,93	197,42	121,51	0,00	35	10,63	278	826
72	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	09.08.2011	18	448,75	0,00	0,00	525,05	327,68	197,37	137	384,15	13,84	320,48	121,07	56,43	142,98	29	5,92	197	474
73	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2011	09.08.2011	18	365,11	0,01	3,47	144,51	104,61	39,90	143	336,83	11,67	367,83	263,96	79,96	23,90	47	12,95	325	759
74	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	09.08.2011	40	515,02	0,15	34,98	326,81	199,17	127,63	179	462,43	18,64	554,15	350,68	197,27	6,21	107	22,46	624	1 748
75	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.08.2011	15.08.2011	10	81,36	0,00	0,00	123,54	81,36	42,18	95	169,31	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
76	НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	12.08.2011	15.08.2011	2	77,01	1,01	7,67	176,14	83,67	92,48	55	53,14	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
77	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	12.08.2011	15.08.2011	5	60,51	0,00	1,11	85,66	61,62	24,04	56	113,75	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
78	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.08.2011	14.09.2011	11	85,89	0,00	0,00	119,97	85,89	34,08	131	287,54	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
79	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	16.08.2011	22.08.2011	4	164,27	0,04	13,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	418,27	177,37	46,48	194,41	23	9,12	221	731
80	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	17.08.2011	22.08.2011	2	55,28	0,00	0,00	116,37	55,28	61,09	44	104,02	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
81	ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	18.08.2011	22.08.2011	1	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 460,73	470,76	470,76	519,21	130	31,38	1 072	2 015
82	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ	18.08.2011	22.08.2011	20	332,57	0,06	1,71	165,20	93,86	71,33	98	119,40	5,29	373,21	240,36	80,29	52,57	119	13,30	424	1 084
83	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.08.2011	25.08.2011	10	10,35	0,00	0,00	14,29	10,35	3,94	12	9,20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
84	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	25.08.2011	19	331,27	0,00	0,00	138,72	99,55	39,17	83	127,34	5,14	401,57	231,72	75,03	94,81	32	13,04	335	761
85	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	25.08.2011	25.08.2011	2	77,01	0,00	0,00	30,09	21,74	8,35	5	10,59	0,74	73,67	55,28	17,42	0,97	6	3,79	84	356
86	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.09.2011	08.09.2011	41	138,75	0,05	0,00	306,68	138,70	167,99	179	471,73	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
87	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	12.09.2011	14.09.2011	15	135,67	0,00	1,42	254,05	137,08	116,96	78	301,56	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
88	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	14.09.2011	22.09.2011	2	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	169,88	130,10	39,79	0,00	26	5,66	146	380
89	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.09.2011	05.10.2011	8	67,59	0,00	0,00	104,07	67,59	36,48	38	246,19	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
90	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	26.09.2011	27.09.2011	5	77,01	0,00	0,00	31,08	21,74	9,34	14	25,95	1,03	78,26	55,28	22,99	0,00	8	4,25	113	391
91	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.09.2011	04.10.2011	2	42,05	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	63,72	44,83	18,89	0,00	11	2,58	68	191
92	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	06.10.2011	28.10.2011	6	50,90	0,00	0,00	69,60	50,90	18,70	28	138,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Объем предоставленных средств	Неизрасходованные средства Фонда	Зачет средств Фонда	программа капитального ремонта многоквартирных домов						программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда							
								стоимость капитального ремонта (млн. руб.)			многоквартирные дома			стоимость переселения (млн. руб.)				многоквартирные дома			
								всего	в том числе:		количество	общая площадь МКД	численность жителей	всего	в том числе:			количество	общая площадь помещений	Количество помещений	численность жителей
									из средств Фонда	в порядке софинансирования					из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования				
				ед.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	тыс. чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс. кв. м.	ед.	чел.
93	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	14.10.2011	14.11.2011	2	36,72	0,00	1,74	53,10	38,46	14,64	7	88,52	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
94	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	18.10.2011	24.10.2011	3	92,34	0,00	0,78	196,06	93,13	102,93	15	63,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
95	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.10.2011	31.10.2011	15	462,67	0,00	0,00	191,29	130,60	60,70	126	322,89	14,43	511,42	332,07	129,97	49,37	80	16,24	429	989
96	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.11.2011	23.11.2011	4	160,58	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	473,03	187,08	88,36	197,59	40	9,32	264	719
97	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	25.11.2011	30.11.2011	5	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 136,53	519,52	242,13	374,89	75	25,39	746	2 135
98	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.12.2011	19.12.2011	4	95,97	0,00	29,26	265,55	125,23	140,32	48	131,48	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
99	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	12.12.2011	14.12.2011	21	352,72	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	579,42	351,57	208,14	19,71	105	24,00	595	1 524
100	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	13.12.2011	14.12.2011	8	51,49	0,00	3,17	77,35	54,66	22,69	34	78,98	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
101	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.12.2011	23.12.2011	11	206,86	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	478,13	292,14	114,35	71,65	82	14,35	349	874
102	КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	19.12.2011	20.12.2011	6	65,67	0,00	0,00	39,88	28,57	11,31	26	55,28	2,17	49,19	37,10	12,10	0,00	12	3,37	77	323
103	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.12.2011	23.12.2011	53	327,00	0,00	0,00	688,42	327,00	361,42	249	1 065,38	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
104	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.12.2011	29.12.2011	4	554,84	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	873,48	553,81	216,76	102,91	74	27,38	698	1 623
105	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	26.12.2011	27.12.2011	7	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	776,30	234,80	234,80	306,69	43	15,65	321	978
106	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	27.12.2011	27.12.2011	3	6,06	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	74,25	34,78	11,21	28,25	5	1,97	71	183
107	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	2	38,44	0,00	0,00	55,99	38,44	17,56	18	100,94	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
108	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	4	251,06	0,00	0,00	185,44	124,77	60,67	66	205,26	7,12	346,26	126,29	47,28	172,69	21	5,79	142	391
109	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	2	241,33	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	755,85	244,06	244,06	267,72	44	16,27	378	1 114
110	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	29.12.2011	29.12.2011	8	112,99	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	314,61	147,32	81,05	86,24	35	8,33	225	684
ИТОГО по заявкам 2011 года:				**1 329**	**23 486,50**	**475,90**	**915,75**	**19 421,54**	**9 827,53**	**9 594,00**	**7 287**	**23 350,89**	**898,66**	**25 634,09**	**14 098,82**	**6 402,42**	**5 132,85**	**2 876**	**778,05**	**20 694**	**53 744**

Информация о заявках субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденная Минрегионом России	программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда								неизрасходованные средства Фонда	Использование неизрасходованных средств Фонда	в т.ч. на обеспечение земельных участков
						стоимость переселения (млн. руб.)				переселяемые многоквартирные дома						
						всего	в том числе:			количество	общая площадь жилых помещений	количество жилых помещений в МКД	численность жителей			
							из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования							
				ед.	тыс.руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс.кв. м.	ед.	чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.03.2011	09.03.2011	5	26,25	382,68	276,69	94,41	11,58	58	14,14	421	1 078	0,00	0,08	0,00
2	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.04.2011	07.04.2011	5	30,00	231,85	157,71	58,81	15,33	25	7,22	177	425	0,00	1,31	0,00
3	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.04.2011	22.04.2011	4	26,90	260,14	178,72	61,24	20,19	44	8,97	242	623	1,05	31,47	0,00
4	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.05.2011	12.05.2011	16	27,00	438,46	269,88	143,60	24,98	60	16,84	459	1 105	0,00	0,00	2,66
5	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	11.05.2011	12.05.2011	10	23,30	403,94	269,09	86,75	48,09	48	15,42	419	1 020	2,55	0,00	0,00
6	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.05.2011	20.05.2011	3	27,00	99,80	69,31	30,49	0,00	15	3,70	104	236	0,00	3,81	0,00
7	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	17.05.2011	20.05.2011	1	30,00	49,81	14,74	14,74	20,34	4	0,98	21	67	0,14	0,00	0,00
8	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2011	20.05.2011	4	0,00	76,05	57,24	17,10	1,72	9	2,77	71	164	0,00	0,00	0,00
9	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.05.2011	24.05.2011	6	30,00	253,32	143,36	77,95	32,01	24	7,43	205	463	0,94	10,08	0,00
10	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	23.05.2011	24.05.2011	16	27,70	192,35	118,96	71,80	1,58	48	7,07	183	442	0,86	0,00	0,00
11	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.05.2011	08.06.2011	19	27,50	530,02	370,40	147,73	11,90	154	18,85	435	1 183	0,22	0,14	0,00
12	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	31.05.2011	03.06.2011	8	30,00	472,53	206,67	169,10	96,76	60	12,53	368	775	0,00	0,00	0,00
13	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	31.05.2011	03.06.2011	10	30,00	231,16	110,64	54,29	66,22	25	5,95	145	392	7,70	7,56	0,00
14	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.06.2011	16.06.2011	13	30,00	420,39	281,92	131,33	7,13	84	13,86	378	920	0,39	0,00	0,00
15	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.06.2011	22.06.2011	12	24,95	277,85	193,31	63,21	21,33	39	10,28	263	561	0,00	0,00	0,00
16	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	21.06.2011	22.06.2011	1	27,35	340,13	232,39	78,38	29,35	69	11,36	253	593	0,00	0,00	0,00
17	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	21.06.2011	22.06.2011	1	27,35	13,27	9,36	3,91	0,00	1	0,49	8	26	0,00	9,36	0,00
18	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2011	28.06.2011	2	0,00	138,28	95,93	40,43	1,92	18	4,60	106	307	0,74	88,18	0,00
19	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	24.06.2011	28.06.2011	10	26,50	129,48	84,13	35,75	9,61	26	4,68	103	274	0,00	0,25	0,00
20	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	14.07.2011	7	30,00	930,42	545,69	315,70	69,03	137	29,28	846	1 992	0,00	0,00	0,00
21	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	28.06.2011	9	0,00	400,44	261,04	139,39	0,00	83	14,03	362	948	0,00	0,42	0,00
22	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2011	05.07.2011	9	28,10	216,74	146,72	56,32	13,70	19	7,23	164	419	0,00	1,50	0,00
23	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.07.2011	14.07.2011	7	26,40	263,51	172,02	69,68	21,81	34	9,53	298	693	0,00	2,77	0,00
24	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	11.07.2011	14.07.2011	4	30,00	330,24	248,61	81,64	0,00	32	11,01	271	636	0,00	0,00	0,00
25	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.07.2011	14.07.2011	10	24,95	554,91	354,71	127,69	72,51	71	19,38	548	1 107	0,62	0,18	0,00
26	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	29.07.2011	01.08.2011	5	28,60	40,01	25,81	14,21	0,00	9	1,61	42	120	0,00	0,00	0,00
27	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	03.08.2011	04.08.2011	11	30,00	313,19	193,06	90,01	30,12	25	9,44	238	617	1,44	1,96	0,00
28	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	09.08.2011	20	30,00	700,63	433,69	266,94	0,00	94	23,35	542	1 315	0,00	1,27	0,00
29	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.08.2011	08.09.2011	33	0,00	955,24	557,74	266,10	131,40	143	27,60	787	1 618	20,41	9,37	0,00
30	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	15.08.2011	31.08.2011	8	0,00	205,25	153,88	47,82	3,54	29	8,82	204	593	0,00	3,77	0,00
31	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	25.08.2011	7	0,00	298,20	183,33	114,87	0,00	35	9,94	256	673	13,81	31,68	0,00
32	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.09.2011	08.09.2011	6	0,00	134,85	100,52	34,33	0,00	20	4,67	126	274	0,93	0,00	0,00
33	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	12.09.2011	14.09.2011	2	0,00	539,25	348,62	122,74	67,89	57	15,71	414	1 053	0,00	0,00	0,00
34	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.09.2011	22.09.2011	4	0,00	251,04	171,61	79,43	0,00	36	9,96	204	416	0,00	0,00	0,00
35	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.09.2011	27.09.2011	1	0,00	15,72	8,51	3,79	3,42	5	0,46	12	27	0,00	5,04	0,00
36	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.09.2011	04.10.2011	2	0,00	154,60	108,78	45,82	0,00	18	6,26	126	456	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъекты Российской Федерации в порядке поступления заявок	Дата регистрации заявки	Дата принятия решения Правлением Фонда	Количество муниципальных образований, включенных в заявку	Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденная Минрегионом России	программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда								неизрасходованные средства Фонда	Использование неизрасходованных средств Фонда	в т.ч. на обеспечение земельных участков
						стоимость переселения (млн. руб.)				переселяемые многоквартирные дома						
						всего	в том числе:			количество	общая площадь жилых помещений	количество жилых помещений в МКД	численность жителей			
							из средств Фонда	в порядке софинансирования	дополнит. источники финансирования							
				ед.	тыс.руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	ед.	тыс.кв. м.	ед.	чел.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
37	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.10.2011	11.10.2011	3	0,00	176,86	109,02	33,68	34,16	31	5,49	153	367	0,00	8,94	0,00
38	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	06.10.2011	11.10.2011	7	0,00	156,37	120,37	36,00	0,00	15	6,31	147	424	3,21	0,00	0,00
39	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.10.2011	11.10.2011	1	0,00	182,02	99,23	76,18	6,61	51	5,85	167	494	0,00	0,00	0,00
40	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	14.10.2011	14.10.2011	7	0,00	200,57	152,89	47,67	0,00	23	8,46	176	403	0,00	60,28	0,00
41	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.10.2011	28.10.2011	1	0,00	21,65	13,91	4,15	3,58	2	0,67	20	37	0,00	1,57	0,00
42	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.11.2011	07.11.2011	5	0,00	77,99	49,23	16,85	11,91	15	2,91	79	197	0,00	0,00	0,00
43	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.11.2011	14.11.2011	14	0,00	684,67	318,97	318,97	46,73	43	21,26	467	1 316	0,00	0,00	0,00
44	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	30.11.2011	06.12.2011	5	0,00	214,82	151,17	43,57	20,07	12	8,39	197	479	0,00	1,16	0,00
45	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.11.2011	06.12.2011	1	0,00	12,17	8,45	3,72	0,00	1	0,45	8	23	0,00	0,00	0,00
46	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.12.2011	12.12.2011	6	0,00	320,55	197,08	123,48	0,00	53	10,69	290	708	0,00	0,00	0,00
47	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	15.12.2011	19.12.2011	3	0,00	31,01	23,43	7,17	0,40	7	1,02	23	57	0,00	14,53	0,00
48	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.12.2011	28.12.2011	12	0,00	277,42	183,98	68,88	24,56	65	8,43	266	599	0,00	74,71	0,00
49	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.12.2011	26.12.2011	1	0,00	10,10	5,56	1,69	2,85	4	0,31	12	25	0,00	0,00	0,00
50	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2011	27.12.2011	9	0,00	1 083,57	514,36	514,36	54,84	41	34,29	815	2 005	0,00	0,00	0,00
51	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2011	29.12.2011	6	0,00	133,05	98,91	33,86	0,29	22	5,85	150	473	0,00	0,00	0,00
52	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2011	28.12.2011	5	0,00	380,50	236,50	136,83	7,17	33	12,44	271	868	0,00	0,00	0,00
53	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	1	0,00	43,66	23,41	11,17	9,09	5	1,16	28	65	0,10	5,22	0,00
54	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	1	0,00	34,61	24,34	7,96	2,30	5	1,29	38	87	0,00	0,00	0,00
55	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	6	0,00	24,54	14,66	6,99	2,89	8	0,76	24	61	0,00	0,00	0,00
56	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	29.12.2011	6	0,00	235,12	159,98	61,41	13,73	30	7,88	192	516	0,00	10,00	0,00
ИТОГО по заявкам 2011 года:				**391**		**15 546,94**	**9 660,23**	**4 812,06**	**1 074,65**	**2 124**	**519,29**	**13 324**	**32 815**	**55,13**	**386,62**	**2,66**

Приложение 2. Информация о реализации региональных адресных программ в 2011 году

Информация о реализации региональных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**121 342**	**119 170**	**98,21**	**352 827,37**	**344 754,63**	**97,71**	**15 540,35**	**15 202,71**	**97,83**	**252 360,14**	**248 049,97**	**98,29**
	Итого по 2008 году		**37 966**	**37 966**	**100,00**	**117 594,83**	**117 594,83**	**100,00**	**5 420,40**	**5 420,40**	**100,00**	**57 870,13**	**57 870,13**	**100,00**
	Центральный федеральный округ		**8 452**	**8 452**	**100,00**	**22 253,02**	**22 253,02**	**100,00**	**1 040,85**	**1 040,85**	**100,00**	**10 464,80**	**10 464,80**	**100,00**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	477	477	100,00	1 859,90	1 859,90	100,00	88,46	88,46	100,00	608,70	608,70	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.07.2008	193	193	100,00	317,98	317,98	100,00	12,82	12,82	100,00	180,76	180,76	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2008	953	953	100,00	3 151,45	3 151,45	100,00	148,58	148,58	100,00	749,94	749,94	100,00
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.09.2008	159	159	100,00	148,26	148,26	100,00	7,25	7,25	100,00	73,97	73,97	100,00
5	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.04.2008	286	286	100,00	914,06	914,06	100,00	38,14	38,14	100,00	512,14	512,14	100,00
6	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	461	461	100,00	1 332,62	1 332,62	100,00	62,23	62,23	100,00	685,34	685,34	100,00
7	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2008	185	185	100,00	371,37	371,37	100,00	16,53	16,53	100,00	162,62	162,62	100,00
8	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.11.2008	370	370	100,00	928,41	928,41	100,00	40,09	40,09	100,00	310,08	310,08	100,00
9	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.03.2008	343	343	100,00	736,76	736,76	100,00	35,62	35,62	100,00	431,38	431,38	100,00
10	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.04.2008	166	166	100,00	213,00	213,00	100,00	9,35	9,35	100,00	133,51	133,51	100,00
11	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2008	335	335	100,00	860,89	860,89	100,00	38,90	38,90	100,00	239,40	239,40	100,00
12	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2008	268	268	100,00	866,06	866,06	100,00	42,60	42,60	100,00	366,69	366,69	100,00
13	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	122	122	100,00	500,00	500,00	100,00	24,89	24,89	100,00	224,05	224,05	100,00
14	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	14.04.2008	129	129	100,00	465,79	465,79	100,00	22,53	22,53	100,00	390,30	390,30	100,00
15	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	205	205	100,00	521,43	521,43	100,00	26,93	26,93	100,00	355,98	355,98	100,00
16	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	230	230	100,00	717,92	717,92	100,00	39,32	39,32	100,00	532,31	532,31	100,00
17	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	383	383	100,00	403,41	403,41	100,00	16,94	16,94	100,00	325,29	325,29	100,00
18	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.09.2008	104	104	100,00	289,61	289,61	100,00	12,27	12,27	100,00	166,78	166,78	100,00
19	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	44	44	100,00	180,70	180,70	100,00	8,32	8,32	100,00	201,84	201,84	100,00
20	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.10.2008	152	152	100,00	245,48	245,48	100,00	10,77	10,77	100,00	185,27	185,27	100,00
21	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	168	168	100,00	470,10	470,10	100,00	17,05	17,05	100,00	377,18	377,18	100,00
22	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.04.2008	522	522	100,00	1 177,14	1 177,14	100,00	51,54	51,54	100,00	492,85	492,85	100,00
23	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	292	292	100,00	700,03	700,03	100,00	34,45	34,45	100,00	426,35	426,35	100,00
24	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	276	276	100,00	355,66	355,66	100,00	16,06	16,06	100,00	296,79	296,79	100,00
25	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	174	174	100,00	499,53	499,53	100,00	24,66	24,66	100,00	502,38	502,38	100,00
26	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2008	222	222	100,00	204,97	204,97	100,00	12,08	12,08	100,00	176,82	176,82	100,00
27	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	84	84	100,00	134,84	134,84	100,00	6,31	6,31	100,00	93,28	93,28	100,00
28	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.09.2008	208	208	100,00	266,27	266,27	100,00	12,05	12,05	100,00	210,21	210,21	100,00
29	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	458	458	100,00	1 757,97	1 757,97	100,00	81,08	81,08	100,00	445,91	445,91	100,00
30	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.11.2008	483	483	100,00	1 661,43	1 661,43	100,00	83,05	83,05	100,00	606,69	606,69	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**2 627**	**2 627**	**100,00**	**8 162,64**	**8 162,64**	**100,00**	**378,99**	**378,99**	**100,00**	**3 531,59**	**3 531,59**	**100,00**
31	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.10.2008	532	532	100,00	1 937,30	1 937,30	100,00	89,31	89,31	100,00	420,60	420,60	100,00
32	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2008	207	207	100,00	882,90	882,90	100,00	40,43	40,43	100,00	211,95	211,95	100,00
33	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.09.2008	176	176	100,00	610,84	610,84	100,00	27,98	27,98	100,00	301,72	301,72	100,00
34	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	132	132	100,00	106,27	106,27	100,00	4,81	4,81	100,00	302,53	302,53	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
35	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	504	504	100,00	1 718,93	1 718,93	100,00	86,69	86,69	100,00	436,10	436,10	100,00
36	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.11.2008	126	126	100,00	468,20	468,20	100,00	23,32	23,32	100,00	288,61	288,61	100,00
37	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	145	145	100,00	772,64	772,64	100,00	32,81	32,81	100,00	204,23	204,23	100,00
38	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	64	64	100,00	128,73	128,73	100,00	4,85	4,85	100,00	40,70	40,70	100,00
39	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	66	66	100,00	161,70	161,70	100,00	8,98	8,98	100,00	136,43	136,43	100,00
40	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.12.2008	215	215	100,00	528,22	528,22	100,00	22,23	22,23	100,00	496,52	496,52	100,00
41	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	16.07.2008	176	176	100,00	235,44	235,44	100,00	10,74	10,74	100,00	209,17	209,17	100,00
42	РЕСПУБЛИКА КОМИ	29.07.2008	284	284	100,00	611,48	611,48	100,00	26,86	26,86	100,00	483,03	483,03	100,00
	Южный федеральный округ		**3 477**	**3 477**	**100,00**	**11 429,97**	**11 429,97**	**100,00**	**517,63**	**517,63**	**100,00**	**7 489,74**	**7 489,74**	**100,00**
43	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2008	275	275	100,00	638,42	638,42	100,00	27,31	27,31	100,00	434,43	434,43	100,00
44	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	236	236	100,00	620,59	620,59	100,00	25,12	25,12	100,00	263,62	263,62	100,00
45	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	510	510	100,00	1 753,08	1 753,08	100,00	78,24	78,24	100,00	720,07	720,07	100,00
46	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	01.07.2008	776	776	100,00	2 760,06	2 760,06	100,00	135,42	135,42	100,00	2 214,89	2 214,89	100,00
47	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	29.10.2008	577	577	100,00	1 819,10	1 819,10	100,00	86,42	86,42	100,00	1 476,75	1 476,75	100,00
48	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	29.05.2008	122	122	100,00	411,20	411,20	100,00	15,26	15,26	100,00	135,60	135,60	100,00
49	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	21.10.2008	166	166	100,00	283,01	283,01	100,00	11,39	11,39	100,00	228,72	228,72	100,00
50	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	21.10.2008	35	35	100,00	27,11	27,11	100,00	1,40	1,40	100,00	49,37	49,37	100,00
51	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.04.2008	780	780	100,00	3 117,40	3 117,40	100,00	137,07	137,07	100,00	1 966,30	1 966,30	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**1 394**	**1 394**	**100,00**	**3 767,92**	**3 767,92**	**100,00**	**173,18**	**173,18**	**100,00**	**3 752,12**	**3 752,12**	**100,00**
52	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	16.07.2008	118	118	100,00	257,18	257,18	100,00	18,40	18,40	100,00	248,71	248,71	100,00
53	КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	08.07.2008	194	194	100,00	404,46	404,46	100,00	17,65	17,65	100,00	174,93	174,93	100,00
54	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	05.08.2008	309	309	100,00	863,68	863,68	100,00	44,62	44,62	100,00	884,19	884,19	100,00
55	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	24.12.2008	21	21	100,00	104,72	104,72	100,00	6,74	6,74	100,00	125,68	125,68	100,00
56	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ	29.07.2008	47	47	100,00	72,77	72,77	100,00	3,15	3,15	100,00	71,36	71,36	100,00
57	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ	10.12.2008	127	127	100,00	264,46	264,46	100,00	12,16	12,16	100,00	308,26	308,26	100,00
58	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	24.06.2008	367	367	100,00	1 181,77	1 181,77	100,00	46,45	46,45	100,00	1 162,51	1 162,51	100,00
59	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	02.12.2008	211	211	100,00	618,88	618,88	100,00	24,00	24,00	100,00	776,48	776,48	100,00
	Приволжский федеральный округ		**10 728**	**10 728**	**100,00**	**33 843,78**	**33 843,78**	**100,00**	**1 661,18**	**1 661,18**	**100,00**	**15 260,62**	**15 260,62**	**100,00**
60	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2008	469	469	100,00	967,41	967,41	100,00	41,61	41,61	100,00	245,79	245,79	100,00
61	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	214	214	100,00	377,48	377,48	100,00	8,54	8,54	100,00	125,44	125,44	100,00
62	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	238	238	100,00	361,83	361,83	100,00	14,83	14,83	100,00	147,59	147,59	100,00
63	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2008	1 412	1 412	100,00	4 810,12	4 810,12	100,00	246,36	246,36	100,00	1 315,18	1 315,18	100,00
64	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.11.2008	251	251	100,00	729,42	729,42	100,00	36,15	36,15	100,00	432,11	432,11	100,00
65	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	481	481	100,00	1 564,37	1 564,37	100,00	74,28	74,28	100,00	588,73	588,73	100,00
66	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	539	539	100,00	1 066,85	1 066,85	100,00	51,36	51,36	100,00	428,22	428,22	100,00
67	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2008	201	201	100,00	407,36	407,36	100,00	18,74	18,74	100,00	402,59	402,59	100,00
68	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	95	95	100,00	100,13	100,13	100,00	4,70	4,70	100,00	131,04	131,04	100,00
69	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	22.07.2008	445	445	100,00	1 612,33	1 612,33	100,00	77,71	77,71	100,00	729,19	729,19	100,00
70	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	04.06.2008	211	211	100,00	762,28	762,28	100,00	54,40	54,40	100,00	1 493,20	1 493,20	100,00
71	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	29.05.2008	207	207	100,00	433,17	433,17	100,00	21,25	21,25	100,00	124,05	124,05	100,00
72	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	08.07.2008	171	171	100,00	530,32	530,32	100,00	28,67	28,67	100,00	207,18	207,18	100,00
73	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	10.04.2008	347	347	100,00	532,98	532,98	100,00	26,13	26,13	100,00	682,64	682,64	100,00
74	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	14.04.2008	2 066	2 066	100,00	7 797,31	7 797,31	100,00	404,24	404,24	100,00	4 208,66	4 208,66	100,00
75	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.05.2008	117	117	100,00	527,99	527,99	100,00	22,84	22,84	100,00	771,55	771,55	100,00
76	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	472	472	100,00	1 779,31	1 779,31	100,00	90,86	90,86	100,00	455,87	455,87	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
77	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2008	1 449	1 449	100,00	5 642,37	5 642,37	100,00	245,87	245,87	100,00	797,42	797,42	100,00
78	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	14.08.2008	172	172	100,00	539,59	539,59	100,00	25,45	25,45	100,00	253,16	253,16	100,00
79	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	18.12.2008	369	369	100,00	867,66	867,66	100,00	43,72	43,72	100,00	322,40	322,40	100,00
80	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2008	387	387	100,00	1 271,86	1 271,86	100,00	56,30	56,30	100,00	623,70	623,70	100,00
81	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	24.06.2008	415	415	100,00	1 161,65	1 161,65	100,00	67,17	67,17	100,00	774,95	774,95	100,00
	Уральский федеральный округ		**3 732**	**3 732**	**100,00**	**14 294,93**	**14 294,93**	**100,00**	**599,65**	**599,65**	**100,00**	**6 041,86**	**6 041,86**	**100,00**
82	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	91	91	100,00	253,54	253,54	100,00	10,73	10,73	100,00	359,36	359,36	100,00
83	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	1 054	1 054	100,00	3 640,07	3 640,07	100,00	160,83	160,83	100,00	1 860,77	1 860,77	100,00
84	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.04.2008	46	46	100,00	240,53	240,53	100,00	9,78	9,78	100,00	308,78	308,78	100,00
85	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.10.2008	47	47	100,00	303,06	303,06	100,00	11,76	11,76	100,00	405,10	405,10	100,00
86	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	01.07.2008	80	80	100,00	305,76	305,76	100,00	15,28	15,28	100,00	469,42	469,42	100,00
87	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	02.12.2008	49	49	100,00	206,79	206,79	100,00	11,59	11,59	100,00	451,94	451,94	100,00
88	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.02.2008	1 782	1 782	100,00	7 619,00	7 619,00	100,00	305,93	305,93	100,00	1 655,37	1 655,37	100,00
89	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	517	517	100,00	1 523,30	1 523,30	100,00	62,02	62,02	100,00	275,99	275,99	100,00
90	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	29.10.2008	66	66	100,00	202,88	202,88	100,00	11,72	11,72	100,00	255,13	255,13	100,00
	Сибирский федеральный округ		**6 599**	**6 599**	**100,00**	**21 100,09**	**21 100,09**	**100,00**	**946,09**	**946,09**	**100,00**	**8 389,42**	**8 389,42**	**100,00**
91	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	16.07.2008	910	910	100,00	3 723,77	3 723,77	100,00	164,06	164,06	100,00	828,48	828,48	100,00
92	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	21.10.2008	283	283	100,00	904,25	904,25	100,00	39,51	39,51	100,00	350,14	350,14	100,00
93	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.07.2008	93	93	100,00	241,54	241,54	100,00	10,50	10,50	100,00	151,37	151,37	100,00
94	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	338	338	100,00	987,98	987,98	100,00	46,52	46,52	100,00	358,20	358,20	100,00
95	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.10.2008	115	115	100,00	346,18	346,18	100,00	15,57	15,57	100,00	247,58	247,58	100,00
96	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.03.2008	712	712	100,00	2 247,70	2 247,70	100,00	98,84	98,84	100,00	827,67	827,67	100,00
97	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	673	673	100,00	2 360,95	2 360,95	100,00	102,80	102,80	100,00	708,36	708,36	100,00
98	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	04.06.2008	1 714	1 714	100,00	5 113,91	5 113,91	100,00	212,87	212,87	100,00	1 927,37	1 927,37	100,00
99	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2008	400	400	100,00	1 842,31	1 842,31	100,00	77,25	77,25	100,00	896,20	896,20	100,00
100	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.05.2008	452	452	100,00	1 145,90	1 145,90	100,00	76,30	76,30	100,00	771,40	771,40	100,00
101	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	14.08.2008	133	133	100,00	125,72	125,72	100,00	4,85	4,85	100,00	226,03	226,03	100,00
102	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	16.07.2008	167	167	100,00	386,99	386,99	100,00	19,86	19,86	100,00	313,36	313,36	100,00
103	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	02.09.2008	64	64	100,00	201,83	201,83	100,00	8,86	8,86	100,00	125,03	125,03	100,00
104	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	22.07.2008	168	168	100,00	165,78	165,78	100,00	5,47	5,47	100,00	148,57	148,57	100,00
105	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.04.2008	300	300	100,00	1 183,78	1 183,78	100,00	57,21	57,21	100,00	444,78	444,78	100,00
106	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	77	77	100,00	121,52	121,52	100,00	5,63	5,63	100,00	64,89	64,89	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**957**	**957**	**100,00**	**2 742,49**	**2 742,49**	**100,00**	**102,84**	**102,84**	**100,00**	**2 939,99**	**2 939,99**	**100,00**
107	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.09.2008	324	324	100,00	449,49	449,49	100,00	17,19	17,19	100,00	629,01	629,01	100,00
108	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2008	48	48	100,00	56,15	56,15	100,00	2,30	2,30	100,00	60,82	60,82	100,00
109	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	32	32	100,00	68,43	68,43	100,00	2,62	2,62	100,00	87,11	87,11	100,00
110	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.10.2008	40	40	100,00	93,52	93,52	100,00	3,62	3,62	100,00	210,94	210,94	100,00
111	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	20.11.2008	94	94	100,00	369,92	369,92	100,00	16,29	16,29	100,00	446,77	446,77	100,00
112	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	11.06.2008	119	119	100,00	388,67	388,67	100,00	18,65	18,65	100,00	397,75	397,75	100,00
113	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	93	93	100,00	292,10	292,10	100,00	7,81	7,81	100,00	254,96	254,96	100,00
114	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	21.10.2008	110	110	100,00	834,70	834,70	100,00	27,13	27,13	100,00	517,48	517,48	100,00
115	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	18.12.2008	97	97	100,00	189,51	189,51	100,00	7,24	7,24	100,00	335,14	335,14	100,00
	Итого по 2009 году		**43 990**	**43 990**	**100,00**	**115 432,21**	**115 432,21**	**100,00**	**5 232,15**	**5 232,15**	**100,00**	**93 366,75**	**93 366,75**	**100,00**
	Центральный федеральный округ		**10 396**	**10 396**	**100,00**	**20 886,68**	**20 886,68**	**100,00**	**939,08**	**939,08**	**100,00**	**16 608,01**	**16 608,01**	**100,00**

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	582	582	100,00	1 827,69	1 827,69	100,00	84,33	84,33	100,00	1 722,68	1 722,68	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.05.2009	370	370	100,00	700,53	700,53	100,00	27,12	27,12	100,00	1 165,96	1 165,96	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2009	999	999	100,00	1 776,97	1 776,97	100,00	76,50	76,50	100,00	702,37	702,37	100,00
4	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2009	662	662	100,00	1 446,59	1 446,59	100,00	63,86	63,86	100,00	997,04	997,04	100,00
5	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.09.2009	32	32	100,00	28,66	28,66	100,00	1,15	1,15	100,00	37,74	37,74	100,00
6	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.04.2009	1 134	1 134	100,00	2 161,37	2 161,37	100,00	111,40	111,40	100,00	1 505,75	1 505,75	100,00
7	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2009	248	248	100,00	480,88	480,88	100,00	18,54	18,54	100,00	372,95	372,95	100,00
8	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.05.2009	924	924	100,00	1 343,76	1 343,76	100,00	61,00	61,00	100,00	675,69	675,69	100,00
9	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.06.2009	762	762	100,00	2 150,63	2 150,63	100,00	94,30	94,30	100,00	1 738,42	1 738,42	100,00
10	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	28.04.2009	744	744	100,00	1 396,03	1 396,03	100,00	59,57	59,57	100,00	1 276,41	1 276,41	100,00
11	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.09.2009	256	256	100,00	356,42	356,42	100,00	15,17	15,17	100,00	351,99	351,99	100,00
12	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.04.2009	859	859	100,00	1 318,00	1 318,00	100,00	59,04	59,04	100,00	1 225,40	1 225,40	100,00
13	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2009	483	483	100,00	938,90	938,90	100,00	38,14	38,14	100,00	596,92	596,92	100,00
14	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.03.2009	895	895	100,00	2 022,28	2 022,28	100,00	92,87	92,87	100,00	1 578,53	1 578,53	100,00
15	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.05.2009	585	585	100,00	1 375,60	1 375,60	100,00	63,22	63,22	100,00	1 508,22	1 508,22	100,00
16	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2009	861	861	100,00	1 562,37	1 562,37	100,00	72,89	72,89	100,00	1 151,93	1 151,93	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**4 454**	**4 454**	**100,00**	**16 268,45**	**16 268,45**	**100,00**	**731,11**	**731,11**	**100,00**	**9 431,12**	**9 431,12**	**100,00**
17	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.07.2009	606	606	100,00	1 242,09	1 242,09	100,00	57,81	57,81	100,00	650,94	650,94	100,00
18	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.08.2009	574	574	100,00	975,08	975,08	100,00	45,28	45,28	100,00	829,38	829,38	100,00
19	ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	01.06.2009	1 512	1 512	100,00	10 256,91	10 256,91	100,00	459,70	459,70	100,00	4 700,63	4 700,63	100,00
20	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.08.2009	187	187	100,00	174,63	174,63	100,00	8,77	8,77	100,00	375,33	375,33	100,00
21	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2009	451	451	100,00	1 383,49	1 383,49	100,00	64,96	64,96	100,00	855,42	855,42	100,00
22	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.08.2009	192	192	100,00	588,77	588,77	100,00	23,47	23,47	100,00	654,88	654,88	100,00
23	НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	06.08.2009	46	46	100,00	56,93	56,93	100,00	2,58	2,58	100,00	273,41	273,41	100,00
24	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.09.2009	265	265	100,00	612,94	612,94	100,00	27,09	27,09	100,00	352,77	352,77	100,00
25	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.07.2009	272	272	100,00	209,40	209,40	100,00	9,36	9,36	100,00	329,19	329,19	100,00
26	РЕСПУБЛИКА КОМИ	04.08.2009	349	349	100,00	768,19	768,19	100,00	32,09	32,09	100,00	409,17	409,17	100,00
	Южный федеральный округ		**2 064**	**2 064**	**100,00**	**6 263,02**	**6 263,02**	**100,00**	**261,76**	**261,76**	**500,00**	**5 640,45**	**5 640,45**	**100,00**
27	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.03.2009	252	252	100,00	672,28	672,28	100,00	32,69	32,69	100,00	605,84	605,84	100,00
28	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2009	480	480	100,00	1 493,15	1 493,15	100,00	66,71	66,71	100,00	1 210,77	1 210,77	100,00
29	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	06.08.2009	601	601	100,00	1 793,62	1 793,62	100,00	70,59	70,59	100,00	1 695,29	1 695,29	100,00
30	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	24.07.2009	150	150	100,00	200,09	200,09	100,00	9,08	9,08	100,00	255,73	255,73	100,00
31	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.07.2009	581	581	100,00	2 103,88	2 103,88	100,00	82,69	82,69	100,00	1 872,83	1 872,83	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**954**	**954**	**100,00**	**2 162,53**	**2 162,53**	**100,00**	**98,45**	**98,45**	**100,00**	**3 175,86**	**3 175,86**	**100,00**
32	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	30.07.2009	120	120	100,00	312,72	312,72	100,00	13,53	13,53	100,00	340,50	340,50	100,00
33	КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	06.11.2009	176	176	100,00	318,55	318,55	100,00	12,91	12,91	100,00	241,43	241,43	100,00
34	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	26.05.2009	362	362	100,00	689,82	689,82	100,00	37,42	37,42	100,00	1 294,24	1 294,24	100,00
35	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	20.07.2009	296	296	100,00	841,43	841,43	100,00	34,59	34,59	100,00	1 299,68	1 299,68	100,00
	Приволжский федеральный округ		**10 961**	**10 961**	**100,00**	**29 287,60**	**29 287,60**	**100,00**	**1 412,03**	**1 412,03**	**100,00**	**28 504,75**	**28 504,75**	**100,00**
36	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.08.2009	869	869	100,00	977,46	977,46	100,00	53,47	53,47	100,00	529,78	529,78	100,00
37	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2009	1 036	1 036	100,00	2 712,20	2 712,20	100,00	129,16	129,16	100,00	1 644,74	1 644,74	100,00
38	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	569	569	100,00	1 370,65	1 370,65	100,00	61,59	61,59	100,00	909,28	909,28	100,00
39	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	718	718	100,00	1 454,80	1 454,80	100,00	66,58	66,58	100,00	1 368,14	1 368,14	100,00
40	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	30.03.2009	1 037	1 037	100,00	2 610,41	2 610,41	100,00	121,83	121,83	100,00	2 306,90	2 306,90	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
41	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	24.02.2009	476	476	100,00	1 545,67	1 545,67	100,00	71,38	71,38	100,00	3 700,66	3 700,66	100,00
42	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	26.03.2009	63	63	100,00	246,24	246,24	100,00	11,35	11,35	100,00	651,17	651,17	100,00
43	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	10.04.2009	270	270	100,00	471,12	471,12	100,00	23,55	23,55	100,00	393,94	393,94	100,00
44	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	28.04.2009	133	133	100,00	455,45	455,45	100,00	21,63	21,63	100,00	374,51	374,51	100,00
45	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	26.05.2009	350	350	100,00	515,27	515,27	100,00	25,48	25,48	100,00	953,95	953,95	100,00
36	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	13.02.2009	2 404	2 404	100,00	8 017,37	8 017,37	100,00	420,88	420,88	100,00	9 721,64	9 721,64	100,00
37	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.07.2009	245	245	100,00	592,00	592,00	100,00	27,15	27,15	100,00	1 135,59	1 135,59	100,00
38	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	1 384	1 384	100,00	5 115,97	5 115,97	100,00	230,79	230,79	100,00	2 367,54	2 367,54	100,00
39	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	24.07.2009	367	367	100,00	702,62	702,62	100,00	32,54	32,54	100,00	531,44	531,44	100,00
40	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.07.2009	449	449	100,00	1 125,05	1 125,05	100,00	46,65	46,65	100,00	670,82	670,82	100,00
41	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	20.04.2009	591	591	100,00	1 375,32	1 375,32	100,00	67,99	67,99	100,00	1 244,64	1 244,64	100,00
	Уральский федеральный округ		**5 740**	**5 740**	**100,00**	**17 533,71**	**17 533,71**	**100,00**	**751,12**	**751,12**	**100,00**	**10 798,62**	**10 798,62**	**100,00**
42	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2009	83	83	100,00	164,85	164,85	100,00	6,27	6,27	100,00	307,93	307,93	100,00
43	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.04.2009	2 480	2 480	100,00	7 563,77	7 563,77	100,00	343,64	343,64	100,00	5 911,05	5 911,05	100,00
44	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.08.2009	77	77	100,00	403,65	403,65	100,00	17,86	17,86	100,00	939,28	939,28	100,00
45	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	29.06.2009	136	136	100,00	278,27	278,27	100,00	14,87	14,87	100,00	594,28	594,28	100,00
46	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	2 964	2 964	100,00	9 123,18	9 123,18	100,00	368,47	368,47	100,00	3 046,09	3 046,09	100,00
	Сибирский федеральный округ		**8 043**	**8 043**	**100,00**	**19 976,82**	**19 976,82**	**100,00**	**882,25**	**882,25**	**100,00**	**15 005,29**	**15 005,29**	**100,00**
47	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	28.04.2009	1 580	1 580	100,00	4 450,93	4 450,93	100,00	227,40	227,40	100,00	2 681,97	2 681,97	100,00
48	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.05.2009	764	764	100,00	1 415,61	1 415,61	100,00	58,11	58,11	100,00	1 660,87	1 660,87	100,00
49	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2009	597	597	100,00	1 657,11	1 657,11	100,00	73,13	73,13	100,00	1 220,99	1 220,99	100,00
50	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	1 288	1 288	100,00	4 136,70	4 136,70	100,00	159,30	159,30	100,00	2 440,62	2 440,62	100,00
51	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	22.05.2009	1 592	1 592	100,00	4 612,53	4 612,53	100,00	199,70	199,70	100,00	2 580,03	2 580,03	100,00
52	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	230	230	100,00	538,53	538,53	100,00	20,81	20,81	100,00	950,08	950,08	100,00
53	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.05.2009	806	806	100,00	1 995,64	1 995,64	100,00	94,04	94,04	100,00	2 039,70	2 039,70	100,00
54	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	29.06.2009	412	412	100,00	66,53	66,53	100,00	3,45	3,45	100,00	156,54	156,54	100,00
55	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	30.07.2009	161	161	100,00	257,66	257,66	100,00	10,82	10,82	100,00	394,21	394,21	100,00
56	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	22.07.2009	54	54	100,00	179,64	179,64	100,00	8,07	8,07	100,00	84,80	84,80	100,00
57	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	28.04.2009	318	318	100,00	495,06	495,06	100,00	19,37	19,37	100,00	602,20	602,20	100,00
58	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.07.2009	241	241	100,00	170,87	170,87	100,00	8,05	8,05	100,00	193,28	193,28	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**1 378**	**1 378**	**100,00**	**3 053,40**	**3 053,40**	**100,00**	**156,36**	**156,36**	**100,00**	**4 202,64**	**4 202,64**	**100,00**
59	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.08.2009	255	255	100,00	409,28	409,28	100,00	15,93	15,93	100,00	392,72	392,72	100,00
60	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	73	73	100,00	174,94	174,94	100,00	5,50	5,50	100,00	301,42	301,42	100,00
61	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	16.06.2009	61	61	100,00	122,20	122,20	100,00	5,13	5,13	100,00	112,07	112,07	100,00
62	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.11.2009	12	12	100,00	14,38	14,38	100,00	0,58	0,58	100,00	24,23	24,23	100,00
63	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	09.07.2009	317	317	100,00	681,56	681,56	100,00	35,53	35,53	100,00	1 082,48	1 082,48	100,00
64	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	17.03.2009	313	313	100,00	607,12	607,12	100,00	28,62	28,62	100,00	964,33	964,33	100,00
65	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2009	62	62	100,00	132,85	132,85	100,00	4,26	4,26	100,00	285,09	285,09	100,00
66	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	17.08.2009	263	263	100,00	877,13	877,13	100,00	59,50	59,50	100,00	865,37	865,37	100,00
67	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	09.07.2009	22	22	100,00	33,94	33,94	100,00	1,31	1,31	100,00	174,92	174,92	100,00
	Итого по 2010 году		**32 099**	**31 063**	**96,77**	**96 449,44**	**92 448,12**	**95,85**	**3 989,13**	**3 812,13**	**95,56**	**81 701,73**	**80 201,04**	**98,16**
	Центральный федеральный округ		**7 933**	**7 011**	**88,38**	**21 369,62**	**17 614,10**	**82,43**	**907,70**	**741,42**	**81,68**	**17 346,11**	**16 010,10**	**92,30**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.07.2010	167	167	100,00	418,92	418,92	100,00	16,50	16,50	100,00	442,63	442,63	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2010	204	204	100,00	308,58	308,58	100,00	11,66	11,66	100,00	520,64	520,64	100,00
3	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2010	8	8	100,00	27,98	27,98	100,00	0,94	0,94	100,00	41,66	41,66	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	769	769	100,00	1 996,11	1 996,11	100,00	86,56	86,56	100,00	730,56	730,56	100,00
5	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.09.2010	484	484	100,00	1 139,55	1 139,55	100,00	50,03	50,03	100,00	460,37	460,37	100,00
6	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	986	986	100,00	2 135,69	2 135,69	100,00	83,65	83,65	100,00	1 839,77	1 839,77	100,00
7	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	29	29	100,00	142,99	142,99	100,00	5,88	5,88	100,00	109,81	109,81	100,00
8	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.12.2010	127	127	100,00	320,20	320,20	100,00	12,89	12,89	100,00	208,63	208,63	100,00
9	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.02.2010	465	465	100,00	1 109,64	1 109,64	100,00	46,54	46,54	100,00	728,74	728,74	100,00
10	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.09.2010	40	40	100,00	147,54	147,54	100,00	5,43	5,43	100,00	71,21	71,21	100,00
11	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.08.2010	120	120	100,00	309,12	309,12	100,00	13,08	13,08	100,00	125,82	125,82	100,00
12	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.08.2010	77	77	100,00	108,77	108,77	100,00	4,42	4,42	100,00	164,87	164,87	100,00
13	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.12.2010	19	19	100,00	161,33	161,33	100,00	6,91	6,91	100,00	96,01	96,01	100,00
14	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	172	172	100,00	286,27	286,27	100,00	12,29	12,29	100,00	392,14	392,14	100,00
15	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	802	488	60,85	2 993,95	1 807,29	60,36	139,61	86,86	62,22	2 940,45	2 701,18	91,86
16	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.10.2010	573	160	27,92	2 470,42	893,11	36,15	109,01	38,44	35,26	2 539,14	1 866,15	73,50
17	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2010	277	88	31,77	1 566,05	589,49	37,64	68,36	26,16	38,27	1 456,46	1 038,34	71,29
18	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.04.2010	345	345	100,00	554,14	554,14	100,00	21,39	21,39	100,00	667,87	667,87	100,00
19	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	37	37	100,00	35,09	35,09	100,00	1,71	1,71	100,00	48,10	48,10	100,00
20	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2010	203	203	100,00	416,75	416,75	100,00	18,55	18,55	100,00	329,47	329,47	100,00
21	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2010	302	302	100,00	734,56	734,56	100,00	29,00	29,00	100,00	602,44	602,44	100,00
22	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	28	28	100,00	111,61	111,61	100,00	4,14	4,14	100,00	43,45	43,45	100,00
23	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	281	281	100,00	559,26	559,26	100,00	20,37	20,37	100,00	289,96	289,96	100,00
24	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	46	46	100,00	240,47	240,47	100,00	8,32	8,32	100,00	100,00	100,00	100,00
25	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2010	1 049	1 044	99,52	2 377,43	2 362,85	99,39	104,76	104,01	99,29	1 895,81	1 892,72	99,84
26	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2010	79	78	98,73	115,96	115,55	99,65	5,30	5,28	99,72	63,17	60,62	95,97
27	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	244	244	100,00	581,26	581,26	100,00	20,38	20,38	100,00	436,95	436,95	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**5 815**	**5 701**	**98,04**	**21 328,07**	**21 082,27**	**98,85**	**897,64**	**886,93**	**98,81**	**14 040,55**	**13 875,87**	**98,83**
28	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	430	430	100,00	1 101,41	1 101,41	100,00	50,16	50,16	100,00	701,13	701,13	100,00
29	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	8	8	100,00	32,97	32,97	100,00	1,24	1,24	100,00	70,14	70,14	100,00
30	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2010	539	539	100,00	1 006,98	1 006,98	100,00	49,22	49,22	100,00	939,15	939,15	100,00
31	ГОРОД САНКТ–ПЕТЕРБУРГ	05.03.2010	1 687	1 687	100,00	10 258,57	10 258,57	100,00	441,11	441,11	100,00	5 794,55	5 794,55	100,00
32	ГОРОД САНКТ–ПЕТЕРБУРГ	12.11.2010	193	193	100,00	924,72	924,72	100,00	37,50	37,50	100,00	374,28	374,28	100,00
33	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	315	315	100,00	373,95	373,95	100,00	14,09	14,09	100,00	751,58	751,58	100,00
34	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	696	696	100,00	2 463,80	2 463,80	100,00	96,08	96,08	100,00	1 342,53	1 342,53	100,00
35	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	111	111	100,00	413,28	413,28	100,00	14,17	14,17	100,00	411,62	411,62	100,00
36	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.10.2010	45	45	100,00	177,93	177,93	100,00	5,69	5,69	100,00	93,81	93,81	100,00
37	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.12.2010	94	94	100,00	695,75	695,75	100,00	23,64	23,64	100,00	538,38	538,38	100,00
38	НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	12.05.2010	118	118	100,00	101,85	101,85	100,00	4,51	4,51	100,00	414,50	414,50	100,00
39	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	414	414	100,00	1 477,63	1 477,63	100,00	61,01	61,01	100,00	743,87	743,87	100,00
40	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	295	295	100,00	432,53	432,53	100,00	17,73	17,73	100,00	398,49	398,49	100,00
41	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	30.04.2010	125	94	75,20	189,60	135,66	71,55	8,74	6,48	74,09	243,17	202,33	83,21
42	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	23.09.2010	249	166	66,67	660,61	468,76	70,96	27,87	19,42	69,68	531,71	407,87	76,71
43	РЕСПУБЛИКА КОМИ	09.04.2010	424	424	100,00	757,43	757,43	100,00	33,94	33,94	100,00	572,35	572,35	100,00
44	РЕСПУБЛИКА КОМИ	04.06.2010	72	72	100,00	259,05	259,05	100,00	10,95	10,95	100,00	119,29	119,29	100,00
	Южный федеральный округ		**2 775**	**2 775**	**100,00**	**8 651,91**	**8 651,91**	**100,00**	**333,49**	**333,49**	**100,00**	**8 904,37**	**8 904,37**	**100,00**
45	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2010	155	155	100,00	383,03	383,03	100,00	12,59	12,59	100,00	355,23	355,23	100,00
46	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.04.2010	474	474	100,00	1 915,46	1 915,46	100,00	69,98	69,98	100,00	1 336,42	1 336,42	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
47	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	50	50	100,00	162,55	162,55	100,00	5,32	5,32	100,00	109,12	109,12	100,00
48	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	16.07.2010	821	821	100,00	2 675,69	2 675,69	100,00	107,41	107,41	100,00	2 780,77	2 780,77	100,00
49	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	16.03.2010	199	199	100,00	294,43	294,43	100,00	12,38	12,38	100,00	423,96	423,96	100,00
50	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	13.10.2010	10	10	100,00	20,51	20,51	100,00	0,82	0,82	100,00	31,77	31,77	100,00
51	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	30.07.2010	203	203	100,00	192,44	192,44	100,00	7,81	7,81	100,00	348,28	348,28	100,00
52	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.03.2010	835	835	100,00	2 912,68	2 912,68	100,00	113,40	113,40	100,00	3 392,62	3 392,62	100,00
53	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	28	28	100,00	95,13	95,13	100,00	3,79	3,79	100,00	126,20	126,20	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**1 380**	**1 380**	**100,00**	**3 058,81**	**3 058,81**	**100,00**	**140,27**	**140,27**	**100,00**	**4 901,69**	**4 901,69**	**100,00**
54	КАБАРДИНО–БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	17.06.2010	175	175	100,00	442,44	442,44	100,00	21,19	21,19	100,00	476,08	476,08	100,00
55	КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	14.07.2010	227	227	100,00	415,25	415,25	100,00	20,51	20,51	100,00	400,25	400,25	100,00
56	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	08.06.2010	250	250	100,00	658,89	658,89	100,00	32,88	32,88	100,00	1 272,37	1 272,37	100,00
57	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	17.06.2010	55	55	100,00	112,22	112,22	100,00	7,17	7,17	100,00	246,95	246,95	100,00
58	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	29.07.2010	244	244	100,00	534,36	534,36	100,00	20,91	20,91	100,00	792,78	792,78	100,00
59	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	07.04.2010	414	414	100,00	867,58	867,58	100,00	36,30	36,30	100,00	1 635,83	1 635,83	100,00
60	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	20.08.2010	15	15	100,00	28,08	28,08	100,00	1,30	1,30	100,00	77,43	77,43	100,00
	Приволжский федеральный округ		**7 955**	**7 955**	**100,00**	**23 373,87**	**23 373,87**	**100,00**	**978,11**	**978,11**	**100,00**	**17 347,05**	**17 347,05**	**100,00**
61	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2010	968	968	100,00	2 320,58	2 320,58	100,00	131,62	131,62	100,00	768,09	768,09	100,00
62	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.08.2010	122	122	100,00	196,18	196,18	100,00	7,54	7,54	100,00	103,89	103,89	100,00
63	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.04.2010	1 091	1 091	100,00	2 782,10	2 782,10	100,00	108,36	108,36	100,00	1 551,07	1 551,07	100,00
64	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	151	151	100,00	181,91	181,91	100,00	7,65	7,65	100,00	175,76	175,76	100,00
65	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.04.2010	676	676	100,00	1 066,05	1 066,05	100,00	47,05	47,05	100,00	920,07	920,07	100,00
66	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	102	102	100,00	268,96	268,96	100,00	10,09	10,09	100,00	149,00	149,00	100,00
67	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2010	378	378	100,00	825,84	825,84	100,00	33,58	33,58	100,00	579,19	579,19	100,00
68	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	16.07.2010	537	537	100,00	1 568,80	1 568,80	100,00	62,87	62,87	100,00	1 400,53	1 400,53	100,00
69	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	02.06.2010	231	231	100,00	1 103,60	1 103,60	100,00	46,27	46,27	100,00	1 011,89	1 011,89	100,00
70	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	01.07.2010	155	155	100,00	332,01	332,01	100,00	14,93	14,93	100,00	300,16	300,16	100,00
71	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	01.07.2010	120	120	100,00	175,53	175,53	100,00	8,02	8,02	100,00	366,04	366,04	100,00
72	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	27.05.2010	923	923	100,00	3 435,47	3 435,47	100,00	142,09	142,09	100,00	4 403,54	4 403,54	100,00
73	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.05.2010	468	468	100,00	1 091,10	1 091,10	100,00	45,10	45,10	100,00	2 138,83	2 138,83	100,00
74	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	101	101	100,00	381,79	381,79	100,00	12,54	12,54	100,00	397,12	397,12	100,00
75	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2010	630	630	100,00	2 600,42	2 600,42	100,00	97,25	97,25	100,00	653,74	653,74	100,00
76	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	14.04.2010	637	637	100,00	1 896,86	1 896,86	100,00	81,73	81,73	100,00	1 046,96	1 046,96	100,00
77	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	20.07.2010	31	31	100,00	119,21	119,21	100,00	4,71	4,71	100,00	93,98	93,98	100,00
78	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	601	601	100,00	2 971,20	2 971,20	100,00	114,12	114,12	100,00	1 186,73	1 186,73	100,00
79	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	11.06.2010	33	33	100,00	56,26	56,26	100,00	2,60	2,60	100,00	100,46	100,46	100,00
	Уральский федеральный округ		**1 560**	**1 560**	**100,00**	**5 488,83**	**5 488,83**	**100,00**	**229,72**	**229,72**	**100,00**	**6 060,01**	**6 060,01**	**100,00**
80	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	91	91	100,00	191,65	191,65	100,00	9,01	9,01	100,00	492,60	492,60	100,00
81	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	3	3	100,00	17,61	17,61	100,00	0,72	0,72	100,00	47,74	47,74	100,00
82	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	310	310	100,00	857,67	857,67	100,00	33,85	33,85	100,00	1 277,74	1 277,74	100,00
83	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2010	89	89	100,00	151,56	151,56	100,00	6,31	6,31	100,00	365,62	365,62	100,00
84	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.08.2010	74	74	100,00	272,22	272,22	100,00	11,34	11,34	100,00	703,34	703,34	100,00
85	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.12.2010	122	122	100,00	823,82	823,82	100,00	32,67	32,67	100,00	490,05	490,05	100,00
86	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	26.03.2010	123	123	100,00	357,13	357,13	100,00	17,23	17,23	100,00	702,47	702,47	100,00
87	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	13.12.2010	100	100	100,00	293,26	293,26	100,00	13,44	13,44	100,00	739,25	739,25	100,00
88	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2010	415	415	100,00	1 709,63	1 709,63	100,00	71,73	71,73	100,00	730,83	730,83	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
89	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.08.2010	173	173	100,00	622,26	622,26	100,00	24,96	24,96	100,00	262,34	262,34	100,00
90	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	27.05.2010	60	60	100,00	192,02	192,02	100,00	8,46	8,46	100,00	248,03	248,03	100,00
	Сибирский федеральный округ		**2 985**	**2 985**	**100,00**	**7 865,77**	**7 865,77**	**100,00**	**293,70**	**293,70**	**100,00**	**7 207,90**	**7 207,90**	**100,00**
91	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	23.07.2010	794	794	100,00	966,37	966,37	100,00	33,85	33,85	100,00	965,90	965,90	100,00
92	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.06.2010	232	232	100,00	435,50	435,50	100,00	12,99	12,99	100,00	466,86	466,86	100,00
93	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	571	571	100,00	1 441,59	1 441,59	100,00	63,54	63,54	100,00	1 514,10	1 514,10	100,00
94	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	72	72	100,00	244,46	244,46	100,00	6,97	6,97	100,00	88,31	88,31	100,00
95	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2010	314	314	100,00	1 394,90	1 394,90	100,00	49,04	49,04	100,00	705,93	705,93	100,00
96	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	14.07.2010	33	33	100,00	201,08	201,08	100,00	7,80	7,80	100,00	231,45	231,45	100,00
97	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	337	337	100,00	1 124,25	1 124,25	100,00	35,94	35,94	100,00	1 508,01	1 508,01	100,00
98	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.07.2010	33	33	100,00	61,09	61,09	100,00	2,20	2,20	100,00	132,96	132,96	100,00
99	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.09.2010	38	38	100,00	57,15	57,15	100,00	2,51	2,51	100,00	177,59	177,59	100,00
100	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	04.06.2010	17	17	100,00	16,16	16,16	100,00	0,64	0,64	100,00	63,62	63,62	100,00
101	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	31.03.2010	145	145	100,00	478,78	478,78	100,00	13,81	13,81	100,00	389,23	389,23	100,00
102	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	28.12.2010	22	22	100,00	33,32	33,32	100,00	1,08	1,08	100,00	39,23	39,23	100,00
103	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	07.05.2010	81	81	100,00	252,65	252,65	100,00	10,21	10,21	100,00	183,00	183,00	100,00
104	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	28.12.2010	7	7	100,00	13,99	13,99	100,00	0,58	0,58	100,00	22,10	22,10	100,00
105	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2010	228	228	100,00	1 037,54	1 037,54	100,00	47,30	47,30	100,00	646,70	646,70	100,00
106	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2010	61	61	100,00	106,97	106,97	100,00	5,24	5,24	100,00	72,91	72,91	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**1 696**	**1 696**	**100,00**	**5 312,55**	**5 312,55**	**100,00**	**208,51**	**208,51**	**100,00**	**5 894,04**	**5 894,04**	**100,00**
107	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2010	25	25	100,00	110,59	110,59	100,00	2,94	2,94	100,00	153,02	153,02	100,00
108	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	3	3	100,00	13,33	13,33	100,00	0,45	0,45	100,00	23,05	23,05	100,00
109	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	22.06.2010	215	215	100,00	612,46	612,46	100,00	23,34	23,34	100,00	550,95	550,95	100,00
110	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	37	37	100,00	59,96	59,96	100,00	2,33	2,33	100,00	167,30	167,30	100,00
111	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	11.06.2010	479	479	100,00	1 732,37	1 732,37	100,00	71,18	71,18	100,00	1 819,74	1 819,74	100,00
112	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	05.10.2010	32	32	100,00	130,31	130,31	100,00	5,37	5,37	100,00	169,99	169,99	100,00
113	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	06.07.2010	164	164	100,00	400,48	400,48	100,00	15,10	15,10	100,00	565,77	565,77	100,00
114	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.03.2010	170	170	100,00	380,47	380,47	100,00	12,65	12,65	100,00	642,93	642,93	100,00
115	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	02.06.2010	522	522	100,00	1 743,53	1 743,53	100,00	71,12	71,12	100,00	1 434,45	1 434,45	100,00
116	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	29.07.2010	23	23	100,00	66,76	66,76	100,00	1,99	1,99	100,00	53,99	53,99	100,00
117	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	27.05.2010	23	23	100,00	53,88	53,88	100,00	1,81	1,81	100,00	289,76	289,76	100,00
118	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	19.10.2010	3	3	100,00	8,41	8,41	100,00	0,24	0,24	100,00	23,11	23,11	100,00
	Итого по 2011 году		**7 287**	**6 151**	**84,41**	**23 350,89**	**19 279,47**	**82,56**	**898,66**	**738,03**	**82,13**	**19 421,54**	**16 612,05**	**85,53**
	Центральный федеральный округ		**1 659**	**992**	**59,80**	**4 467,32**	**2 337,45**	**52,32**	**176,45**	**89,19**	**50,55**	**3 290,31**	**2 004,66**	**60,93**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.04.2011	114	114	100,00	281,51	281,51	100,00	10,57	10,57	100,00	214,32	214,32	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	52	52	100,00	69,22	69,22	100,00	2,74	2,74	100,00	147,88	147,88	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.07.2011	82	82	100,00	176,07	176,07	100,00	7,04	7,04	100,00	171,75	171,75	100,00
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	18	0	0,00	100,94	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	55,99	0,00	0,00
5	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	165	165	100,00	440,52	440,52	100,00	17,07	17,07	100,00	301,45	301,45	100,00
6	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.09.2011	131	0	0,00	287,54	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	119,97	0,00	0,00
7	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.08.2011	95	18	18,95	169,31	21,44	12,66	7,17	0,84	11,72	123,54	70,71	57,23
8	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	31.05.2011	56	56	100,00	141,61	141,61	100,00	5,91	5,91	100,00	81,85	81,85	100,00
9	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.08.2011	35	35	100,00	99,64	99,64	100,00	3,22	3,22	100,00	136,88	136,88	100,00
10	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	70	70	100,00	128,53	128,53	100,00	4,91	4,91	100,00	162,12	162,12	100,00
11	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.12.2011	249	0	0,00	1 065,38	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	688,42	8,30	1,21

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
12	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.06.2011	51	51	100,00	42,89	42,89	100,00	1,73	1,73	100,00	73,18	73,18	100,00
13	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	12	12	100,00	9,20	9,20	100,00	0,34	0,34	100,00	14,29	14,29	100,00
14	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	71	71	100,00	173,97	173,97	100,00	7,15	7,15	100,00	135,09	135,09	100,00
15	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.07.2011	40	40	100,00	77,71	77,71	100,00	2,99	2,99	100,00	118,79	118,79	100,00
16	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2011	131	131	100,00	498,51	498,51	100,00	17,54	17,54	100,00	187,58	187,58	100,00
17	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	66	0	0,00	205,26	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	185,44	0,00	0,00
18	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	31.10.2011	126	0	0,00	322,89	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	191,29	0,00	0,00
19	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	95	95	100,00	176,62	176,62	100,00	7,15	7,15	100,00	180,48	180,48	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**1 076**	**983**	**91,36**	**3 852,93**	**3 472,07**	**90,11**	**142,26**	**129,72**	**91,19**	**2 363,84**	**2 145,97**	**90,78**
20	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	38	37	97,37	63,41	62,48	98,53	2,53	2,49	98,30	147,70	147,16	99,63
21	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2011	81	81	100,00	155,93	155,93	100,00	6,83	6,83	100,00	170,81	170,81	100,00
22	ГОРОД САНКТ–ПЕТЕРБУРГ	17.05.2011	377	377	100,00	2 306,14	2 306,14	100,00	83,79	83,79	100,00	866,89	866,89	100,00
23	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2011	76	76	100,00	85,85	85,85	100,00	3,07	3,07	100,00	190,29	190,29	100,00
24	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.09.2011	179	159	88,83	471,73	416,98	88,39	16,97	15,32	90,32	306,68	265,26	86,49
25	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.10.2011	38	0	0,00	246,19	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	104,07	5,51	5,30
26	НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	15.08.2011	55	55	100,00	53,14	53,14	100,00	2,33	2,33	100,00	176,14	176,14	100,00
27	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	36	36	100,00	121,04	121,04	100,00	4,67	4,67	100,00	92,80	92,80	100,00
28	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.08.2011	87	87	100,00	113,12	113,12	100,00	4,22	4,22	100,00	90,30	90,30	100,00
29	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	14.12.2011	34	0	0,00	78,98	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00
30	РЕСПУБЛИКА КОМИ	14.07.2011	75	75	100,00	157,40	157,40	100,00	6,99	6,99	100,00	140,80	140,80	100,00
	Южный федеральный округ		**402**	**400**	**99,50**	**1 127,81**	**1 125,59**	**99,80**	**38,38**	**38,28**	**99,76**	**1 426,88**	**1 423,90**	**99,79**
31	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2011	15	15	100,00	67,10	67,10	100,00	2,44	2,44	100,00	101,79	101,79	100,00
32	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	111	111	100,00	293,47	293,47	100,00	9,19	9,19	100,00	265,52	265,52	100,00
33	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	137	135	98,54	384,15	381,93	99,42	13,84	13,75	99,33	525,05	522,07	99,43
34	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	05.07.2011	30	30	100,00	71,82	71,82	100,00	2,57	2,57	100,00	49,90	49,90	100,00
35	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	27.09.2011	14	14	100,00	25,95	25,95	100,00	1,03	1,03	100,00	31,08	31,08	100,00
36	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2011	95	95	100,00	285,31	285,31	100,00	9,31	9,31	100,00	453,54	453,54	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**240**	**135**	**56,25**	**548,41**	**253,11**	**46,15**	**23,11**	**10,84**	**46,91**	**700,60**	**568,51**	**81,15**
37	КАБАРДИНО–БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	28.10.2011	28	0	0,00	138,15	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
38	КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	20.12.2011	26	0	0,00	55,28	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00
39	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	14.07.2011	42	42	100,00	90,18	90,18	100,00	3,85	3,85	100,00	205,86	205,86	100,00
40	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	25.08.2011	5	5	100,00	10,59	10,59	100,00	0,74	0,74	100,00	30,09	30,09	100,00
41	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	14.07.2011	51	0	0,00	101,87	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	89,14	66,54	74,64
42	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	31.05.2011	88	88	100,00	152,34	152,34	100,00	6,25	6,25	100,00	266,02	266,02	100,00
	Приволжский федеральный округ		**2 360**	**2 302**	**97,54**	**8 303,80**	**8 180,21**	**98,51**	**332,26**	**326,53**	**98,27**	**6 820,76**	**6 718,15**	**98,50**
43	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2011	143	143	100,00	336,83	336,83	100,00	11,67	11,67	100,00	144,51	144,51	100,00
44	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2011	312	312	100,00	980,17	980,17	100,00	37,47	37,47	100,00	423,13	423,13	100,00
45	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	153	153	100,00	361,12	361,12	100,00	13,43	13,43	100,00	230,01	230,01	100,00
46	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.03.2011	53	53	100,00	220,01	220,01	100,00	9,90	9,90	100,00	159,43	159,43	100,00
47	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	179	155	86,59	462,43	405,21	87,63	18,64	15,62	83,79	326,81	307,32	94,04
48	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	06.05.2011	75	75	100,00	410,06	410,06	100,00	17,08	17,08	100,00	398,90	398,90	100,00
49	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	03.06.2011	37	37	100,00	80,34	80,34	100,00	3,67	3,67	100,00	78,44	78,44	100,00
50	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	22.06.2011	54	54	100,00	55,07	55,07	100,00	2,68	2,68	100,00	99,20	99,20	100,00
51	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	24.05.2011	756	756	100,00	3 732,43	3 732,43	100,00	156,34	156,34	100,00	3 758,34	3 758,34	100,00
52	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	65	65	100,00	269,16	269,16	100,00	8,51	8,51	100,00	439,96	439,96	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс.чел.	тыс.чел.		млн. руб.	млн. руб.	
53	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	278	278	100,00	891,98	891,98	100,00	31,08	31,08	100,00	297,31	297,31	100,00
54	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	08.06.2011	74	74	100,00	257,47	257,47	100,00	11,39	11,39	100,00	160,81	160,81	100,00
55	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	83	49	59,04	127,34	60,96	47,87	5,14	2,43	47,19	138,72	55,59	40,08
56	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ	22.08.2011	98	98	100,00	119,40	119,40	100,00	5,29	5,29	100,00	165,20	165,20	100,00
	Уральский федеральный округ		**409**	**335**	**81,91**	**1 159,16**	**952,58**	**82,18**	**46,32**	**37,71**	**81,42**	**1 566,44**	**1 144,26**	**73,05**
57	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	23	12	52,17	30,52	19,32	63,31	1,17	0,82	70,17	111,00	54,19	48,82
58	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.07.2011	125	125	100,00	259,62	259,62	100,00	10,92	10,92	100,00	545,63	545,63	100,00
59	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.12.2011	48	0	0,00	131,48	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	265,55	46,43	17,49
60	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	24.10.2011	15	0	0,00	63,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	196,06	49,81	25,41
61	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	186	186	100,00	618,55	618,55	100,00	23,39	23,39	100,00	377,38	377,38	100,00
62	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	31.05.2011	12	12	100,00	55,09	55,09	100,00	2,58	2,58	100,00	70,82	70,82	100,00
	Сибирский федеральный округ		**844**	**775**	**91,82**	**3 012,20**	**2 357,04**	**78,25**	**108,03**	**84,39**	**78,11**	**2 289,04**	**1 832,57**	**80,06**
63	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	14.07.2011	153	153	100,00	412,58	412,58	100,00	13,90	13,90	100,00	249,01	249,01	100,00
64	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.06.2011	36	36	100,00	126,12	126,12	100,00	4,29	4,29	100,00	161,23	161,23	100,00
65	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	150	150	100,00	504,09	504,09	100,00	14,63	14,63	100,00	271,26	271,26	100,00
66	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2011	143	143	100,00	496,97	496,97	100,00	21,90	21,90	100,00	329,63	329,63	100,00
67	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	19.07.2011	65	3	4,62	587,91	21,28	3,62	21,39	0,56	2,60	419,06	15,70	3,75
68	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2011	63	63	100,00	155,08	155,08	100,00	4,52	4,52	100,00	287,63	287,63	100,00
69	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.07.2011	113	113	100,00	196,01	196,01	100,00	7,05	7,05	100,00	231,05	231,05	100,00
70	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	17.05.2011	7	7	100,00	13,59	13,59	100,00	0,56	0,56	100,00	30,55	30,55	100,00
71	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	15.08.2011	56	56	100,00	113,75	113,75	100,00	2,74	2,74	100,00	85,66	85,66	100,00
72	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	22.06.2011	15	15	100,00	30,57	30,57	100,00	1,47	1,47	100,00	31,26	31,26	100,00
73	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	14.11.2011	7	0	0,00	88,52	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00
74	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2011	36	36	100,00	287,01	287,01	100,00	12,79	12,79	100,00	139,61	139,61	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**297**	**229**	**77,10**	**879,26**	**601,43**	**68,40**	**31,85**	**21,36**	**67,06**	**963,66**	**774,03**	**80,32**
75	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	36	36	100,00	86,62	86,62	100,00	2,36	2,36	100,00	90,95	90,95	100,00
76	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	14.04.2011	8	8	100,00	23,02	23,02	100,00	0,63	0,63	100,00	30,01	30,01	100,00
77	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	08.07.2011	21	21	100,00	37,09	37,09	100,00	1,41	1,41	100,00	38,93	38,93	100,00
78	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	14.09.2011	78	10	12,82	301,56	23,73	7,87	11,41	0,92	8,02	254,05	64,42	25,36
79	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	04.08.2011	57	57	100,00	130,97	130,97	100,00	5,01	5,01	100,00	175,32	175,32	100,00
80	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.04.2011	14	14	100,00	29,39	29,39	100,00	1,13	1,13	100,00	72,66	72,66	100,00
81	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	14.07.2011	36	36	100,00	158,10	158,10	100,00	5,77	5,77	100,00	139,50	139,50	100,00
82	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	05.07.2011	3	3	100,00	8,48	8,48	100,00	0,24	0,24	100,00	45,87	45,87	100,00
83	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	22.08.2011	44	44	100,00	104,02	104,02	100,00	3,90	3,90	100,00	116,37	116,37	100,00

Информация о реализации региональных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильных муниципальных образованиях

№ п/п	Наименование ФО	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс. чел.	тыс. чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**1 096**	**1 096**	**100,00**	**5 951,97**	**5 951,97**	**100,00**	**230,70**	**230,70**	**100,00**	**5 797,32**	**5 797,32**	**100,00**
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ		**7**	**7**	**100,00**	**57,21**	**57,21**	**100,00**	**2,43**	**2,43**	**100,00**	**44,92**	**44,92**	**100,00**
1	Город Северодвинск	24.12.2010	7	7	100,00	57,21	57,21	100,00	2,43	2,43	100,00	44,92	44,92	100,00
	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ		**5**	**5**	**100,00**	**4,59**	**4,59**	**100,00**	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**11,27**	**11,27**	**100,00**
2	Город Сураж	24.12.2010	5	5	100,00	4,59	4,59	100,00	0,19	0,19	100,00	11,27	11,27	100,00
	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ		**42**	**42**	**100,00**	**134,05**	**134,05**	**100,00**	**4,78**	**4,78**	**100,00**	**124,10**	**124,10**	**100,00**
3	Город Сокол	04.06.2010	25	25	100,00	43,20	43,20	100,00	1,67	1,67	100,00	76,14	76,14	100,00
4	Город Череповец	30.11.2010	17	17	100,00	90,85	90,85	100,00	3,11	3,11	100,00	47,96	47,96	100,00
	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ		**17**	**17**	**100,00**	**36,40**	**36,40**	**100,00**	**1,05**	**1,05**	**100,00**	**58,04**	**58,04**	**100,00**
5	Город Семилуки	30.07.2010	17	17	100,00	36,40	36,40	100,00	1,05	1,05	100,00	58,04	58,04	100,00
	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ		**29**	**29**	**100,00**	**29,48**	**29,48**	**100,00**	**0,97**	**0,97**	**100,00**	**75,24**	**75,24**	**100,00**
6	Город Байкальск	30.07.2010	15	15	100,00	14,64	14,64	100,00	0,58	0,58	100,00	29,83	29,83	100,00
7	Город Усть–Илимск	24.12.2010	14	14	100,00	14,84	14,84	100,00	0,39	0,39	100,00	45,41	45,41	100,00
	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		**165**	**165**	**100,00**	**783,02**	**783,02**	**100,00**	**22,25**	**22,25**	**100,00**	**451,22**	**451,22**	**100,00**
8	Город Прокопиевск	30.07.2010	82	82	100,00	429,45	429,45	100,00	10,88	10,88	100,00	346,49	346,49	100,00
9	Город Ленинск–Кузнецкий	30.07.2010	47	47	100,00	220,63	220,63	100,00	6,07	6,07	100,00	65,38	65,38	100,00
10	Город Таштагол	30.11.2010	36	36	100,00	132,93	132,93	100,00	5,31	5,31	100,00	39,34	39,34	100,00
	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		**56**	**56**	**100,00**	**159,67**	**159,67**	**100,00**	**6,18**	**6,18**	**100,00**	**81,65**	**81,65**	**100,00**
11	Город Вятские Поляны	30.07.2010	56	56	100,00	159,67	159,67	100,00	6,18	6,18	100,00	81,65	81,65	100,00
	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ		**12**	**12**	**100,00**	**51,10**	**51,10**	**100,00**	**1,44**	**1,44**	**100,00**	**32,40**	**32,40**	**100,00**
12	Город Пикалево	30.07.2010	12	12	100,00	51,10	51,10	100,00	1,44	1,44	100,00	32,40	32,40	100,00
	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ		**8**	**8**	**100,00**	**39,53**	**39,53**	**100,00**	**1,29**	**1,29**	**100,00**	**46,75**	**46,75**	**100,00**
13	Город Ковдор	22.10.2010	8	8	100,00	39,53	39,53	100,00	1,29	1,29	100,00	46,75	46,75	100,00
	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ		**77**	**77**	**100,00**	**202,08**	**202,08**	**100,00**	**7,77**	**7,77**	**100,00**	**234,04**	**234,04**	**100,00**
14	Город Павлово	30.07.2010	39	39	100,00	94,54	94,54	100,00	3,23	3,23	100,00	146,59	146,59	100,00
15	Город Заволжье	30.07.2010	38	38	100,00	107,53	107,53	100,00	4,55	4,55	100,00	87,45	87,45	100,00
	ПЕРМСКИЙ КРАЙ		**44**	**44**	**100,00**	**131,09**	**131,09**	**100,00**	**5,09**	**5,09**	**100,00**	**99,54**	**99,54**	**100,00**
16	Чусовское	20.09.2010	34	34	100,00	120,75	120,75	100,00	4,66	4,66	100,00	87,87	87,87	100,00
17	Красновишерское	30.11.2010	10	10	100,00	10,34	10,34	100,00	0,43	0,43	100,00	11,68	11,68	100,00
	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ		**18**	**18**	**100,00**	**89,03**	**89,03**	**100,00**	**3,40**	**3,40**	**100,00**	**118,39**	**118,39**	**100,00**
18	Светлогорское	23.09.2010	2	2	100,00	7,87	7,87	100,00	0,28	0,28	100,00	3,89	3,89	100,00
19	Дальнегорский	23.09.2010	16	16	100,00	81,16	81,16	100,00	3,12	3,12	100,00	114,49	114,49	100,00
	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)		**216**	**216**	**100,00**	**2 376,62**	**2 376,62**	**100,00**	**102,12**	**102,12**	**100,00**	**1 621,81**	**1 621,81**	**100,00**
20	Город Набережные Челны	30.07.2010	197	197	100,00	2 286,14	2 286,14	100,00	97,53	97,53	100,00	1 535,68	1 535,68	100,00
21	Город Камские Поляны	30.07.2010	10	10	100,00	62,02	62,02	100,00	3,33	3,33	100,00	39,18	39,18	100,00
22	Город Чистополь	24.12.2010	9	9	100,00	28,46	28,46	100,00	1,26	1,26	100,00	46,96	46,96	100,00
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		**26**	**26**	**100,00**	**39,38**	**39,38**	**100,00**	**1,43**	**1,43**	**100,00**	**76,02**	**76,02**	**100,00**
23	Город Гуково	30.07.2010	26	26	100,00	39,38	39,38	100,00	1,43	1,43	100,00	76,02	76,02	100,00
	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ		**62**	**62**	**100,00**	**567,68**	**567,68**	**100,00**	**23,17**	**23,17**	**100,00**	**982,62**	**982,62**	**100,00**
24	Город Тольятти	04.06.2010	62	62	100,00	567,68	567,68	100,00	23,17	23,17	100,00	982,62	982,62	100,00

№ п/п	Наименование ФО	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь дома			Численность жителей в МКД			Стоимость капитального ремонта		
			план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		тыс. кв. м	тыс. кв. м		тыс. чел.	тыс. чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ		**244**	**244**	**100,00**	**1 025,07**	**1 025,07**	**100,00**	**37,69**	**37,69**	**100,00**	**1 537,70**	**1 537,70**	**100,00**
25	Город Нижний Тагил	04.06.2010	116	116	100,00	589,43	589,43	100,00	20,47	20,47	100,00	834,85	834,85	100,00
26	Город Асбест	30.07.2010	26	26	100,00	83,37	83,37	100,00	3,71	3,71	100,00	203,72	203,72	100,00
27	Город Каменск–Уральский	30.07.2010	102	102	100,00	352,27	352,27	100,00	13,52	13,52	100,00	499,14	499,14	100,00
	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ		**11**	**11**	**100,00**	**23,61**	**23,61**	**100,00**	**0,89**	**0,89**	**100,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**
28	Город Карабаш	20.09.2010	9	9	100,00	22,44	22,44	100,00	0,85	0,85	100,00	22,85	22,85	100,00
29	Город Сатка	20.09.2010	2	2	100,00	1,17	1,17	100,00	0,04	0,04	100,00	2,15	2,15	100,00
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ		**6**	**6**	**100,00**	**39,52**	**39,52**	**100,00**	**1,96**	**1,96**	**100,00**	**46,32**	**46,32**	**100,00**
30	Город Новочебоксарск	24.12.2010	6	6	100,00	39,52	39,52	100,00	1,96	1,96	100,00	46,32	46,32	100,00
	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ		**51**	**51**	**100,00**	**162,84**	**162,84**	**100,00**	**6,62**	**6,62**	**100,00**	**130,27**	**130,27**	**100,00**
31	Город Тутаев	09.09.2010	25	25	100,00	82,26	82,26	100,00	3,37	3,37	100,00	78,44	78,44	100,00
32	Город Гаврилов–Ям	09.09.2010	17	17	100,00	44,11	44,11	100,00	1,93	1,93	100,00	26,49	26,49	100,00
33	Город Ростов	30.11.2010	9	9	100,00	36,46	36,46	100,00	1,32	1,32	100,00	25,34	25,34	100,00

Информация о реализации региональных адресных программ переселения из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**9 659**	**6 757**	**69,96**	**2 449 642**	**1 738 653**	**70,98**	**63 455**	**44 149**	**69,58**	**165 383**	**115 226**	**2 344**	**117 570**	**71,09**	**65 751,82**	**47 416,49**	**72,11**
	Итого по 2008 году		**2 081**	**2 063**	**99,14**	**468 489,41**	**466 576,74**	**99,59**	**12 276**	**12 232**	**99,64**	**31 817**	**31 690**	**127**	**31 817**	**100,00**	**13 678,31**	**13 678,31**	**100,00**
	Центральный федеральный округ		**555**	**553**	**99,64**	**105 860,54**	**105 780,00**	**99,92**	**2 829**	**2 827**	**99,93**	**6 947**	**6 935**	**12**	**6 947**	**100,00**	**3 010,76**	**3 010,76**	**100,00**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	16	16	100,00	4 291,40	4 291,40	100,00	90	90	100,00	228	228	0	228	100,00	152,62	152,62	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.07.2008	21	21	100,00	2 231,60	2 231,60	100,00	65	65	100,00	139	139	0	139	100,00	56,25	56,25	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2008	15	15	100,00	3 138,70	3 138,70	100,00	82	82	100,00	216	216	0	216	100,00	112,28	112,28	100,00
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.09.2008	10	10	100,00	2 102,44	2 102,44	100,00	51	51	100,00	143	143	0	143	100,00	57,99	57,99	100,00
5	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	30	28	93,33	12 210,77	12 130,23	99,34	328	326	99,39	877	865	12	877	100,00	352,33	352,33	100,00
6	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.03.2008	54	54	100,00	9 310,30	9 310,30	100,00	268	268	100,00	641	641	0	641	100,00	294,63	294,63	100,00
7	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2008	50	50	100,00	7 355,69	7 355,69	100,00	194	194	100,00	434	434	0	434	100,00	183,45	183,45	100,00
8	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2008	17	17	100,00	2 301,62	2 301,62	100,00	77	77	100,00	211	211	0	211	100,00	83,18	83,18	100,00
9	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	14.04.2008	33	33	100,00	11 120,67	11 120,67	100,00	311	311	100,00	820	820	0	820	100,00	225,75	225,75	100,00
10	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	41	41	100,00	12 724,00	12 724,00	100,00	346	346	100,00	934	934	0	934	100,00	301,99	301,99	100,00
11	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	3	3	100,00	999,60	999,60	100,00	25	25	100,00	69	69	0	69	100,00	59,90	59,90	100,00
12	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	15	15	100,00	3 221,20	3 221,20	100,00	96	96	100,00	187	187	0	187	100,00	64,82	64,82	100,00
13	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	20	20	100,00	2 592,83	2 592,83	100,00	64	64	100,00	167	167	0	167	100,00	96,48	96,48	100,00
14	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	20	20	100,00	2 639,27	2 639,27	100,00	74	74	100,00	158	158	0	158	100,00	117,46	117,46	100,00
15	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	160	160	100,00	18 068,35	18 068,35	100,00	481	481	100,00	997	997	0	997	100,00	483,17	483,17	100,00
16	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	33	33	100,00	8 150,20	8 150,20	100,00	195	195	100,00	528	528	0	528	100,00	267,57	267,57	100,00
17	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.11.2008	17	17	100,00	3 401,90	3 401,90	100,00	82	82	100,00	198	198	0	198	100,00	100,89	100,89	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**248**	**242**	**97,58**	**45 028,06**	**43 682,96**	**97,01**	**1 198**	**1 171**	**97,75**	**3 010**	**2 951**	**59**	**3 010**	**100,00**	**1 545,27**	**1 545,27**	**100,00**
18	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	21.10.2008	35	35	100,00	6 634,16	6 634,16	100,00	164	164	100,00	378	378	0	378	100,00	223,22	223,22	100,00
19	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.09.2008	12	12	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	90	90	100,00	230	230	0	230	100,00	108,98	108,98	100,00
20	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	13	13	100,00	1 632,28	1 632,28	100,00	43	43	100,00	136	136	0	136	100,00	48,84	48,84	100,00
21	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.08.2008	35	32	91,43	10 326,33	9 964,90	96,50	288	280	97,22	612	595	17	612	100,00	469,02	469,02	100,00
22	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.11.2008	10	9	90,00	3 032,39	2 804,96	92,50	81	76	93,83	168	158	10	168	100,00	131,54	131,54	100,00
23	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	7	7	100,00	918,40	918,40	100,00	24	24	100,00	79	79	0	79	100,00	32,53	32,53	100,00
24	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	2	2	100,00	234,80	234,80	100,00	6	6	100,00	8	8	0	8	100,00	5,15	5,15	100,00
25	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.12.2008	13	13	100,00	1 489,30	1 489,30	100,00	56	56	100,00	87	87	0	87	100,00	42,78	42,78	100,00
26	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	30.09.2008	10	9	90,00	2 780,00	2 556,80	91,97	55	50	90,91	175	170	5	175	100,00	108,34	108,34	100,00
27	РЕСПУБЛИКА КОМИ	29.07.2008	111	110	99,10	14 406,40	13 873,36	96,30	391	382	97,70	1 137	1 110	27	1 137	100,00	374,89	374,89	100,00
	Южный федеральный округ		**92**	**86**	**93,48**	**23 519,78**	**23 309,65**	**99,11**	**579**	**573**	**98,96**	**1 517**	**1 499**	**18**	**1 517**	**100,00**	**715,97**	**715,97**	**100,00**
28	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2008	11	9	81,82	1 669,10	1 545,57	92,60	45	42	93,33	130	119	11	130	100,00	41,82	41,82	100,00
29	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	30	30	100,00	7 424,70	7 424,70	100,00	184	184	100,00	467	467	0	467	100,00	261,39	261,39	100,00
30	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	21.10.2008	7	7	100,00	3 852,98	3 852,98	100,00	75	75	100,00	215	215	0	215	100,00	47,25	47,25	100,00
31	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.04.2008	44	40	90,91	10 573,00	10 486,40	99,18	275	272	98,91	705	698	7	705	100,00	365,52	365,52	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**20**	**20**	**100,00**	**7 333,23**	**7 333,23**	**100,00**	**148**	**148**	**100,00**	**434**	**434**	**0**	**434**	**100,00**	**171,17**	**171,17**	**100,00**

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
32	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	16.07.2008	7	7	100,00	1 838,20	1 838,20	100,00	52	52	100,00	127	127	0	127	100,00	38,32	38,32	100,00
33	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	05.08.2008	13	13	100,00	5 495,03	5 495,03	100,00	96	96	100,00	307	307	0	307	100,00	132,85	132,85	100,00
	Приволжский федеральный округ		**535**	**531**	**99,25**	**122 058,06**	**121 781,16**	**99,77**	**3 527**	**3 518**	**99,74**	**8 990**	**8 952**	**38**	**8 990**	**100,00**	**3 577,61**	**3 577,61**	**100,00**
34	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2008	41	41	100,00	4 947,36	4 947,36	100,00	140	140	100,00	324	324	0	324	100,00	113,79	113,79	100,00
35	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	31	31	100,00	4 835,85	4 835,85	100,00	139	139	100,00	321	321	0	321	100,00	121,09	121,09	100,00
36	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	5	5	100,00	526,98	526,98	100,00	17	17	100,00	50	50	0	50	100,00	11,54	11,54	100,00
37	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.11.2008	79	79	100,00	15 962,58	15 962,58	100,00	475	475	100,00	1 073	1 073	0	1 073	100,00	622,26	622,26	100,00
38	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	43	43	100,00	6 542,19	6 542,19	100,00	173	173	100,00	445	445	0	445	100,00	198,56	198,56	100,00
39	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	46	46	100,00	10 863,00	10 863,00	100,00	257	257	100,00	655	655	0	655	100,00	311,96	311,96	100,00
40	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2008	7	7	100,00	1 448,40	1 448,40	100,00	39	39	100,00	91	91	0	91	100,00	37,85	37,85	100,00
41	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	7	7	100,00	2 071,90	2 071,90	100,00	56	56	100,00	97	97	0	97	100,00	40,34	40,34	100,00
42	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	04.06.2008	57	53	92,98	20 323,09	20 046,19	98,64	682	673	98,68	1 812	1 774	38	1 812	100,00	604,21	604,21	100,00
43	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	29.05.2008	28	28	100,00	4 180,79	4 180,79	100,00	114	114	100,00	293	293	0	293	100,00	96,57	96,57	100,00
44	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	08.07.2008	13	13	100,00	2 754,29	2 754,29	100,00	79	79	100,00	235	235	0	235	100,00	93,65	93,65	100,00
45	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	11.06.2008	30	30	100,00	8 094,50	8 094,50	100,00	166	166	100,00	437	437	0	437	100,00	186,90	186,90	100,00
46	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.04.2008	37	37	100,00	12 776,67	12 776,67	100,00	337	337	100,00	980	980	0	980	100,00	358,17	358,17	100,00
47	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2008	37	37	100,00	15 110,34	15 110,34	100,00	497	497	100,00	1 079	1 079	0	1 079	100,00	415,09	415,09	100,00
48	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	14.08.2008	35	35	100,00	6 586,54	6 586,54	100,00	186	186	100,00	624	624	0	624	100,00	225,12	225,12	100,00
49	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	18.12.2008	39	39	100,00	5 033,58	5 033,58	100,00	170	170	100,00	474	474	0	474	100,00	140,49	140,49	100,00
	Уральский федеральный округ		**103**	**103**	**100,00**	**23 293,39**	**23 293,39**	**100,00**	**608**	**608**	**100,00**	**1 543**	**1 543**	**0**	**1 543**	**100,00**	**796,12**	**796,12**	**100,00**
50	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	32	32	100,00	7 616,90	7 616,90	100,00	243	243	100,00	513	513	0	513	100,00	239,34	239,34	100,00
51	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	02.09.2008	26	26	100,00	6 487,70	6 487,70	100,00	155	155	100,00	415	415	0	415	100,00	183,85	183,85	100,00
52	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.10.2008	32	32	100,00	6 298,49	6 298,49	100,00	156	156	100,00	444	444	0	444	100,00	223,79	223,79	100,00
53	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	29.10.2008	13	13	100,00	2 890,30	2 890,30	100,00	54	54	100,00	171	171	0	171	100,00	149,14	149,14	100,00
	Сибирский федеральный округ		**507**	**507**	**100,00**	**133 563,75**	**133 563,75**	**100,00**	**3 224**	**3 224**	**100,00**	**8 930**	**8 930**	**0**	**8 930**	**100,00**	**3 714,71**	**3 714,71**	**100,00**
54	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.07.2008	21	21	100,00	2 690,40	2 690,40	100,00	62	62	100,00	190	190	0	190	100,00	70,81	70,81	100,00
55	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.10.2008	43	43	100,00	17 284,59	17 284,59	100,00	378	378	100,00	855	855	0	855	100,00	480,77	480,77	100,00
56	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.03.2008	75	75	100,00	21 729,00	21 729,00	100,00	519	519	100,00	1 369	1 369	0	1 369	100,00	521,52	521,52	100,00
57	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2008	100	100	100,00	18 424,00	18 424,00	100,00	454	454	100,00	1 223	1 223	0	1 223	100,00	432,64	432,64	100,00
58	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	04.06.2008	83	83	100,00	21 038,20	21 038,20	100,00	522	522	100,00	1 429	1 429	0	1 429	100,00	597,22	597,22	100,00
59	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2008	68	68	100,00	22 189,12	22 189,12	100,00	539	539	100,00	1 652	1 652	0	1 652	100,00	843,51	843,51	100,00
60	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.05.2008	28	28	100,00	5 940,25	5 940,25	100,00	151	151	100,00	412	412	0	412	100,00	174,31	174,31	100,00
61	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	16.07.2008	21	21	100,00	7 455,64	7 455,64	100,00	194	194	100,00	509	509	0	509	100,00	172,20	172,20	100,00
62	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	02.09.2008	13	13	100,00	4 626,76	4 626,76	100,00	109	109	100,00	317	317	0	317	100,00	88,15	88,15	100,00
63	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	22.07.2008	10	10	100,00	3 350,30	3 350,30	100,00	77	77	100,00	186	186	0	186	100,00	54,54	54,54	100,00
64	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.09.2008	45	45	100,00	8 835,49	8 835,49	100,00	219	219	100,00	788	788	0	788	100,00	279,04	279,04	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	Дальневосточный федеральный округ		**21**	**21**	**100,00**	**7 832,60**	**7 832,60**	**100,00**	**163**	**163**	**100,00**	**446**	**446**	**0**	**446**	**100,00**	**146,69**	**146,69**	**100,00**
65	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	13.05.2008	3	3	100,00	816,10	816,10	100,00	20	20	100,00	44	44	0	44	100,00	21,58	21,58	100,00
66	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	14.08.2008	7	7	100,00	1 634,80	1 634,80	100,00	38	38	100,00	106	106	0	106	100,00	48,12	48,12	100,00
67	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	11.06.2008	11	11	100,00	5 381,70	5 381,70	100,00	105	105	100,00	296	296	0	296	100,00	76,99	76,99	100,00
	Итого по 2009 году		**2 218**	**2 093**	**94,36**	**554 696,39**	**534 888,67**	**96,43**	**14 466**	**13 946**	**96,41**	**37 299**	**35 811**	**1 488**	**37 299**	**100,00**	**14 918,31**	**14 918,31**	**100,00**
	Центральный федеральный округ		**747**	**717**	**95,98**	**158 787,11**	**158 483,41**	**99,81**	**4 427**	**4 421**	**99,86**	**10 674**	**10 660**	**14**	**10 674**	**100,00**	**4 437,66**	**4 437,66**	**100,00**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	149	149	100,00	43 957,15	43 957,15	100,00	1 180	1 180	100,00	3 064	3 064	0	3 064	100,00	1 127,48	1 127,48	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.05.2009	99	99	100,00	14 597,32	14 597,32	100,00	435	435	100,00	1 101	1 101	0	1 101	100,00	435,73	435,73	100,00
3	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.09.2009	40	39	97,50	11 980,00	11 932,20	99,60	333	332	99,70	690	688	2	690	100,00	341,66	341,66	100,00
4	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2009	39	39	100,00	6 440,81	6 440,81	100,00	163	163	100,00	395	395	0	395	100,00	193,22	193,22	100,00
5	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.05.2009	50	50	100,00	5 734,72	5 734,72	100,00	160	160	100,00	372	372	0	372	100,00	153,59	153,59	100,00
6	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	28.04.2009	90	64	71,11	23 547,76	23 547,76	100,00	662	662	100,00	1 823	1 823	0	1 823	100,00	663,75	663,75	100,00
7	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.09.2009	6	6	100,00	838,30	838,30	100,00	22	22	100,00	61	61	0	61	100,00	22,50	22,50	100,00
8	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.04.2009	126	123	97,62	22 816,39	22 560,49	98,88	642	637	99,22	1 273	1 261	12	1 273	100,00	625,93	625,93	100,00
9	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.05.2009	83	83	100,00	15 221,56	15 221,56	100,00	453	453	100,00	988	988	0	988	100,00	445,03	445,03	100,00
10	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2009	65	65	100,00	13 653,10	13 653,10	100,00	377	377	100,00	907	907	0	907	100,00	428,76	428,76	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**109**	**109**	**100,00**	**22 817,69**	**22 817,69**	**100,00**	**576**	**576**	**100,00**	**1 413**	**1 413**	**0**	**1 413**	**100,00**	**649,48**	**649,48**	**100,00**
11	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.07.2009	20	20	100,00	3 916,30	3 916,30	100,00	99	99	100,00	252	252	0	252	100,00	107,42	107,42	100,00
12	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.08.2009	8	8	100,00	1 019,70	1 019,70	100,00	22	22	100,00	70	70	0	70	100,00	29,67	29,67	100,00
13	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2009	22	22	100,00	7 993,29	7 993,29	100,00	184	184	100,00	418	418	0	418	100,00	233,43	233,43	100,00
14	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	15.09.2009	29	29	100,00	4 142,50	4 142,50	100,00	120	120	100,00	266	266	0	266	100,00	117,50	117,50	100,00
15	РЕСПУБЛИКА КОМИ	04.08.2009	30	30	100,00	5 745,90	5 745,90	100,00	151	151	100,00	407	407	0	407	100,00	161,46	161,46	100,00
	Южный федеральный округ		**52**	**51**	**98,08**	**9 252,96**	**9 101,76**	**98,37**	**232**	**229**	**98,71**	**619**	**612**	**7**	**619**	**100,00**	**261,71**	**261,71**	**100,00**
16	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.07.2009	52	51	98,08	9 252,96	9 101,76	98,37	232	229	98,71	619	612	7	619	100,00	261,71	261,71	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**85**	**77**	**90,59**	**35 988,35**	**35 384,70**	**98,32**	**783**	**769**	**98,21**	**2 303**	**2 249**	**54**	**2 303**	**100,00**	**948,99**	**948,99**	**100,00**
17	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	15.09.2009	16	16	100,00	2 025,80	2 025,80	100,00	58	58	100,00	163	163	0	163	100,00	48,62	48,62	100,00
18	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	26.05.2009	31	31	100,00	14 527,22	14 527,22	100,00	276	276	100,00	866	866	0	866	100,00	398,83	398,83	100,00
19	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ	21.08.2009	38	30	78,95	19 435,33	18 831,68	96,89	449	435	96,88	1 274	1 220	54	1 274	100,00	501,54	501,54	100,00
	Приволжский федеральный округ		**612**	**526**	**85,95**	**191 394,20**	**172 645,03**	**90,20**	**5 099**	**4 602**	**90,25**	**13 305**	**11 892**	**1 413**	**13 305**	**100,00**	**5 120,74**	**5 120,74**	**100,00**
20	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.08.2009	27	27	100,00	3 204,80	3 204,80	100,00	83	83	100,00	206	206	0	206	100,00	81,05	81,05	100,00
21	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	29	29	100,00	4 792,76	4 792,76	100,00	104	104	100,00	276	276	0	276	100,00	138,82	138,82	100,00
22	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	43	43	100,00	11 921,29	11 921,29	100,00	310	310	100,00	788	788	0	788	100,00	405,50	405,50	100,00
23	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	30.03.2009	58	58	100,00	16 676,85	16 676,85	100,00	516	516	100,00	1 269	1 269	0	1 269	100,00	479,75	479,75	100,00
24	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	26.03.2009	87	72	82,76	37 452,20	36 046,40	96,25	919	895	97,39	2 589	2 489	100	2 589	100,00	927,46	927,46	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
25	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	10.04.2009	27	27	100,00	2 890,05	2 890,05	100,00	89	89	100,00	235	235	0	235	100,00	80,13	80,13	100,00
26	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	28.04.2009	19	19	100,00	4 666,00	4 666,00	100,00	135	135	100,00	395	395	0	395	100,00	124,37	124,37	100,00
27	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	26.05.2009	21	21	100,00	4 356,70	4 356,70	100,00	104	104	100,00	206	206	0	206	100,00	106,44	106,44	100,00
28	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.07.2009	131	80	61,07	39 334,40	23 612,40	60,03	1 102	667	60,53	2 735	1 532	1 203	2 735	100,00	1 093,41	1 093,41	100,00
29	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	122	104	85,25	59 181,55	57 985,55	97,98	1 520	1 487	97,83	4 025	3 927	98	4 025	100,00	1 492,59	1 492,59	100,00
30	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	24.07.2009	48	46	95,83	6 917,60	6 492,23	93,85	217	212	97,70	581	569	12	581	100,00	191,21	191,21	100,00
	Уральский федеральный округ		**34**	**34**	**100,00**	**4 666,40**	**4 666,40**	**100,00**	**153**	**153**	**100,00**	**349**	**349**	**0**	**349**	**100,00**	**139,99**	**139,99**	**100,00**
31	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2009	34	34	100,00	4 666,40	4 666,40	100,00	153	153	100,00	349	349	0	349	100,00	139,99	139,99	100,00
	Сибирский федеральный округ		**505**	**505**	**100,00**	**111 473,52**	**111 473,52**	**100,00**	**2 732**	**2 732**	**100,00**	**7 372**	**7 372**	**0**	**7 372**	**100,00**	**2 857,84**	**2 857,84**	**100,00**
32	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.05.2009	139	139	100,00	21 101,78	21 101,78	100,00	530	530	100,00	1 659	1 659	0	1 659	100,00	589,69	589,69	100,00
33	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	234	234	100,00	59 488,94	59 488,94	100,00	1 403	1 403	100,00	3 725	3 725	0	3 725	100,00	1 354,15	1 354,15	100,00
34	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	65	65	100,00	16 951,15	16 951,15	100,00	429	429	100,00	1 104	1 104	0	1 104	100,00	562,50	562,50	100,00
35	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	22.07.2009	5	5	100,00	1 861,60	1 861,60	100,00	46	46	100,00	117	117	0	117	100,00	50,91	50,91	100,00
36	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	28.04.2009	24	24	100,00	3 551,26	3 551,26	100,00	83	83	100,00	185	185	0	185	100,00	82,97	82,97	100,00
37	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.07.2009	38	38	100,00	8 518,79	8 518,79	100,00	241	241	100,00	582	582	0	582	100,00	217,63	217,63	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**74**	**74**	**100,00**	**20 316,16**	**20 316,16**	**100,00**	**464**	**464**	**100,00**	**1 264**	**1 264**	**0**	**1 264**	**100,00**	**501,90**	**501,90**	**100,00**
38	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	14	14	100,00	3 759,00	3 759,00	100,00	101	101	100,00	294	294	0	294	100,00	107,20	107,20	100,00
39	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.11.2009	7	7	100,00	1 424,66	1 424,66	100,00	36	36	100,00	89	89	0	89	100,00	42,63	42,63	100,00
40	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	17.03.2009	53	53	100,00	15 132,50	15 132,50	100,00	327	327	100,00	881	881	0	881	100,00	352,08	352,08	100,00
	Итого по 2010 году		**2 484**	**2 024**	**81,48**	**648 401,45**	**563 573,38**	**86,92**	**16 019**	**13 741**	**85,78**	**42 523**	**36 620**	**458**	**37 078**	**87,20**	**16 653,97**	**14 261,97**	**85,64**
	Центральный федеральный округ		**509**	**433**	**85,07**	**128 250,96**	**112 286,96**	**87,55**	**3 346**	**2 908**	**86,91**	**8 068**	**6 972**	**75**	**7 047**	**87,35**	**3 342,67**	**2 926,75**	**87,56**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.07.2010	47	47	100,00	13 945,91	13 945,91	100,00	356	356	100,00	861	861	0	861	100,00	355,95	355,95	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2010	62	62	100,00	8 342,86	8 342,86	100,00	228	228	100,00	537	537	0	537	100,00	223,00	223,00	100,00
3	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	71	67	94,37	19 825,23	19 457,10	98,14	527	515	97,72	1 212	1 195	17	1 212	100,00	487,83	487,83	100,00
4	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	4	2	50,00	2 028,80	1 870,70	92,21	46	43	93,48	107	97	10	107	100,00	50,51	50,51	100,00
5	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.02.2010	23	23	100,00	4 309,40	4 309,40	100,00	120	120	100,00	273	273	0	273	100,00	126,01	126,01	100,00
6	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	44	44	100,00	8 715,68	8 715,68	100,00	225	225	100,00	649	649	0	649	100,00	232,33	232,33	100,00
7	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.04.2010	4	4	100,00	558,90	558,90	100,00	16	16	100,00	35	35	0	35	100,00	13,50	13,50	100,00
8	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	2	2	100,00	698,13	698,13	100,00	13	13	100,00	30	30	0	30	100,00	16,86	16,86	100,00
9	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.07.2010	58	58	100,00	16 973,23	16 973,23	100,00	394	394	100,00	954	954	0	954	100,00	407,43	407,43	100,00
10	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	25	25	100,00	6 277,00	6 277,00	100,00	183	183	100,00	430	430	0	430	100,00	147,20	147,20	100,00
11	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2010	122	57	46,72	35 512,95	21 424,48	60,33	931	545	58,54	2 245	1 271	22	1 293	57,59	958,14	574,76	59,99
12	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2010	4	1	25,00	1 458,50	287,90	19,74	37	5	13,51	85	16	0	16	18,82	40,32	7,77	19,28
13	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	24	22	91,67	6 663,52	6 484,82	97,32	188	183	97,34	460	434	26	460	100,00	196,42	196,42	100,00
14	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.11.2010	19	19	100,00	2 940,85	2 940,85	100,00	82	82	100,00	190	190	0	190	100,00	87,19	87,19	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**387**	**306**	**79,07**	**76 385,58**	**55 225,97**	**72,30**	**1 835**	**1 340**	**73,02**	**4 629**	**3 365**	**34**	**3 399**	**73,43**	**2 159,37**	**1 554,82**	**72,00**
15	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2010	96	81	84,38	18 491,75	12 870,88	69,60	434	307	70,74	1 097	778	7	785	71,56	531,62	364,11	68,49

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
16	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	3	0	0,00	1 552,40	1 142,80	73,62	36	28	77,78	81	47	0	47	58,02	44,63	32,18	72,10
17	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.11.2010	42	23	54,76	7 638,20	4 229,90	55,38	178	96	53,93	397	207	6	213	53,65	219,60	121,60	55,37
18	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	2	2	100,00	193,55	193,55	100,00	5	5	100,00	16	16	0	16	100,00	4,63	4,63	100,00
19	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	61	36	59,02	14 736,99	8 034,62	54,52	373	204	54,69	956	534	9	543	56,80	442,11	244,61	55,33
20	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	33	27	81,82	6 129,20	4 752,97	77,55	118	86	72,88	279	215	5	220	78,85	147,10	128,67	87,47
21	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.11.2010	42	42	100,00	6 688,80	6 688,80	100,00	187	187	100,00	513	513	0	513	100,00	193,24	193,24	100,00
22	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	17.06.2010	28	25	89,29	7 088,30	5 581,06	78,74	153	121	79,08	398	298	0	298	74,87	208,20	153,22	73,60
23	РЕСПУБЛИКА КОМИ	04.06.2010	80	70	87,50	13 866,39	11 731,39	84,60	351	306	87,18	892	757	7	764	85,65	368,24	312,56	84,88
	Южный федеральный округ		**253**	**148**	**58,50**	**60 883,32**	**47 298,30**	**77,69**	**1 522**	**1 180**	**77,53**	**4 281**	**3 437**	**56**	**3 493**	**81,59**	**1 658,63**	**1 312,74**	**79,15**
24	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.08.2010	21	14	66,67	5 635,35	5 287,85	93,83	151	142	94,04	424	387	37	424	100,00	132,07	132,07	100,00
25	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.04.2010	85	85	100,00	24 206,16	24 206,16	100,00	583	583	100,00	1 856	1 856	0	1 856	100,00	674,85	674,85	100,00
26	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	16.07.2010	36	36	100,00	6 250,60	6 250,60	100,00	167	167	100,00	480	480	0	480	100,00	187,38	187,38	100,00
27	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.03.2010	111	13	11,71	24 791,21	11 553,69	46,60	621	288	46,38	1 521	714	19	733	48,19	664,33	318,44	47,93
	Северо-Кавказский федеральный округ		**143**	**59**	**41,26**	**47 111,81**	**30 978,91**	**65,76**	**1 089**	**596**	**54,73**	**3 649**	**2 406**	**11**	**2 417**	**66,24**	**928,45**	**582,40**	**62,73**
28	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	08.06.2010	15	15	100,00	7 109,18	7 109,18	100,00	105	105	100,00	410	410	0	410	100,00	159,88	159,88	100,00
29	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	17.06.2010	20	20	100,00	13 028,00	13 028,00	100,00	261	261	100,00	1 212	1 212	0	1 212	100,00	223,43	223,43	100,00
30	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	09.08.2010	15	15	100,00	4 006,28	4 006,28	100,00	82	82	100,00	302	302	0	302	100,00	65,50	65,50	100,00
31	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	13.12.2010	6	6	100,00	2 554,45	2 554,45	100,00	50	50	100,00	170	170	0	170	100,00	41,77	41,77	100,00
32	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	07.04.2010	87	3	3,45	20 413,90	4 281,00	20,97	591	98	16,58	1 555	312	11	323	20,77	437,88	91,83	20,97
	Приволжский федеральный округ		**552**	**537**	**97,28**	**136 199,95**	**135 033,05**	**99,14**	**3 522**	**3 486**	**98,98**	**9 281**	**9 196**	**85**	**9 281**	**100,00**	**3 433,25**	**3 433,25**	**100,00**
33	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2010	54	54	100,00	10 504,28	10 504,28	100,00	256	256	100,00	621	621	0	621	100,00	255,81	255,81	100,00
34	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2010	34	34	100,00	5 084,60	5 084,60	100,00	152	151	99,34	331	331	0	331	100,00	152,38	152,38	100,00
35	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2010	8	8	100,00	856,30	856,30	100,00	22	22	100,00	56	56	0	56	100,00	25,69	25,69	100,00
36	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.04.2010	109	109	100,00	27 211,65	27 211,65	100,00	652	652	100,00	1 697	1 697	0	1 697	100,00	703,97	703,97	100,00
37	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	17	17	100,00	3 674,50	3 674,50	100,00	93	93	100,00	196	196	0	196	100,00	91,76	91,76	100,00
38	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	16.07.2010	55	50	90,91	16 676,65	16 210,75	97,21	481	470	97,71	1 125	1 099	26	1 125	100,00	444,64	444,64	100,00
39	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	02.06.2010	54	49	90,74	20 938,10	20 494,90	97,88	533	516	96,81	1 523	1 485	38	1 523	100,00	524,36	524,36	100,00
40	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.06.2010	25	22	88,00	18 003,68	17 837,68	99,08	396	392	98,99	1 171	1 159	12	1 171	100,00	402,72	402,72	100,00
41	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	14.04.2010	49	48	97,96	6 409,48	6 344,38	98,98	193	191	98,96	566	562	4	566	100,00	161,66	161,66	100,00
42	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	20.07.2010	12	12	100,00	2 379,88	2 379,88	100,00	73	73	100,00	217	217	0	217	100,00	59,52	59,52	100,00
43	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА —ЧУВАШИЯ	11.06.2010	135	134	99,26	24 460,83	24 434,13	99,89	671	670	99,85	1 778	1 773	5	1 778	100,00	610,72	610,72	100,00
	Уральский федеральный округ		**235**	**144**	**61,28**	**62 264,20**	**45 724,76**	**73,44**	**1 586**	**1 122**	**70,74**	**4 361**	**3 026**	**161**	**3 187**	**73,08**	**1 643,22**	**963,64**	**58,64**
44	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.06.2010	47	16	34,04	8 698,00	5 433,60	62,47	267	147	55,06	677	270	151	421	62,19	226,15	142,22	62,89
45	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.09.2010	62	5	8,06	20 030,93	6 855,99	34,23	484	143	29,55	1 391	473	0	473	34,00	595,65	0,00	0,00
46	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.06.2010	111	110	99,10	27 561,53	27 517,23	99,84	694	693	99,86	1 906	1 901	5	1 906	100,00	667,38	667,38	100,00
47	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.08.2010	15	13	86,67	5 973,74	5 917,94	99,07	141	139	98,58	387	382	5	387	100,00	154,04	154,04	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	Сибирский федеральный округ		**356**	**348**	**97,75**	**120 674,59**	**120 394,39**	**99,77**	**2 762**	**2 752**	**99,64**	**7 348**	**7 312**	**36**	**7 348**	**100,00**	**3 107,70**	**3 107,70**	**100,00**
48	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	67	67	100,00	24 338,92	24 338,92	100,00	568	568	100,00	1 625	1 625	0	1 625	100,00	628,84	628,84	100,00
49	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	6	6	100,00	2 281,30	2 281,30	100,00	59	59	100,00	166	166	0	166	100,00	63,36	63,36	100,00
50	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2010	81	81	100,00	22 427,87	22 427,87	100,00	520	520	100,00	1 374	1 374	0	1 374	100,00	546,00	546,00	100,00
51	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	20.07.2010	104	97	93,27	43 483,89	43 234,29	99,43	920	911	99,02	2 383	2 350	33	2 383	100,00	1 110,13	1 110,13	100,00
52	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	62	62	100,00	17 073,75	17 073,75	100,00	425	425	100,00	1 150	1 150	0	1 150	100,00	508,23	508,23	100,00
53	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	31.03.2010	24	23	95,83	6 963,46	6 932,86	99,56	171	170	99,42	367	364	3	367	100,00	136,85	136,85	100,00
54	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2010	12	12	100,00	4 105,40	4 105,40	100,00	99	99	100,00	283	283	0	283	100,00	114,29	114,29	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**49**	**49**	**100,00**	**16 631,04**	**16 631,04**	**100,00**	**357**	**357**	**100,00**	**906**	**906**	**0**	**906**	**100,00**	**380,67**	**380,67**	**100,00**
55	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2010	27	27	100,00	9 934,20	9 934,20	100,00	200	200	100,00	424	424	0	424	100,00	187,55	187,55	100,00
56	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	12	12	100,00	2 182,20	2 182,20	100,00	58	58	100,00	128	128	0	128	100,00	65,47	65,47	100,00
57	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	16.07.2010	10	10	100,00	4 514,64	4 514,64	100,00	99	99	100,00	354	354	0	354	100,00	127,65	127,65	100,00
	Итого по 2011 году		**2 876**	**577**	**20,06**	**778 055,02**	**173 613,84**	**22,31**	**20 694**	**4 230**	**20,44**	**53 744**	**11 105**	**271**	**11 376**	**21,17**	**20 501,24**	**4 557,90**	**22,23**
	Центральный федеральный округ		**370**	**32**	**8,65**	**95 632,32**	**12 842,60**	**13,43**	**2 635**	**333**	**12,64**	**6 512**	**771**	**9**	**780**	**11,98**	**2 522,59**	**354,15**	**14,04**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.04.2011	6	0	0,00	2 933,30	0,00	0,00	69	0	0,00	196	0	0	0	0,00	63,11	0,00	0,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	49	5	10,20	9 865,44	358,90	3,64	292	10	3,42	701	32	0	32	4,56	264,62	9,64	3,64
3	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	29	0	0,00	8 133,30	0,00	0,00	214	0	0,00	499	0	0	0	0,00	202,26	0,00	0,00
4	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	25	0	0,00	7 199,78	0,00	0,00	204	0	0,00	562	0	0	0	0,00	199,43	0,00	0,00
5	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.06.2011	33	1	3,03	8 602,80	647,80	7,53	266	16	6,02	693	44	0	44	6,35	207,76	15,64	7,53
6	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	20	5	25,00	6 076,10	1 302,50	21,44	169	36	21,30	425	69	0	69	16,24	176,24	35,71	20,26
7	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2011	42	0	0,00	11 834,80	3 268,80	27,62	305	69	22,62	692	158	0	158	22,83	286,99	77,54	27,02
8	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2011	44	2	4,55	12 265,50	661,10	5,39	355	14	3,94	919	32	0	32	3,48	285,81	14,89	5,21
9	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	21	0	0,00	5 785,66	0,00	0,00	142	0	0,00	391	0	0	0	0,00	173,57	0,00	0,00
10	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	31.10.2011	80	0	0,00	16 240,74	0,00	0,00	429	0	0,00	989	0	0	0	0,00	462,05	0,00	0,00
11	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	31.05.2011	21	19	90,48	6 694,90	6 603,50	98,63	190	188	98,95	445	436	9	445	100,00	200,74	200,74	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**358**	**7**	**1,96**	**81 752,91**	**1 927,86**	**2,36**	**2 385**	**49**	**2,05**	**5 302**	**56**	**71**	**127**	**2,40**	**2 377,71**	**52,90**	**2,22**
12	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.07.2011	52	0	0,00	11 459,12	0,00	0,00	308	0	0,00	718	0	0	0	0,00	328,98	0,00	0,00
13	ГОРОД САНКТ–ПЕТЕРБУРГ	22.08.2011	130	0	0,00	31 384,05	0,00	0,00	1 072	0	0,00	2 015	0	0	0	0,00	941,52	0,00	0,00
14	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.11.2011	40	0	0,00	9 320,91	0,00	0,00	264	0	0,00	719	0	0	0	0,00	275,45	0,00	0,00
15	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2011	20	0	0,00	3 806,50	0,00	0,00	106	0	0,00	240	0	0	0	0,00	102,78	0,00	0,00
16	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.08.2011	32	2	6,25	7 778,11	1 097,06	14,10	210	28	13,33	508	8	71	79	15,55	214,65	29,97	13,96
17	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	22.09.2011	26	0	0,00	5 662,82	0,00	0,00	146	0	0,00	380	0	0	0	0,00	169,88	0,00	0,00
18	РЕСПУБЛИКА КОМИ	14.07.2011	58	5	8,62	12 341,40	830,80	6,73	279	21	7,53	722	48	0	48	6,65	344,46	22,93	6,66
	Южный федеральный округ		**322**	**0**	**0,00**	**95 313,26**	**594,50**	**0,62**	**2 569**	**13**	**0,51**	**6 778**	**30**	**0**	**30**	**0,44**	**2 655,18**	**9,27**	**0,35**
19	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.10.2011	11	0	0,00	2 579,70	0,00	0,00	68	0	0,00	191	0	0	0	0,00	63,72	0,00	0,00
20	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	21	0	0,00	9 245,70	0,00	0,00	249	0	0,00	664	0	0	0	0,00	276,45	0,00	0,00
21	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	29	0	0,00	5 916,62	0,00	0,00	197	0	0,00	474	0	0	0	0,00	177,50	0,00	0,00
22	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	30.11.2011	75	0	0,00	25 388,08	0,00	0,00	746	0	0,00	2 135	0	0	0	0,00	761,64	0,00	0,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
23	РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)	01.08.2011	22	0	0,00	6 197,94	594,50	9,59	149	13	8,72	426	30	0	30	7,04	120,56	9,27	7,69
24	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	27.09.2011	8	0	0,00	4 254,22	0,00	0,00	113	0	0,00	391	0	0	0	0,00	78,26	0,00	0,00
25	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.12.2011	82	0	0,00	14 348,21	0,00	0,00	349	0	0,00	874	0	0	0	0,00	406,49	0,00	0,00
26	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	74	0	0,00	27 382,79	0,00	0,00	698	0	0,00	1 623	0	0	0	0,00	770,57	0,00	0,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**131**	**0**	**0,00**	**42 657,27**	**0,00**	**0,00**	**1 111**	**0**	**0,00**	**3 344**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**945,89**	**0,00**	**0,00**
27	КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА	20.12.2011	12	0	0,00	3 371,80	0,00	0,00	77	0	0,00	323	0	0	0	0,00	49,19	0,00	0,00
28	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	14.07.2011	20	0	0,00	12 693,47	0,00	0,00	343	0	0,00	1 125	0	0	0	0,00	294,49	0,00	0,00
29	РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	25.08.2011	6	0	0,00	3 787,50	0,00	0,00	84	0	0,00	356	0	0	0	0,00	72,69	0,00	0,00
30	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	14.07.2011	51	0	0,00	9 132,30	0,00	0,00	189	0	0,00	545	0	0	0	0,00	210,96	0,00	0,00
31	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	12.05.2011	37	0	0,00	11 698,30	0,00	0,00	347	0	0,00	812	0	0	0	0,00	272,57	0,00	0,00
32	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	27.12.2011	5	0	0,00	1 973,90	0,00	0,00	71	0	0,00	183	0	0	0	0,00	45,99	0,00	0,00
	Приволжский федеральный округ		**997**	**376**	**37,71**	**246 381,59**	**109 655,34**	**44,51**	**6 504**	**2 675**	**41,13**	**16 955**	**7 190**	**191**	**7 381**	**43,53**	**6 165,74**	**2 819,84**	**45,73**
33	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2011	47	9	19,15	12 947,00	6 127,20	47,33	325	147	45,23	759	318	0	318	41,90	343,92	158,51	46,09
34	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2011	9	0	0,00	3 123,90	0,00	0,00	108	0	0,00	245	0	0	0	0,00	93,72	0,00	0,00
35	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	77	0	0,00	21 018,02	477,30	2,27	512	9	1,76	1 215	23	0	23	1,89	555,95	12,56	2,26
36	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	09.08.2011	107	3	2,80	22 460,63	2 332,75	10,39	624	50	8,01	1 748	152	0	152	8,70	547,95	66,13	12,07
37	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	29.12.2011	35	0	0,00	8 331,26	0,00	0,00	225	0	0,00	684	0	0	0	0,00	228,37	0,00	0,00
38	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	06.05.2011	107	86	80,37	37 167,80	34 085,19	91,71	887	798	89,97	2 367	2 203	164	2 367	100,00	962,18	962,18	100,00
39	РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ	03.06.2011	44	24	54,55	7 460,80	4 431,13	59,39	210	114	54,29	608	342	0	342	56,25	187,69	106,60	56,79
40	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	28.06.2011	20	20	100,00	4 626,96	4 626,96	100,00	118	118	100,00	314	314	0	314	100,00	120,15	120,15	100,00
41	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	09.03.2011	113	107	94,69	22 482,45	21 808,65	97,00	601	583	97,00	1 561	1 520	25	1 545	98,98	540,91	533,28	98,59
42	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	14.12.2011	105	95	90,48	24 003,00	23 421,44	97,58	595	574	96,47	1 524	1 495	2	1 497	98,23	559,71	545,59	97,48
43	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2011	35	6	17,14	10 631,10	3 331,70	31,34	278	52	18,71	826	176	0	176	21,31	318,93	99,95	31,34
44	САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.07.2011	75	8	10,67	32 262,54	4 709,93	14,60	821	102	12,42	2 036	316	0	316	15,52	719,96	106,37	14,77
45	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	08.06.2011	72	16	22,22	13 517,89	3 728,89	27,58	441	117	26,53	1 223	301	0	301	24,61	358,89	95,74	26,68
46	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	32	0	0,00	13 044,09	270,80	2,08	335	5	1,49	761	15	0	15	1,97	306,76	5,88	1,92
47	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	22.08.2011	119	2	1,68	13 304,15	303,40	2,28	424	6	1,42	1 084	15	0	15	1,38	320,64	6,89	2,15
	Уральский федеральный округ		**236**	**19**	**8,05**	**69 707,34**	**3 104,20**	**4,45**	**1 663**	**65**	**3,91**	**4 696**	**206**	**0**	**206**	**4,39**	**1 866,15**	**86,11**	**4,61**
48	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	44	0	0,00	16 270,94	0,00	0,00	378	0	0,00	1 114	0	0	0	0,00	488,13	0,00	0,00
49	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	27.12.2011	43	0	0,00	15 653,45	0,00	0,00	321	0	0,00	978	0	0	0	0,00	469,60	0,00	0,00
50	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	116	5	4,31	32 360,95	633,60	1,96	853	18	2,11	2 261	51	0	51	2,26	760,98	14,70	1,93
51	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	31.05.2011	33	14	42,42	5 422,00	2 470,60	45,57	111	47	42,34	343	155	0	155	45,19	147,44	71,41	48,43

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	Сибирский федеральный округ		**416**	**132**	**31,73**	**131 376,10**	**41 784,94**	**31,81**	**3 442**	**1 006**	**29,23**	**8 998**	**2 568**	**0**	**2 568**	**28,54**	**3 591,09**	**1 138,10**	**31,69**
52	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	14.07.2011	67	5	7,46	23 536,67	1 777,10	7,55	792	46	5,81	1 822	90	0	90	4,94	590,84	39,31	6,65
53	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.08.2011	63	49	77,78	23 414,78	17 744,28	75,78	548	392	71,53	1 507	1 133	0	1 133	75,18	687,71	517,83	75,30
54	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2011	132	61	46,21	30 675,05	17 624,20	57,45	794	454	57,18	1 868	1 011	0	1 011	54,12	780,06	455,79	58,43
55	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	03.06.2011	63	9	14,29	25 387,96	2 092,90	8,24	525	51	9,71	1 518	152	0	152	10,01	717,35	60,59	8,45
56	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	26.07.2011	24	5	20,83	5 678,36	1 410,46	24,84	147	34	23,13	416	106	0	106	25,48	148,95	31,19	20,94
57	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2011	24	1	4,17	8 702,64	91,90	1,06	250	2	0,80	661	11	0	11	1,66	260,39	2,07	0,79
58	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	17.05.2011	10	2	20,00	2 465,49	1 044,10	42,35	71	27	38,03	187	65	0	65	34,76	73,96	31,32	42,35
59	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	22.06.2011	7	0	0,00	2 753,50	0,00	0,00	87	0	0,00	363	0	0	0	0,00	70,35	0,00	0,00
60	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2011	26	0	0,00	8 761,65	0,00	0,00	228	0	0,00	656	0	0	0	0,00	261,47	0,00	0,00
	Дальневосточный федеральный округ		**46**	**11**	**23,91**	**15 234,23**	**3 704,40**	**24,32**	**385**	**89**	**23,12**	**1 159**	**284**	**0**	**284**	**24,50**	**376,88**	**97,52**	**25,88**
61	ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	6	0	0,00	3 394,54	0,00	0,00	90	0	0,00	254	0	0	0	0,00	72,47	0,00	0,00
62	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	08.07.2011	17	2	11,76	2 722,69	753,40	27,67	74	14	18,92	174	34	0	34	19,54	80,55	21,56	26,76
63	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	22.08.2011	23	9	39,13	9 117,00	2 951,00	32,37	221	75	33,94	731	250	0	250	34,20	223,85	75,97	33,94

Информация о реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**4 496**	**4 134**	**91,95**	**1 132 565,42**	**1 090 786,52**	**96,31**	**29 304**	**28 031**	**95,66**	**80 472**	**77 040**	**3 432**	**80 472**	**100,00**	**32 229,74**	**32 229,74**	**100,00**
	Центральный федеральный округ		**1 025**	**1 002**	**97,76**	**251 286,87**	**249 143,07**	**99,15**	**6 556**	**6 498**	**99,12**	**16 370**	**16 208**	**162**	**16 370**	**100,00**	**7 104,96**	**7 104,97**	**100,00**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	25	25	100,00	7 790,58	7 790,58	100,00	204	204	100,00	524	524	0	524	100,00	197,10	197,10	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	80	79	98,75	12 227,59	12 178,68	99,60	322	321	99,69	806	802	4	806	100,00	327,98	327,98	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	10	10	100,00	3 388,00	3 388,00	100,00	71	71	100,00	202	202	0	202	100,00	98,45	98,45	100,00
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.03.2009	38	36	94,74	11 136,87	10 907,77	97,94	300	294	98,00	681	663	18	681	100,00	304,77	304,77	100,00
5	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.03.2009	23	23	100,00	6 554,42	6 554,42	100,00	217	217	100,00	388	388	0	388	100,00	182,76	182,76	100,00
6	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	10	10	100,00	2 661,60	2 661,60	100,00	97	97	100,00	160	160	0	160	100,00	74,21	74,21	100,00
7	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.03.2009	33	33	100,00	14 821,40	14 821,40	100,00	367	367	100,00	1 016	1 016	0	1 016	100,00	349,75	349,75	100,00
8	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	36	36	100,00	9 695,20	9 695,20	100,00	243	243	100,00	570	570	0	570	100,00	248,20	248,20	100,00
9	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	31	31	100,00	8 377,60	8 377,60	100,00	217	217	100,00	524	524	0	524	100,00	198,97	198,97	100,00
10	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	53	53	100,00	10 966,09	10 966,09	100,00	291	291	100,00	707	707	0	707	100,00	392,85	392,85	100,00
11	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.01.2009	49	49	100,00	9 138,78	9 138,78	100,00	232	232	100,00	566	566	0	566	100,00	233,87	233,88	100,00
12	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	107	107	100,00	21 755,76	21 755,76	100,00	596	596	100,00	1 629	1 629	0	1 629	100,00	488,40	488,40	100,00
13	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	27	27	100,00	6 711,83	6 711,83	100,00	176	176	100,00	450	450	0	450	100,00	185,61	185,61	100,00
14	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	100	100	100,00	32 458,11	32 458,11	100,00	798	798	100,00	2 110	2 110	0	2 110	100,00	1 170,99	1 170,99	100,00
15	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	50	50	100,00	15 479,00	15 479,00	100,00	377	377	100,00	940	940	0	940	100,00	379,12	379,12	100,00
16	ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.04.2009	7	7	100,00	1 161,40	1 161,40	100,00	26	26	100,00	74	74	0	74	100,00	27,66	27,66	100,00
17	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	69	52	75,36	20 231,90	19 484,50	96,31	558	530	94,98	1 320	1 261	59	1 320	100,00	572,33	572,33	100,00
18	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.02.2009	86	86	100,00	17 795,72	17 795,72	100,00	425	425	100,00	1 087	1 087	0	1 087	100,00	408,58	408,58	100,00
19	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.02.2009	13	13	100,00	2 513,20	2 513,20	100,00	76	76	100,00	201	201	0	201	100,00	56,83	56,83	100,00
20	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	34	34	100,00	10 702,99	10 702,99	100,00	279	279	100,00	745	745	0	745	100,00	411,79	411,79	100,00
21	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	39	39	100,00	9 737,32	9 737,32	100,00	264	264	100,00	587	587	0	587	100,00	329,26	329,26	100,00
22	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	16	15	93,75	3 516,80	3 246,00	92,30	99	92	92,93	242	220	22	242	100,00	104,03	104,03	100,00
23	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.02.2009	89	87	97,75	12 464,71	11 617,12	93,20	321	305	95,02	841	782	59	841	100,00	361,43	361,43	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**286**	**279**	**97,55**	**60 616,06**	**60 169,86**	**99,26**	**1 573**	**1 556**	**98,92**	**3 799**	**3 774**	**25**	**3 799**	**100,00**	**1 791,34**	**1 791,34**	**100,00**
24	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2009	12	12	100,00	3 439,40	3 439,40	100,00	68	68	100,00	190	190	0	190	100,00	98,54	98,54	100,00
25	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	76	76	100,00	13 703,80	13 703,80	100,00	361	361	100,00	907	907	0	907	100,00	383,96	383,96	100,00
26	КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2009	70	70	100,00	11 250,46	11 250,46	100,00	285	285	100,00	697	697	0	697	100,00	342,86	342,86	100,00
27	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.02.2009	17	17	100,00	6 166,60	6 166,60	100,00	147	147	100,00	303	303	0	303	100,00	196,10	196,10	100,00
28	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	22	22	100,00	8 261,04	8 261,04	100,00	227	227	100,00	427	427	0	427	100,00	262,70	262,70	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
29	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	27	25	92,59	4 070,06	4 038,46	99,22	119	117	98,32	246	244	2	246	100,00	106,84	106,84	100,00
30	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.03.2009	42	41	97,62	8 907,70	8 668,20	97,31	246	238	96,75	677	665	12	677	100,00	251,92	251,92	100,00
31	ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	12	8	66,67	2 936,10	2 761,00	94,04	77	70	90,91	229	218	11	229	100,00	84,76	84,76	100,00
32	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	26.03.2009	8	8	100,00	1 880,90	1 880,90	100,00	43	43	100,00	123	123	0	123	100,00	63,67	63,67	100,00
	Южный федеральный округ		**305**	**193**	**63,28**	**79 551,76**	**67 953,20**	**85,42**	**2 049**	**1 728**	**84,33**	**5 762**	**4 885**	**877**	**5 762**	**100,00**	**2 310,11**	**2 310,11**	**100,00**
33	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.02.2009	33	21	63,64	7 474,75	5 832,55	78,03	134	102	76,12	598	536	62	598	100,00	186,97	186,97	100,00
34	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.02.2009	74	74	100,00	21 627,98	21 627,98	100,00	606	606	100,00	1 531	1 531	0	1 531	100,00	622,30	622,30	100,00
35	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	11.03.2009	173	73	42,20	46 394,95	36 438,59	78,54	1 229	940	76,48	3 403	2 588	815	3 403	100,00	1 390,38	1 390,38	100,00
36	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.03.2009	25	25	100,00	4 054,08	4 054,08	100,00	80	80	100,00	230	230	0	230	100,00	110,46	110,46	100,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**71**	**23**	**32,39**	**29 717,42**	**21 711,53**	**73,06**	**759**	**509**	**67,06**	**2 579**	**1 917**	**662**	**2 579**	**100,00**	**563,57**	**563,57**	**100,00**
37	КАБАРДИНО–БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	06.04.2009	36	1	2,78	11 390,83	4 029,84	35,38	320	88	27,50	885	264	621	885	100,00	198,20	198,20	100,00
38	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	06.04.2009	4	4	100,00	7 101,85	7 101,85	100,00	193	193	100,00	897	897	0	897	100,00	160,86	160,86	100,00
39	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ	06.04.2009	8	8	100,00	5 700,34	5 700,34	100,00	107	107	100,00	369	369	0	369	100,00	93,20	93,20	100,00
40	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	26.03.2009	23	10	43,48	5 524,40	4 879,50	88,33	139	121	87,05	428	387	41	428	100,00	111,32	111,32	100,00
	Приволжский федеральный округ		**1 212**	**1 067**	**88,04**	**318 651,07**	**301 591,66**	**94,65**	**8 394**	**7 834**	**93,33**	**23 627**	**22 078**	**1 549**	**23 627**	**100,00**	**8 951,57**	**8 951,57**	**100,00**
41	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.02.2009	59	59	100,00	19 881,71	19 881,71	100,00	526	526	100,00	1 428	1 428	0	1 428	100,00	522,56	522,56	100,00
42	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	83	77	92,77	23 715,63	23 537,87	99,25	602	596	99,00	1 636	1 624	12	1 636	100,00	825,97	825,97	100,00
43	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	125	125	100,00	20 831,59	20 831,59	100,00	540	540	100,00	1 302	1 302	0	1 302	100,00	657,39	657,39	100,00
44	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	79	79	100,00	16 457,56	16 457,56	100,00	480	480	100,00	1 255	1 255	0	1 255	100,00	444,70	444,70	100,00
45	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.03.2009	27	27	100,00	4 610,80	4 610,80	100,00	106	106	100,00	317	317	0	317	100,00	123,57	123,57	100,00
46	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.12.2008	77	77	100,00	23 781,90	23 781,90	100,00	576	576	100,00	1 531	1 531	0	1 531	100,00	677,35	677,35	100,00
47	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	27.12.2008	152	65	42,76	45 606,29	33 573,40	73,62	1 266	932	73,62	3 919	2 885	1 034	3 919	100,00	1 340,38	1 340,38	100,00
48	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	10.12.2008	226	192	84,96	76 143,47	73 260,91	96,21	1 992	1 826	91,67	6 039	5 683	356	6 039	100,00	2 146,25	2 146,25	100,00
49	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	18.02.2009	49	49	100,00	8 948,41	8 948,41	100,00	204	204	100,00	613	613	0	613	100,00	233,45	233,45	100,00
50	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	90	79	87,78	28 481,30	26 726,90	93,84	628	576	91,72	1 805	1 663	142	1 805	100,00	780,44	780,44	100,00
51	УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА	30.03.2009	38	38	100,00	5 919,23	5 919,23	100,00	195	195	100,00	501	501	0	501	100,00	168,70	168,70	100,00
52	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.03.2009	58	58	100,00	20 053,78	20 053,78	100,00	594	594	100,00	1 410	1 410	0	1 410	100,00	447,48	447,48	100,00
53	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	27.12.2008	81	80	98,77	12 818,87	12 818,87	100,00	374	374	100,00	1 083	1 083	0	1 083	100,00	317,30	317,30	100,00
54	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА–ЧУВАШИЯ	30.03.2009	68	62	91,18	11 400,53	11 188,73	98,14	311	309	99,36	788	783	5	788	100,00	266,03	266,03	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	Уральский федеральный округ		**718**	**710**	**98,89**	**176 845,26**	**174 768,92**	**98,83**	**4 619**	**4 565**	**98,83**	**12 936**	**12 812**	**124**	**12 936**	**100,00**	**5 348,14**	**5 348,14**	**100,00**
55	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.02.2009	21	20	95,24	4 545,50	4 455,50	98,02	137	135	98,54	359	356	3	359	100,00	118,11	118,11	100,00
56	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.02.2009	221	221	100,00	55 585,70	55 585,70	100,00	1 430	1 430	100,00	3 870	3 870	0	3 870	100,00	1 838,42	1 838,42	100,00
57	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	18.12.2008	107	101	94,39	24 483,93	24 019,93	98,10	682	665	97,51	1 873	1 817	56	1 873	100,00	811,59	811,59	100,00
58	ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	30.01.2009	75	75	100,00	17 499,55	17 499,55	100,00	457	457	100,00	1 359	1 359	0	1 359	100,00	623,39	623,39	100,00
59	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	10.12.2008	206	205	99,51	56 737,10	55 214,76	97,32	1 459	1 424	97,60	4 167	4 102	65	4 167	100,00	1 479,01	1 479,01	100,00
60	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.03.2009	68	68	100,00	15 364,38	15 364,38	100,00	408	408	100,00	1 135	1 135	0	1 135	100,00	381,97	381,97	100,00
61	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	18.12.2008	15	15	100,00	2 021,40	2 021,40	100,00	35	35	100,00	133	133	0	133	100,00	70,89	70,89	100,00
62	ЯМАЛО–НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	06.04.2009	5	5	100,00	607,70	607,70	100,00	11	11	100,00	40	40	0	40	100,00	24,76	24,76	100,00
	Сибирский федеральный округ		**754**	**735**	**97,48**	**189 663,78**	**189 215,08**	**99,76**	**4 787**	**4 774**	**99,73**	**13 800**	**13 767**	**33**	**13 800**	**100,00**	**5 332,00**	**5 332,00**	**100,00**
63	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	17.03.2009	124	124	100,00	37 114,74	37 114,74	100,00	1 022	1 022	100,00	2 910	2 910	0	2 910	100,00	936,40	936,40	100,00
64	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	24.12.2008	112	112	100,00	10 573,97	10 573,97	100,00	253	253	100,00	565	565	0	565	100,00	260,80	260,80	100,00
65	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.02.2009	129	120	93,02	31 632,29	31 632,29	100,00	828	828	100,00	2 218	2 218	0	2 218	100,00	1 007,29	1 007,29	100,00
66	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2008	34	34	100,00	10 026,60	10 026,60	100,00	195	195	100,00	620	620	0	620	100,00	263,78	263,78	100,00
67	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	26.03.2009	49	49	100,00	19 372,10	19 372,10	100,00	466	466	100,00	1 366	1 366	0	1 366	100,00	587,39	587,39	100,00
68	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2008	70	70	100,00	19 552,55	19 552,55	100,00	521	521	100,00	1 321	1 321	0	1 321	100,00	653,00	653,00	100,00
69	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.01.2009	111	108	97,30	26 611,50	26 441,10	99,36	630	626	99,37	2 007	1 993	14	2 007	100,00	731,43	731,43	100,00
70	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.04.2009	31	24	77,42	3 096,60	2 818,30	91,01	78	69	88,46	190	171	19	190	100,00	85,16	85,16	100,00
71	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	06.02.2009	14	14	100,00	3 276,26	3 276,26	100,00	107	107	100,00	361	361	0	361	100,00	98,01	98,01	100,00
72	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	11.03.2009	31	31	100,00	12 147,15	12 147,15	100,00	301	301	100,00	1 039	1 039	0	1 039	100,00	257,33	257,33	100,00
73	РЕСПУБЛИКА ТЫВА	11.03.2009	11	11	100,00	4 841,86	4 841,86	100,00	85	85	100,00	302	302	0	302	100,00	117,66	117,66	100,00
74	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	30.03.2009	10	10	100,00	2 619,36	2 619,36	100,00	63	63	100,00	178	178	0	178	100,00	54,95	54,95	100,00
75	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.01.2009	28	28	100,00	8 798,80	8 798,80	100,00	238	238	100,00	723	723	0	723	100,00	278,81	278,81	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**125**	**125**	**100,00**	**26 233,20**	**26 233,20**	**100,00**	**567**	**567**	**100,00**	**1 599**	**1 599**	**0**	**1 599**	**100,00**	**828,05**	**828,05**	**100,00**
76	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.03.2009	12	12	100,00	4 128,50	4 128,50	100,00	89	89	100,00	252	252	0	252	100,00	106,72	106,72	100,00
77	КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	11.03.2009	9	9	100,00	1 841,30	1 841,30	100,00	33	33	100,00	101	101	0	101	100,00	59,50	59,50	100,00
78	МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.02.2009	22	22	100,00	2 999,50	2 999,50	100,00	76	76	100,00	131	131	0	131	100,00	105,96	105,96	100,00
79	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	11.03.2009	52	52	100,00	12 071,00	12 071,00	100,00	253	253	100,00	757	757	0	757	100,00	383,22	383,22	100,00
80	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	03.03.2009	12	12	100,00	2 777,50	2 777,50	100,00	60	60	100,00	183	183	0	183	100,00	82,77	82,77	100,00
81	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.03.2009	18	18	100,00	2 415,40	2 415,40	100,00	56	56	100,00	175	175	0	175	100,00	89,87	89,87	100,00

Информация о реализации региональных адресных программ переселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**3 733**	**1 771**	**47,44**	**844 194,92**	**370 362,38**	**43,87**	**21 703**	**9 496**	**43,75**	**53 451**	**23 452**	**263**	**23 715**	**44,37**	**23 258,97**	**10 237,65**	**44,02**
	Итого по 2010 году		**1 609**	**1 404**	**87,26**	**324 900,71**	**297 662,85**	**91,62**	**8 379**	**7 664**	**91,47**	**20 636**	**18 851**	**263**	**19 114**	**92,62**	**8 786,67**	**8 165,21**	**92,93**
	Центральный федеральный округ		**226**	**219**	**96,90**	**49 883,10**	**48 968,85**	**98,17**	**1 296**	**1 272**	**98,15**	**2 906**	**2 866**	**2**	**2 868**	**98,69**	**1 450,91**	**1 426,06**	**98,29**
1	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2010	7	7	100,00	1 002,90	1 002,90	100,00	24	24	100,00	49	49	0	49	100,00	26,72	26,72	100,00
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2010	11	11	100,00	1 023,50	1 023,50	100,00	28	28	100,00	87	87	0	87	100,00	27,48	27,48	100,00
3	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	18	18	100,00	3 919,10	3 919,10	100,00	103	103	100,00	277	277	0	277	100,00	109,77	109,77	100,00
4	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.07.2010	19	15	78,95	4 229,70	3 427,40	81,03	123	102	82,93	277	239	0	239	86,28	126,89	102,82	81,03
5	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	23.07.2010	21	21	100,00	4 207,20	4 207,20	100,00	116	116	100,00	226	226	0	226	100,00	111,80	111,80	100,00
6	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.11.2010	88	88	100,00	22 764,16	22 764,16	100,00	561	561	100,00	1 278	1 278	0	1 278	100,00	682,92	682,92	100,00
7	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.07.2010	39	36	92,31	8 994,44	8 882,49	98,76	233	230	98,71	508	506	2	508	100,00	253,45	253,45	100,00
8	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.12.2010	9	9	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	65	65	100,00	122	122	0	122	100,00	73,14	72,36	98,93
9	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	14	14	100,00	1 304,10	1 304,10	100,00	43	43	100,00	82	82	0	82	100,00	38,73	38,73	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**191**	**96**	**50,26**	**30 722,43**	**17 591,76**	**57,26**	**791**	**472**	**59,67**	**1 820**	**1 076**	**3**	**1 079**	**59,29**	**838,50**	**485,69**	**57,92**
10	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.11.2010	78	46	58,97	15 476,08	9 559,11	61,77	375	244	65,07	940	589	0	589	62,66	432,43	263,50	60,93
11	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.12.2010	35	0	0,00	2 863,30	0,00	0,00	71	0	0,00	131	0	0	0	0,00	68,72	0,00	0,00
12	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	34	33	97,06	5 112,40	5 085,60	99,48	158	157	99,37	304	301	3	304	100,00	133,79	133,79	100,00
13	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	17.08.2010	37	17	45,95	5 061,15	2 947,05	58,23	137	71	51,82	315	186	0	186	59,05	145,65	88,40	60,69
14	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	25.10.2010	7	0	0,00	2 209,50	0,00	0,00	50	0	0,00	130	0	0	0	0,00	57,91	0,00	0,00
	Южный федеральный округ		**161**	**126**	**78,26**	**47 759,36**	**43 597,42**	**91,29**	**1 138**	**1 037**	**91,12**	**3 192**	**2 881**	**152**	**3 033**	**95,02**	**1 178,89**	**1 108,30**	**94,01**
15	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.08.2010	15	15	100,00	3 583,90	3 583,90	100,00	88	88	100,00	277	277	0	277	100,00	85,66	85,66	100,00
16	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2010	61	61	100,00	15 332,70	15 332,70	100,00	362	362	100,00	935	935	0	935	100,00	416,30	416,30	100,00
17	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	09.07.2010	35	34	97,14	12 790,58	12 687,28	99,19	351	349	99,43	895	884	11	895	100,00	383,67	383,67	100,00
18	РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	30.07.2010	31	14	45,16	12 666,48	11 207,54	88,48	251	214	85,26	879	738	141	879	100,00	201,40	201,40	100,00
19	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.10.2010	19	2	10,53	3 385,70	786,00	23,22	86	24	27,91	206	47	0	47	22,82	91,87	21,28	23,17
	Северо-Кавказский федеральный округ		**51**	**23**	**45,10**	**13 491,60**	**7 317,50**	**54,24**	**360**	**162**	**45,00**	**935**	**445**	**0**	**445**	**47,59**	**259,76**	**127,32**	**49,02**
20	КАБАРДИНО–БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	17.06.2010	23	23	100,00	7 317,50	7 317,50	100,00	162	162	100,00	445	445	0	445	100,00	127,32	127,32	100,00
21	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	20.08.2010	3	0	0,00	3 037,70	0,00	0,00	99	0	0,00	232	0	0	0	0,00	65,16	0,00	0,00
22	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	30.11.2010	25	0	0,00	3 136,40	0,00	0,00	99	0	0,00	258	0	0	0	0,00	67,28	0,00	0,00
	Приволжский федеральный округ		**479**	**463**	**96,66**	**95 876,81**	**95 015,61**	**99,10**	**2 554**	**2 534**	**99,22**	**5 782**	**5 705**	**77**	**5 782**	**100,00**	**2 735,89**	**2 735,89**	**100,00**
23	КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2010	12	12	100,00	2 779,11	2 779,11	100,00	76	76	100,00	163	163	0	163	100,00	74,32	74,32	100,00
24	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.06.2010	198	198	100,00	34 242,89	34 242,89	100,00	982	982	100,00	2 081	2 081	0	2 081	100,00	1 024,87	1 024,87	100,00
25	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.12.2010	49	49	100,00	6 958,71	6 958,71	100,00	200	200	100,00	435	435	0	435	100,00	207,25	207,25	100,00
26	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.06.2010	54	46	85,19	11 353,39	10 844,29	95,52	288	277	96,18	711	678	33	711	100,00	298,03	298,03	100,00
27	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	06.07.2010	2	2	100,00	527,80	527,80	100,00	12	12	100,00	41	41	0	41	100,00	9,48	9,48	100,00
28	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	02.06.2010	15	12	80,00	4 647,51	4 509,91	97,04	119	115	96,64	310	280	30	310	100,00	101,87	101,87	100,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
29	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	24.06.2010	11	11	100,00	1 286,60	1 286,60	100,00	31	31	100,00	66	66	0	66	100,00	31,77	31,77	100,00
30	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)	27.05.2010	8	8	100,00	1 482,20	1 482,20	100,00	42	42	100,00	89	89	0	89	100,00	38,83	38,83	100,00
31	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.06.2010	130	125	96,15	32 598,60	32 384,10	99,34	804	799	99,38	1 886	1 872	14	1 886	100,00	949,48	949,48	100,00
	Уральский федеральный округ		**122**	**112**	**91,80**	**28 824,49**	**27 704,79**	**96,12**	**718**	**691**	**96,24**	**1 863**	**1 809**	**14**	**1 823**	**97,85**	**747,00**	**726,05**	**97,20**
32	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.07.2010	20	20	100,00	7 808,90	7 808,90	100,00	184	184	100,00	468	468	0	468	100,00	234,27	234,27	100,00
33	ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	13.12.2010	26	21	80,77	4 675,10	3 686,10	78,85	105	84	80,00	279	234	5	239	85,66	121,05	100,10	82,70
34	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.06.2010	73	68	93,15	15 928,47	15 797,77	99,18	419	413	98,57	1 068	1 059	9	1 068	100,00	379,32	379,32	100,00
35	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	17.08.2010	3	3	100,00	412,02	412,02	100,00	10	10	100,00	48	48	0	48	100,00	12,36	12,36	100,00
	Сибирский федеральный округ		**248**	**243**	**97,98**	**40 064,76**	**39 849,86**	**99,46**	**1 048**	**1 043**	**99,52**	**2 670**	**2 655**	**15**	**2 670**	**100,00**	**1 090,58**	**1 090,58**	**100,00**
36	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	09.07.2010	31	31	100,00	7 237,07	7 237,07	100,00	201	201	100,00	492	492	0	492	100,00	171,16	171,16	100,00
37	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	12.08.2010	12	12	100,00	1 999,78	1 999,78	100,00	50	50	100,00	143	143	0	143	100,00	58,08	58,08	100,00
38	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	01.07.2010	12	12	100,00	2 845,00	2 845,00	100,00	75	75	100,00	191	191	0	191	100,00	84,41	84,41	100,00
39	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	17.05.2010	174	169	97,13	24 084,80	23 869,90	99,11	612	607	99,18	1 552	1 537	15	1 552	100,00	662,17	662,17	100,00
40	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	04.06.2010	19	19	100,00	3 898,11	3 898,11	100,00	110	110	100,00	292	292	0	292	100,00	114,76	114,76	100,00
	Дальневосточный федеральный округ		**131**	**122**	**93,13**	**18 278,16**	**17 617,06**	**96,38**	**474**	**453**	**95,57**	**1 468**	**1 414**	**0**	**1 414**	**96,32**	**485,15**	**465,32**	**95,91**
41	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.07.2010	19	19	100,00	3 672,15	3 672,15	100,00	75	75	100,00	228	228	0	228	100,00	91,31	91,31	100,00
42	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	19.10.2010	91	91	100,00	9 459,11	9 459,11	100,00	271	271	100,00	889	889	0	889	100,00	242,57	242,57	100,00
43	РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)	12.11.2010	12	12	100,00	4 485,80	4 485,80	100,00	107	107	100,00	297	297	0	297	100,00	131,43	131,43	100,00
44	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.10.2010	9	0	0,00	661,10	0,00	0,00	21	0	0,00	54	0	0	0	0,00	19,83	0,00	0,00
	Итого по 2011 году		**2 124**	**367**	**17,28**	**519 294,21**	**72 699,53**	**14,00**	**13 324**	**1 832**	**13,75**	**32 815**	**4 601**	**0**	**4 601**	**14,02**	**14 472,30**	**2 072,44**	**14,32**
	Центральный федеральный округ		**621**	**61**	**9,82**	**180 057,13**	**18 587,19**	**10,32**	**4 668**	**515**	**11,03**	**11 188**	**1 270**	**0**	**1 270**	**11,35**	**4 989,79**	**523,68**	**10,49**
1	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.05.2011	60	20	33,33	16 841,76	5 459,71	32,42	459	156	33,99	1 105	416	0	416	37,65	413,49	139,01	33,62
2	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.05.2011	9	2	22,22	2 768,40	539,70	19,50	71	14	19,72	164	51	0	51	31,10	74,33	14,49	19,50
3	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.10.2011	2	0	0,00	672,70	0,00	0,00	20	0	0,00	37	0	0	0	0,00	18,06	0,00	0,00
4	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	05.07.2011	19	7	36,84	7 225,55	2 720,40	37,65	164	70	42,68	419	188	0	188	44,87	203,04	76,44	37,65
5	ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	30	0	0,00	7 878,62	0,00	0,00	192	0	0,00	516	0	0	0	0,00	221,39	0,00	0,00
6	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	71	0	0,00	19 378,06	0,00	0,00	548	0	0,00	1 107	0	0	0	0,00	482,40	0,00	0,00
7	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.06.2011	39	0	0,00	10 281,29	0,00	0,00	263	0	0,00	561	0	0	0	0,00	256,52	0,00	0,00
8	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	5	0	0,00	1 294,75	0,00	0,00	38	0	0,00	87	0	0	0	0,00	32,30	0,00	0,00
9	КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	03.06.2011	60	7	11,67	12 525,56	1 779,10	14,20	368	54	14,67	775	112	0	112	14,45	375,77	53,37	14,20
10	КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.04.2011	44	0	0,00	8 972,62	0,00	0,00	242	0	0,00	623	0	0	0	0,00	239,95	0,00	0,00
11	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.11.2011	15	0	0,00	2 910,91	0,00	0,00	79	0	0,00	197	0	0	0	0,00	66,08	0,00	0,00
12	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	22	0	0,00	5 848,74	0,00	0,00	150	0	0,00	473	0	0	0	0,00	132,77	0,00	0,00
13	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	48	0	0,00	7 065,50	0,00	0,00	183	0	0,00	442	0	0	0	0,00	190,76	0,00	0,00
14	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.11.2011	43	0	0,00	21 264,65	0,00	0,00	467	0	0,00	1 316	0	0	0	0,00	637,94	0,00	0,00
15	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.12.2011	41	0	0,00	34 290,90	0,00	0,00	815	0	0,00	2 005	0	0	0	0,00	1 028,73	0,00	0,00
16	РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.09.2011	20	1	5,00	4 674,15	662,98	14,18	126	16	12,70	274	40	0	40	14,60	134,85	19,05	14,13
17	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	26.12.2011	4	0	0,00	309,10	0,00	0,00	12	0	0,00	25	0	0	0	0,00	7,25	0,00	0,00

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
18	ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2011	65	0	0,00	8 428,57	0,00	0,00	266	0	0,00	599	0	0	0	0,00	252,86	0,00	0,00
19	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ	24.05.2011	24	24	100,00	7 425,30	7 425,30	100,00	205	205	100,00	463	463	0	463	100,00	221,31	221,31	100,00
	Северо-Западный федеральный округ		**230**	**0**	**0,00**	**49 779,57**	**1 026,36**	**2,06**	**1 247**	**26**	**2,09**	**3 061**	**69**	**0**	**69**	**2,25**	**1 412,79**	**27,71**	**1,96**
20	ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	83	0	0,00	14 025,76	0,00	0,00	362	0	0,00	948	0	0	0	0,00	400,44	0,00	0,00
21	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	25.08.2011	35	0	0,00	9 939,91	0,00	0,00	256	0	0,00	673	0	0	0	0,00	298,20	0,00	0,00
22	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12.12.2011	53	0	0,00	10 685,07	0,00	0,00	290	0	0,00	708	0	0	0	0,00	320,55	0,00	0,00
23	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	22.09.2011	36	0	0,00	9 961,90	0,00	0,00	204	0	0,00	416	0	0	0	0,00	251,04	0,00	0,00
24	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.05.2011	15	0	0,00	3 696,13	1 026,36	27,77	104	26	25,00	236	69	0	69	29,24	99,80	27,71	27,77
25	НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	06.12.2011	1	0	0,00	450,70	0,00	0,00	8	0	0,00	23	0	0	0	0,00	12,17	0,00	0,00
26	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ	19.12.2011	7	0	0,00	1 020,10	0,00	0,00	23	0	0,00	57	0	0	0	0,00	30,60	0,00	0,00
	Южный федеральный округ		**61**	**0**	**0,00**	**20 290,22**	**0,00**	**0,00**	**470**	**0**	**0,00**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**574,02**	**0,00**	**0,00**
27	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	04.10.2011	18	0	0,00	6 259,12	0,00	0,00	126	0	0,00	456	0	0	0	0,00	154,60	0,00	0,00
28	ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.06.2011	18	0	0,00	4 595,50	0,00	0,00	106	0	0,00	307	0	0	0	0,00	136,36	0,00	0,00
29	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	04.08.2011	25	0	0,00	9 435,60	0,00	0,00	238	0	0,00	617	0	0	0	0,00	283,07	0,00	0,00
	Северо-Кавказский федеральный округ		**75**	**0**	**0,00**	**30 116,51**	**0,00**	**0,00**	**763**	**0**	**0,00**	**1 923**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**706,96**	**0,00**	**0,00**
30	КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА	11.10.2011	15	0	0,00	6 305,26	0,00	0,00	147	0	0,00	424	0	0	0	0,00	156,37	0,00	0,00
31	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН	06.12.2011	12	0	0,00	8 394,25	0,00	0,00	197	0	0,00	479	0	0	0	0,00	194,75	0,00	0,00
32	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	12.05.2011	48	0	0,00	15 417,00	0,00	0,00	419	0	0,00	1 020	0	0	0	0,00	355,84	0,00	0,00
	Приволжский федеральный округ		**348**	**99**	**28,45**	**73 754,05**	**23 177,24**	**31,43**	**1 959**	**574**	**29,30**	**4 558**	**1 392**	**0**	**1 392**	**30,54**	**2 123,97**	**691,09**	**32,54**
33	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.09.2011	143	23	16,08	27 596,93	6 478,43	23,48	787	183	23,25	1 618	459	0	459	28,37	823,83	205,78	24,98
34	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	8	0	0,00	759,71	0,00	0,00	24	0	0,00	61	0	0	0	0,00	21,65	0,00	0,00
35	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	29.12.2011	5	0	0,00	1 157,20	0,00	0,00	28	0	0,00	65	0	0	0	0,00	34,58	0,00	0,00
36	ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ	27.09.2011	5	5	100,00	458,90	458,90	100,00	12	12	100,00	27	27	0	27	100,00	12,30	12,30	100,00
37	ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.03.2011	58	4	6,90	14 137,12	440,85	3,12	421	17	4,04	1 078	36	0	36	3,34	371,10	11,57	3,12
38	ПЕРМСКИЙ КРАЙ	01.08.2011	9	0	0,00	1 611,70	0,00	0,00	42	0	0,00	120	0	0	0	0,00	40,01	0,00	0,00
39	РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ	28.06.2011	26	13	50,00	4 678,20	2 290,10	48,95	103	51	49,51	274	128	0	128	46,72	119,87	56,17	46,85
40	САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ	09.08.2011	94	54	57,45	23 354,29	13 508,96	57,84	542	311	57,38	1 315	742	0	742	56,43	700,63	405,27	57,84
	Уральский федеральный округ		**239**	**2**	**0,84**	**57 722,36**	**1 528,64**	**2,65**	**1 589**	**36**	**2,27**	**3 987**	**85**	**0**	**85**	**2,13**	**1 648,59**	**35,83**	**2,17**
41	КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.10.2011	31	0	0,00	5 488,35	0,00	0,00	153	0	0,00	367	0	0	0	0,00	142,70	0,00	0,00
42	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	137	0	0,00	29 276,65	1 033,10	3,53	846	20	2,36	1 992	48	0	48	2,41	861,39	24,41	2,83
43	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	28.12.2011	33	0	0,00	12 444,30	0,00	0,00	271	0	0,00	868	0	0	0	0,00	373,33	0,00	0,00
44	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14.07.2011	34	2	5,88	9 530,66	495,54	5,20	298	16	5,37	693	37	0	37	5,34	241,70	11,42	4,72
45	ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	20.05.2011	4	0	0,00	982,40	0,00	0,00	21	0	0,00	67	0	0	0	0,00	29,47	0,00	0,00
	Сибирский федеральный округ		**385**	**205**	**53,25**	**67 789,77**	**28 380,10**	**41,86**	**1 599**	**681**	**42,59**	**4 110**	**1 785**	**0**	**1 785**	**43,43**	**1 822,63**	**794,14**	**43,57**
46	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.06.2011	1	0	0,00	485,30	0,00	0,00	8	0	0,00	26	0	0	0	0,00	13,27	0,00	0,00
47	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	22.06.2011	69	0	0,00	11 362,80	0,00	0,00	253	0	0,00	593	0	0	0	0,00	310,77	0,00	0,00
48	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	03.06.2011	25	14	56,00	5 950,87	2 729,50	45,87	145	56	38,62	392	149	0	149	38,01	164,94	73,10	44,32
49	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	16.06.2011	84	37	44,05	13 857,20	6 798,30	49,06	378	190	50,26	920	453	0	453	49,24	413,26	202,92	49,10

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
50	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ	08.06.2011	154	154	100,00	18 852,30	18 852,30	100,00	435	435	100,00	1 183	1 183	0	1 183	100,00	518,13	518,13	100,00
51	РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	31.08.2011	29	0	0,00	8 818,60	0,00	0,00	204	0	0,00	593	0	0	0	0,00	201,70	0,00	0,00
52	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ	14.10.2011	23	0	0,00	8 462,70	0,00	0,00	176	0	0,00	403	0	0	0	0,00	200,57	0,00	0,00
	Дальневосточный федеральный округ		**165**	**0**	**0,00**	**39 784,60**	**0,00**	**0,00**	**1 029**	**0**	**0,00**	**2 608**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1 193,54**	**0,00**	**0,00**
53	АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	07.04.2011	25	0	0,00	7 217,30	0,00	0,00	177	0	0,00	425	0	0	0	0,00	216,52	0,00	0,00
54	ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	14.09.2011	57	0	0,00	15 712,30	0,00	0,00	414	0	0,00	1 053	0	0	0	0,00	471,37	0,00	0,00
55	САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	11.10.2011	51	0	0,00	5 846,90	0,00	0,00	167	0	0,00	494	0	0	0	0,00	175,41	0,00	0,00
56	ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	14.07.2011	32	0	0,00	11 008,10	0,00	0,00	271	0	0,00	636	0	0	0	0,00	330,24	0,00	0,00

Информация о реализации региональных адресных программ переселения из аварийного жилищного фонда в монопрофильных муниципальных образованиях

№ п/п	Наименование СРФ	Дата принятия решения по заявке	Количество МКД			Общая площадь помещений			Количество помещений			Численность жителей в МКД					Стоимость переселения в рамках долевого финансирования		
			план	факт	% выполнения	план	факт (расселенная)	% выполнения	план	факт (расселенных)	% выполнения	план	факт переселения	в судах	всего	% выполнения	план	факт	% выполнения
			ед.	ед.		кв. м	кв. м		ед.	ед.		чел.	чел.	чел.	чел.		млн. руб.	млн. руб.	
	ИТОГО по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		**63**	**49**	**77,78**	**18 619,64**	**17 404,34**	**93,47**	**471**	**441**	**93,63**	**1 189**	**1 126**	**6**	**1 132**	**95,21**	**483,30**	**454,50**	**94,04**
	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Итог		**41**	**41**	**100,00**	**11 255,24**	**11 255,24**	**100,00**	**297**	**297**	**100,00**	**757**	**757**	**0**	**757**	**100,00**	**292,16**	**292,16**	**100,00**
1	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2010	27	27	100,00	6 359,94	6 359,94	100,00	148	148	100,00	399	399	0	399	100,00	165,63	165,63	100,00
2	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2010	14	14	100,00	4 895,30	4 895,30	100,00	149	149	100,00	358	358	0	358	100,00	126,53	126,53	100,00
	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Итог		**1**	**1**	**100,00**	**738,70**	**738,70**	**100,00**	**13**	**13**	**100,00**	**34**	**34**	**0**	**34**	**100,00**	**22,16**	**22,16**	**100,00**
3	ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	30.07.2010	1	1	100,00	738,70	738,70	100,00	13	13	100,00	34	34	0	34	100,00	22,16	22,16	100,00
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Итог		**13**	**0**	**0,00**	**2 432,10**	**1 340,50**	**55,12**	**55**	**31**	**56,36**	**136**	**79**	**0**	**79**	**58,09**	**64,13**	**35,33**	**55,09**
4	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	23.09.2010	13	0	0,00	2 432,10	1 340,50	55,12	55	31	56,36	136	79	0	79	58,09	64,13	35,33	55,09
	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Итог		**8**	**7**	**87,50**	**4 193,60**	**4 069,90**	**97,05**	**106**	**100**	**94,34**	**262**	**256**	**6**	**262**	**100,00**	**104,84**	**104,84**	**100,00**
5	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ	20.09.2010	8	7	87,50	4 193,60	4 069,90	97,05	106	100	94,34	262	256	6	262	100,00	104,84	104,84	100,00

Приложение 3. Сведения о выполнении субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 году

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Доля коммерческих организаций коммунального комплекса	Доля МКД под управлением коммерческих управляющих компаний	Доля коммерческих управляющих компаний	Доля МКД, в которых созданы ТСЖ	Реализация графиков остановки на кадастровый учет земельных участков	Перевод льгот и субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежную форму	Субсидирование организаций коммунального комплекса	Перекрестное субсидирование	Региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
		%	%	%	%	(+) выполнено/ (–) не выполнено	(+) выполнено/ (–) не выполнено	(+) ликвидировано/ (–) не ликвидировано	(+) ликвидировано/ (–) не ликвидировано	(+) реализуются/ (–) не реализуются
1	Алтайский край	84,2	88,2	96,5	23,3	+	+	+	+	+
2	Амурская область	93,5	89,4	100,0	19,4	+	+	+	+	+
3	Архангельская область	86,6	86,8	96,0	23,5	+	+	+	–	+
4	Астраханская область	81,3	83,5	97,2	23,8	+	+	+	+	+
5	Белгородская область	82,2	90,8	97,5	26,3	+	+	+	–	+
6	Брянская область	81,9	88,3	93,7	19,8	+	+	+	–	+
7	Владимирская область	84,7	87,1	94,8	21,2	+	+	+	+	+
8	Волгоградская область	84,9	95,2	96,9	19,1	+	+	+	+	+
9	Воло годская область	86,9	90,0	94,6	18,0	+	+	+	+	+
10	Воронежская область	87,6	91,7	99,4	21,5	+	+	+	+	+
11	Еврейская автономная область	93,6	99,9	100,0	24,3	+	+	+	–	+
12	Забайкальский край	92,1	97,9	99,0	17,2	+	+	+	–	+
13	Ивановская область	88,0	91,3	98,2	16,6	+	+	+	+	+
14	Иркутская область	84,0	89,4	97,3	15,0	+	+	+	+	+
15	Кабардино–Балкарская Республика	66,3	87,7	94,7	18,5	+	+	+	–	+
16	Калининградская область	82,8	90,0	97,8	22,0	+	+	+	–	+
17	Калужская область	84,6	86,2	98,4	17,1	+	+	+	+	+
18	Камчатский край	76,1	96,8	95,0	20,6	+	+	+	+	+
19	Карачаево–Черкесская Республика	86,5	93,1	97,8	24,5	+	+	+	+	+
20	Кемеровская область	92,7	94,6	97,9	16,1	+	+	+	–	+
21	Кировская область	86,7	92,4	97,4	20,0	+	+	+	+	+
22	Костромская область	81,3	89,8	98,7	15,2	+	+	+	–	+
23	Краснодарский край	85,7	90,1	98,5	20,3	+	+	+	+	+
24	Красноярский край	90,4	95,7	99,0	22,1	+	+	+	+	+
25	Курганская область	85,9	90,1	97,0	22,6	+	+	+	+	+
26	Курская область	87,7	93,2	99,1	19,0	+	+	+	–	+
27	Ленинградская область	92,7	92,3	95,1	15,7	–	+	+	+	+
28	Липецкая область	96,2	93,6	100,0	18,9	+	+	+	–	+
29	Магаданская область	93,1	88,9	90,9	21,5	+	+	+	+	+
30	Московская область	80,9	91,9	94,5	15,9	–	+	+	+	+
31	Мурманская область	79,4	86,3	95,5	16,3	–	+	+	+	+
32	Ненецкий автономный округ	71,4	91,1	83,3	15,4	+	+	+	+	+
33	Нижегородская область	86,3	89,3	96,7	20,8	+	+	+	+	+
34	Новгородская область	92,0	93,2	98,4	20,2	+	+	+	+	+
35	Новосибирская область	84,0	92,7	95,8	22,3	+	+	+	+	+
36	Омская область	85,3	88,1	100,0	26,1	+	+	+	–	+
37	Оренбургская область	82,6	92,8	95,8	21,9	+	+	+	+	+
38	Орловская область	80,7	87,2	96,4	15,8	+	+	+	+	+
39	Пензенская область	86,3	88,7	98,1	18,2	+	+	+	+	+
40	Пермский край	88,3	93,3	97,1	19,1	+	+	+	–	+
41	Приморский край	82,4	90,2	99,7	19,2	+	+	+	–	+
42	Псковская область	80,3	88,8	95,7	19,1	+	+	+	–	+
43	Республика Адыгея	85,0	87,7	100,0	24,2	+	+	+	+	+
44	Республика Алтай	73,8	88,7	95,0	29,5	+	+	+	+	+
45	Республика Башкортостан	81,9	88,6	96,5	22,4	+	+	+	–	+
46	Республика Бурятия	84,8	82,7	100,0	21,1	+	+	+	+	+
47	Республика Дагестан	87,4	88,7	100,0	26,8	+	+	+	+	+
48	Республика Ингушетия	71,4	92,9	82,6	29,7	+	+	+	+	+

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Доля коммерческих организаций коммунального комплекса	Доля МКД под управлением коммерческих управляющих компаний	Доля коммерческих управляющих компаний	Доля МКД, в которых созданы ТСЖ	Реализация графиков постановки на кадастровый учет земельных участков	Перевод льгот и субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежную форму	Субсидирование организаций коммунального комплекса	Перекрестное субсидирование	Региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
		%	%	%	%	(+) выполнено/ (–) не выполнено	(+) выполнено/ (–) не выполнено	(+) ликвидировано/ (–) не ликвидировано	(+) ликвидировано/ (–) не ликвидировано	(+) реализуются/ (–) не реализуются
49	Республика Калмыкия	83,3	89,3	95,8	19,2	+	+	+	–	+
50	Республика Карелия	88,0	89,4	99,0	16,7	+	+	+	+	+
51	Республика Коми	91,4	86,9	96,3	17,6	+	+	+	–	+
52	Республика Марий Эл	82,9	83,6	89,5	22,6	+	+	+	+	+
53	Республика Мордовия	91,9	99,2	100,0	37,9	+	+	+	+	+
54	Республика Саха (Якутия)	81,7	85,3	96,9	25,6	+	+	+	–	+
55	Республика Северная Осетия–Алания	80,2	85,6	89,1	22,1	+	+	+	+	+
56	Республика Татарстан	89,0	92,0	97,7	31,4	+	+	+	–	+
57	Республика Тыва	87,8	100,0	100,0	25,6	+	+	+	–	+
58	Республика Хакасия	82,0	96,5	93,9	16,3	+	+	+	+	+
59	Ростовская область	80,7	87,0	96,9	20,7	+	+	+	–	+
60	Рязанская область	86,0	86,4	96,2	21,4	+	+	+	–	+
61	Самарская область	81,0	87,4	90,7	14,3	+	+	+	–	+
62	Санкт–Петербург	83,7	83,0	94,8	11,3	+	+	+	–	+
63	Саратовская область	80,2	89,7	98,8	21,0	+	+	+	+	+
64	Сахалинская область	83,9	83,1	95,3	16,4	+	+	+	+	+
65	Свердловская область	84,0	90,2	93,2	17,4	+	+	+	+	+
66	Смоленская область	84,9	90,1	97,3	20,4	+	+	+	–	+
67	Ставропольский край	80,7	83,4	93,3	20,5	+	+	+	–	+
68	Тамбовская область	89,2	85,9	97,8	26,0	+	+	+	+	+
69	Тверская область	85,0	87,2	96,8	16,9	+	+	+	–	+
70	Томская область	89,9	87,0	99,2	20,4	+	+	+	+	+
71	Тульская область	92,3	86,9	96,9	19,4	+	+	+	+	+
72	Тюменская область	86,7	94,7	99,3	17,5	–	+	+	–	+
73	Удмуртская Республика	87,5	89,9	95,6	24,8	+	+	+	+	+
74	Ульяновская область	83,9	89,2	99,2	18,2	–	+	+	+	+
75	Хабаровский край	83,6	89,6	97,0	21,0	+	+	+	+	+
76	Ханты–Мансийский автономный округ–Югра	82,8	90,9	96,4	20,5	+	+	+	+	+
77	Челябинская область	79,6	92,4	96,6	16,9	+	+	+	–	+
78	Чувашская Республика	77,4	93,0	99,3	19,0	+	+	+	–	+
79	Чукотский автономный округ	69,2	98,9	100,0	10,9	–	+	+	+	+
80	Ямало–Ненецкий автономный округ	83,8	90,6	91,9	18,6	+	+	+	+	+
81	Ярославская область	82,2	89,8	94,4	19,4	+	+	+	+	+

Приложение 4. Результаты достижения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда по итогам 2011 года

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Целевые значения	Достигнутый уровень		Расчетное результирующее значение
				значение	%	
1. Участие субъектов Российской Федерации в программах Фонда						**100,0**
1.1	Степень охвата многоквартирных домов программами Фонда	ед.	10 870,0	11 395,0	104,8	
1.2	Количество муниципальных образований, вовлеченных в программы Фонда	ед.	800,0	1 420,0	177,5	
1.3	Общий объем расходов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда	млн. руб.	52 390,0	60 573,7	115,6	
2. Реализация преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства						**100,0**
2.1	Доля многоквартирных домов, земельные участки под которыми сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов, находящихся на территории муниципальных образований, участвующих в программах Фонда	%	45,0	45,3	100,7	
2.2.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда	%	80,0	80,5	100,6	
2.3	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда	%	50,0	58,9	117,8	
2.4	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда	%	60,0	67,1	111,8	
3. Реализация региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов						**100,0**
3.1.	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен (завершен) капитальный ремонт	тыс.м^2	30 770,0	29 396,0	95,5	
3.2.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен (завершен) капитальный ремонт	ед.	9 020,0	9 490,0	105,2	
3.3.	Численность граждан, проживающих в многоквартирных домах в которых проведен (завершен) капитальный ремонт	тыс.чел.	1 315,0	1 505,1	114,5	
4. Реализация региональных адресных программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда						**97,0**
4.1.	Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане	тыс.м^2	1 340,0	908,3	67,8	
4.2.	Количество расселенных аварийных домов	ед.	5 455,0	3 927,0	72,0	
4.3.	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	87 160,0	63 015,0	72,3	
4.4.	Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в малоэтажные дома, от общего числа граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	%	30,0	52,8	176,0	
ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА						**99,3**

Отпечатано в типографии ООО «Копиринг»
г. Москва, ул. Нагатинская, д.3А
тел: +7 (495) 231–42–50, 225–34–21
e–mail: copyring@mail.ru, www.copyring.ru
Условн. печ. листов: 12
Формат А4, Тираж: 250 экз. Заказ: № 1321
